



工程指示 / 要求簡箋(E.I.)

工程指示編號：EI / 9663 / 18 修改版次：I
 工程編號 : J - 837 工程名稱 : 觀塘裕民坊
 工程項目 : 佛沙窗 大貨 (T2,T5 補回 17/F 窗)
 收件人 : 生統 / 永林 發件人 : Eric Liu 日期 : 05/11/2018

要求提供 / 確認 事項 :

- | | | |
|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 初步鋁料 B.M. | <input type="checkbox"/> 加工拆圖，然後生產 | <input type="checkbox"/> 尺寸表 |
| <input type="checkbox"/> 正式鋁料 B.M. | <input type="checkbox"/> 技術上資料 / 指示 | <input type="checkbox"/> 報價 |
| <input type="checkbox"/> 配件 B.M. | <input type="checkbox"/> 樣辦或貨品說明書 | <input type="checkbox"/> 分判合約 |

內容 :

早前按大判指示，光雞窗樓層在 T2,T5 是 6-17/F
 現按佛沙廠通知是 6-16/F，需補回 17/F 的佛沙窗
 永林: 請提供 17/F 佛沙窗數量及加工圖供生統使用 謝謝！
 請在 2018 / 11 / 07 前完成上列要求。

附： 2 頁

以上項目為:

- 原合約工程包 原合約工程加 / 減賬 新工程報價

原因 :-

分發東莞各部門 :

- () 生產技術總監 連附件 () 技術部 連附件 永林 () 生產部 連附件 () 機械設計部 連附件
 () 採購部 連附件 () 生產統籌部 連附件 梅
 () 質檢部 連附件 () 會計部 連附件 () 報關組 連附件 () 其他 楊榮輝 連附件

分發香港各部門 :

- () 行政部 連附件 () 會計部 連附件 () 統籌部 連附件 () 工程部地盤科文 連附件 何子銘
 () 採購部 連附件 () QS 部 連附件 () 維修部 連附件 () 其他 _____ 連附件

傳遞編號 :

HK 1687 / 18

發件人簽署 :


項目經理簽署 :

J837预制场工作管理群 (13)




2018.11.05

以下是最近的訊息

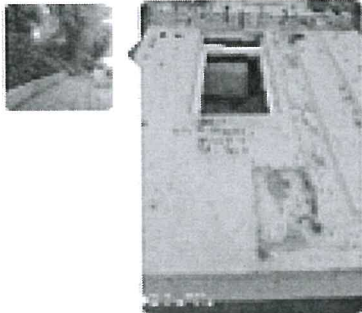

沸沙廠通知



现在沸沙厂的生产T2.T5是从17楼开始，铝窗派送是从18楼，到结束是否就少一个窗。

Factory production record in past 2 weeks

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	9月29日	9月30日	10月1日	10月2日	10月3日	10月4日	10月5日	10月6日	10月7日	10月8日	10月9日	10月10日	10月11日	10月12日	
T1	2	0	0	0	0	3	2	5	4	5	6	8	0	0	35
T2	3	0	0	0	0	6	5	5	6	5	6	2	0	0	38
T3	6	0	0	0	0	5	1	0	0	1	3	0	0	0	16
T5	3	0	0	0	0	0	2	0	2	2	3	2	0	0	14
	14	0	0	0	0	14	10	10	12	13	18	12	0	0	

Upon the above issue, which floor façade panels with tile, window and cast-in embed etc.

	T1	T2	T3	T5
Last version _ Façade with window, tile and embed	19F	22F	19F	22F
Last meeting version	12/F	18/F	12/F	18/F

↓
現改 18/F
