



工程指示 / 要求簡箋(E.I.)

工程指示編號：EI / 5998 / 23 修改版次：
 工程編號 : J - 858 工程名稱 : 將軍澳日出康城 11
 工程項目 : 幕牆生產單元件 金門 / 顧問 巡查報告 (2023 0406)
 收件人 : 生統 / 王良 / 水洪 / 青哥 發件人 : Ant Yeung 日期 : 13/04/2023

要求提供 / 確認 事項 :

- | | | |
|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 初步鋁料 B.M. | <input type="checkbox"/> 加工拆圖，然後生產 | <input type="checkbox"/> 尺寸表 |
| <input type="checkbox"/> 正式鋁料 B.M. | <input type="checkbox"/> 技術上資料 / 指示 | <input type="checkbox"/> 報價 |
| <input type="checkbox"/> 配件 B.M. | <input type="checkbox"/> 樣辦或貨品說明書 | <input type="checkbox"/> 分判合約 |
- 內容 :

2023/04/06 顧問發出巡查報告，請依附件中的指示作出改善。
因老闆將會上廠，請安排各單位配合和準備全部 QC 文件。謝謝

敬請各位知悉及幫手，謝謝！

請在 2023.04.14 前完成上列要求。

附： 頁

- 原合約工程包 原合約工程加 / 減賬 新工程報價

分發東莞各部門： 青哥

- | | | | | | | | |
|---|---|---|---|--|---|---|---|
| <input type="checkbox"/> 生產技術總監 | <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 技術部 | <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 生產部 | <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 機械設計部 | <input type="checkbox"/> 連附件 |
| <input type="checkbox"/> 採購部 | <input type="checkbox"/> 連附件 | <input checked="" type="checkbox"/> 生產統籌部 | <input checked="" type="checkbox"/> 連附件 | <input checked="" type="checkbox"/> 小羅&清 | <input checked="" type="checkbox"/> 連附件 | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> 質檢部 | <input checked="" type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 會計部 | <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 報關組 | <input type="checkbox"/> 連附件 | <input checked="" type="checkbox"/> 其他 水哥 | <input checked="" type="checkbox"/> 連附件 |

分發香港各部門：

- | | | | | | | | | |
|------------------------------|------------------------------|-------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|----------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 行政部 | <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 會計部 | <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 統籌部 | <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 工程部地盤科文 | <input type="checkbox"/> 連附件 | 積哥 |
| <input type="checkbox"/> 採購部 | <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> QS 部 | <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 維修部 | <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 其他 | _____ | <input type="checkbox"/> 連附件 |

傳遞編號：

HK 708 / 23

發件人簽署：

項目經理簽署：

(Handwritten signatures)

J858 工程顧問巡廠報告

互

巡廠日期： 2023-04-06

巡廠地點： 美而特中堂一廠、二廠

巡廠配合人員： 工程顧問鄭生、吳水洪及工廠相關工序人員

巡廠主題： **有關 J858 工程項目生產進度及質量**

老問上廠 前


內容：

顧問嚴正巡查

一、地盤鋁掛碼安裝成品（倉儲）：

- 1、單元項目地盤用的吊裝碼已有依最新加工圖修改掛碼后入倉倉儲；
- 2、在倉儲區抽查時，發現仍有鉻化表面見白的鋁碼未進行表面的塗瀝青油處理（見下圖）；--需要求組裝人員仔細處理，以免地盤不收貨

#1

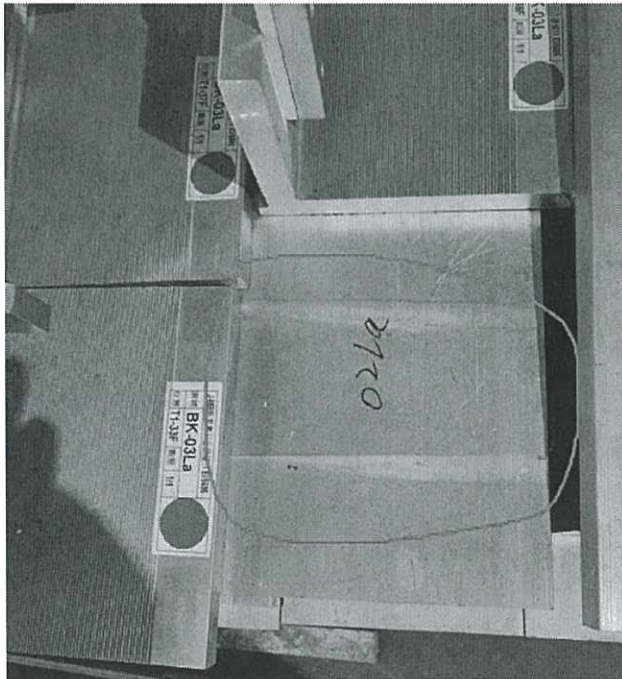


☆

二、組裝工序（二廠）：

- 1、在抽查組裝工序單元半成品時，發現有單元梗位玻璃骨的螺絲漏安裝（詳見下圖），當即要求補安裝及全面復查（實際最少發現有兩幅漏安裝螺絲問題）；--要求二廠車間組裝區必須要加強對每道安裝工序的質量進行檢查，以確保產品質量達到項目要求

#2

☆

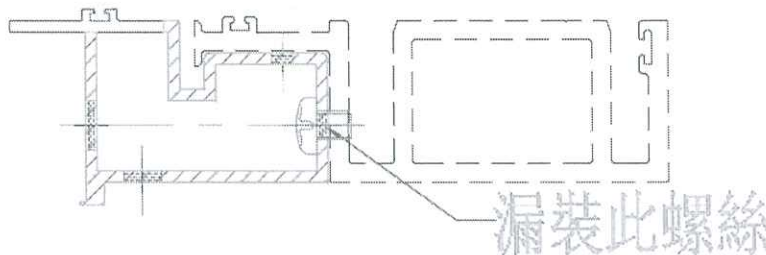

- 2、在二廠車間抽查防水膠 (D.C791)時，發現有臨近有效期 (2023.5 月份到期) 的防水膠；--提醒倉務、車間各工序要優先將臨近有效期的防水膠用完；
- 3、二廠單元件成品包裝前的清潔工作仍未達到較好要求，抽查時發現有多幅室內見光位的防水膠未完全清潔乾淨；--要求二廠在組裝區組裝單元件時，應及時將碰口位多余 (溢出) 的防水膠清理乾淨，在成品 (或半成品) 包裝前會對見光位要特別查看表面防水膠是否完全清理乾淨方可包裝 (此問題已多次被投訴，雖有改善，但仍未達標)

#3

↑ 每次也被投訴，請改善。☆

三、結構膠唧膠狀態 (二廠):

- 1、目前已進入雨水較多且濕度較大的季節，但在唧膠房內未見有可視的溫濕度表，無法判斷是否在道康寧手冊內要求的溫濕度要求下進行結構膠施工的；--要求一廠、二廠及湖南廠唧膠房均需配置溫濕度表 (下周五即 4 月 14 日需在唧膠房見有配置)

#4.

抄送: 青哥、王良、邱秉安、黃瑛梅、羅梓鐘、羅偉、李紅、盧志

副本: Marco TAM、Jason、佐治哥、Ant

↑ 仲好!!
↑ 唔好畀人投訴!!
☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆
