

工程指示 / 要求簡箋(E.I.)

工程指示編號：EI / 2719 / 21 修改版次：C

工程編號：J851 工程名稱：青衣明翹匯

工程項目：鋁料加工圖(百業窗用)第二批

收件人：生統 發件人：Yancy Chen 日期：27/01/2021

要求提供 / 確認 事項：

- | | | |
|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 初步鋁料 B.M. | <input type="checkbox"/> 加工拆圖，然後生產 | <input type="checkbox"/> 尺寸表 |
| <input type="checkbox"/> 正式鋁料 B.M. | <input type="checkbox"/> 技術上資料 / 指示 | <input type="checkbox"/> 報價 |
| <input type="checkbox"/> 配件 B.M. | <input type="checkbox"/> 樣辦或貨品說明書 | <input type="checkbox"/> 分判合約 |
| <input type="checkbox"/> 其他：_____ | | |

內容：

根據東莞廠 1 月 27 日微信，現確認平台位置優先交貨，可以用光身料鋁巴代替。

請在 30/1/2021 前完成上列要求。

附：

1+ 1 頁

以上項目為：

原合約工程包 原合約工程加 / 減賬 新工程報價

原因：-

分發東莞各部門：

- () 生產技術總監 連附件 () 技術部 連附件 () 生產部 連附件 () 機械設計部 連附件
 () 採購部 連附件 (/) 生產統籌部 連附件
 () 質檢部 連附件 () 會計部 連附件 () 報關組 連附件 () 其他 _____ 連附件

分發香港各部門：

- () 行政部 連附件 () 會計部 連附件 () 統籌部 連附件 () 工程部地盤科文 連附件
 () 採購部 連附件 () QS 部 連附件 () 維修部 連附件 () 其他 _____ 連附件

傳遞編號：

HK0217 / 21

發件人簽署：

項目經理簽署：


昨天 下午 4:27

「军佬」已回收一則訊息

下午 2:07



细佬：请问是否只是平台的窗号才能用其它颜色压巴代替？

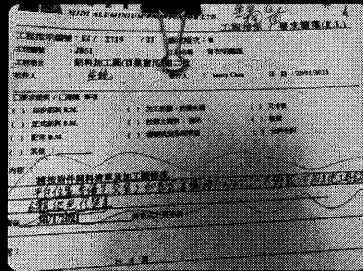

因为现时只有 16 支压巴

下午 2:19

只是平台可以，因為平台急用



这样的，经统计优先窗号共需汁 34，已发 16 支，欠 14 支。可不可以用光身料？可以的话需要你出张正式的 Ei！生产才肯生产



Input field for text or voice recording.

