

工程指示 / 要求簡箋(E.I.)

工程指示編號：EI/ 3199 /21 修改版次：
 工程編號：J851 工程名稱：青衣明翹滙
 工程項目：幕牆單元項目 額外 Win 子機
 收件人：Maggie Lor 發件人：Joe Chan 日期：24/3/2021

要求提供 / 確認 事項：

- | | | |
|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 初步鋁料 B.M. | <input type="checkbox"/> 加工拆圖，然後生產 | <input type="checkbox"/> 尺寸表 |
| <input type="checkbox"/> 正式鋁料 B.M. | <input type="checkbox"/> 技術上資料 / 指示 | <input type="checkbox"/> 報價 |
| <input type="checkbox"/> 配件 B.M. | <input type="checkbox"/> 樣辦或貨品說明書 | <input type="checkbox"/> 分判合約 |
| <input type="checkbox"/> 其他：_____ | | |

內容：

因地盤環境狹窄，吊運單元無法拉尾繩，需安裝額外 Win 子機，製作輔助感也。

預算：額外 36 隻 Win 子搭建於 33F，移 Win 子機到 33 各 1 次共 36 次。
 實際使用數量以地盤安排為準。

請在 _____ 前完成上列要求。(按安裝進度搭建)。

附有關圖紙 / 文件：

1 + 3 頁

以上項目為：

- 原合約工程包 原合約工程加 / 減賬 新工程報價

原因：-

分發東莞各部門：

- () 生產技術總監 連附件 () 技術部 連附件 () 生產部 連附件 () 機械設計部 連附件
 () 採購部 連附件 () 生產統籌部 連附件
 () 質檢部 連附件 () 會計部 連附件 () 報關組 連附件 () 其他 _____ 連附件

分發香港各部門：


- () 行政部 連附件 () 會計部 連附件 () 統籌部 連附件 () 工程部地盤科文 連附件
 () 採購部 連附件 () QS 部 連附件 () 維修部 連附件 () 其他 _____ 連附件

傳遞編號：

發件人簽署：

項目經理簽署：

正面看

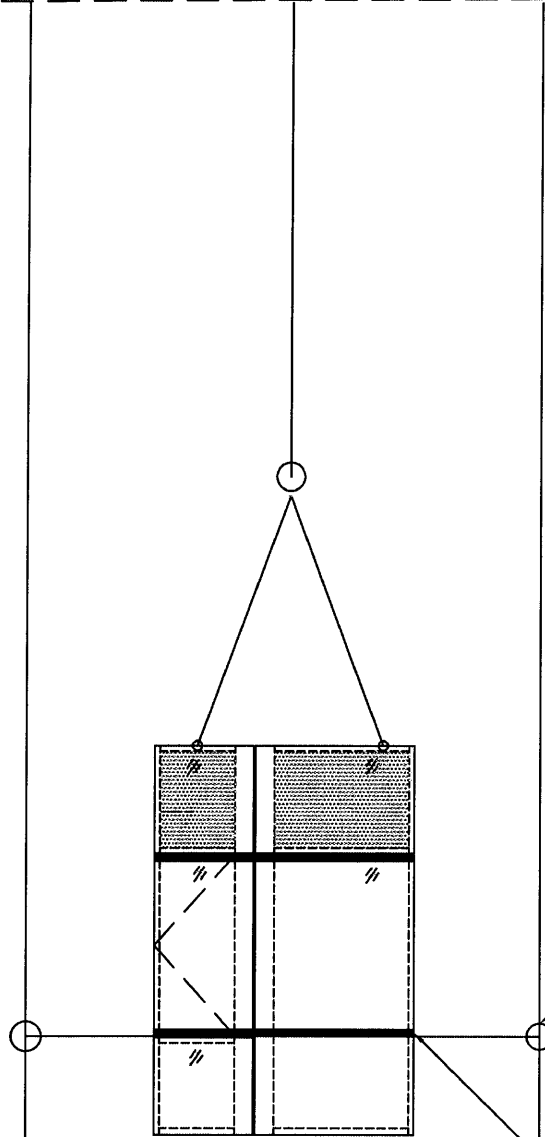


吊運時，單元件擊於臨時威也，順著威也上升，以防止單元件吊運時的擺動，確保安全

繫緊飛機帶

臨時威也

固定威也

33/F WIN子機輔助威也示意圖 (T1 & T1A)

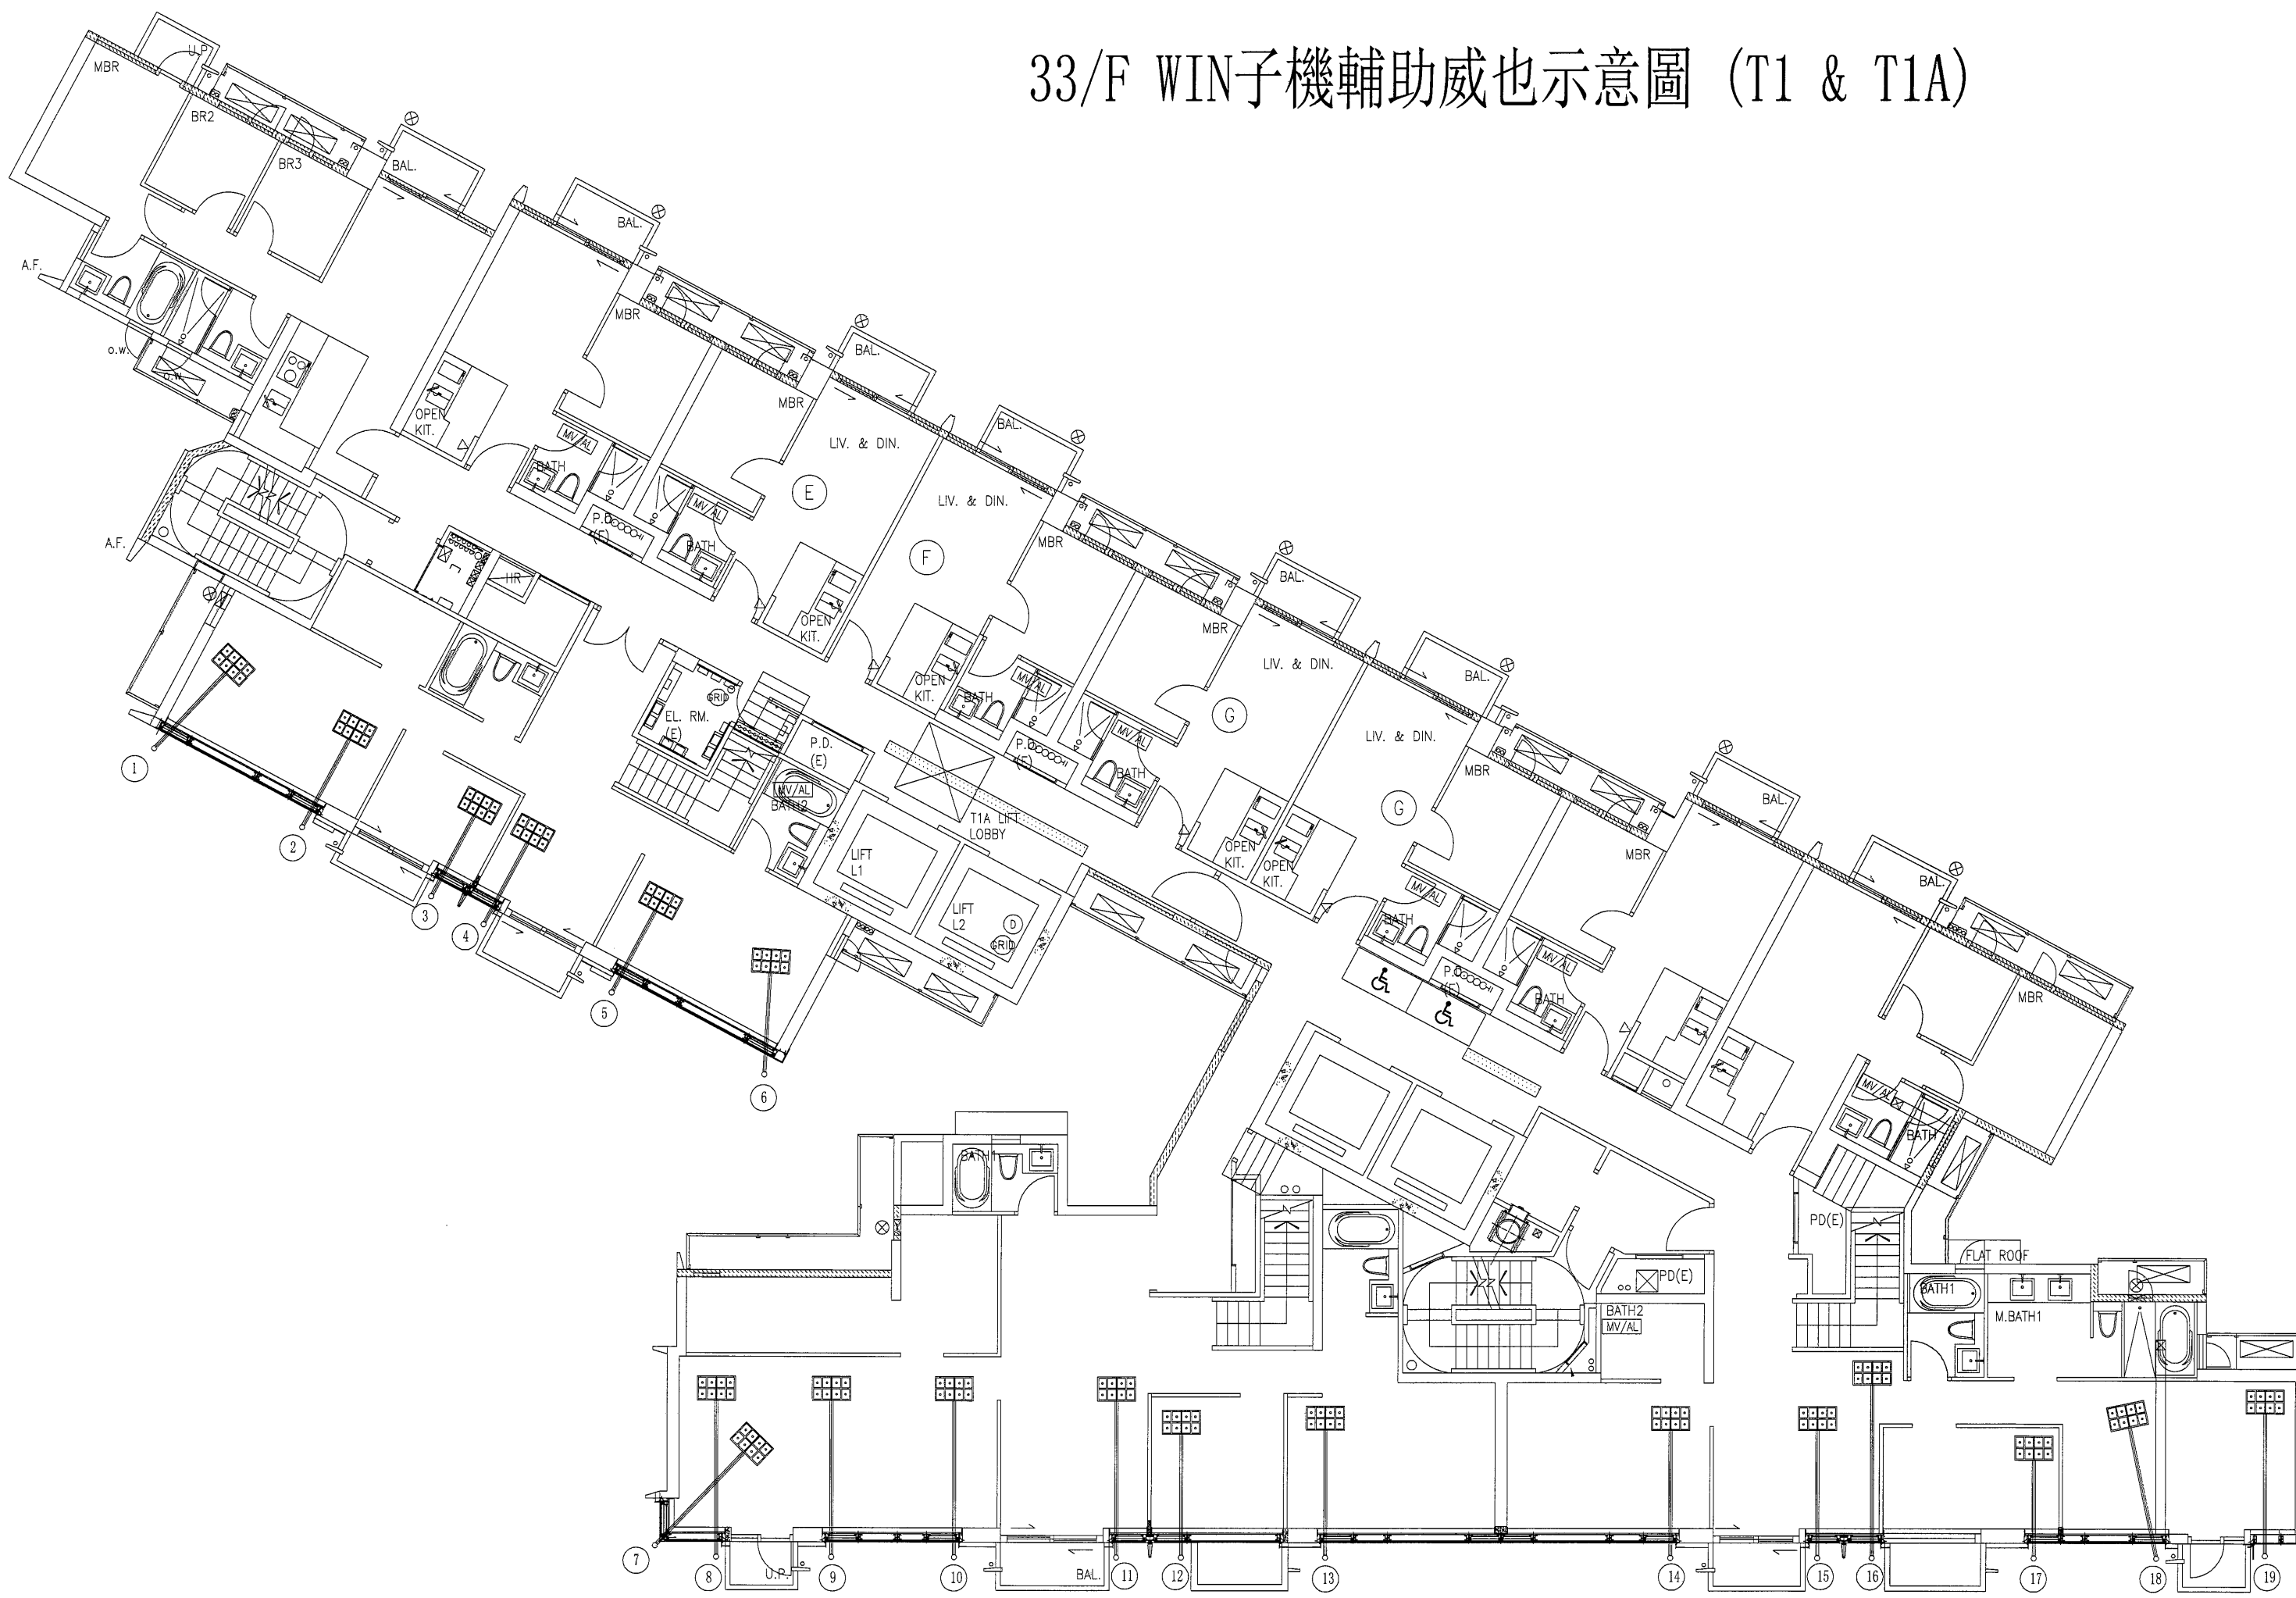

33/F WIN子機輔助威也示意圖 (T2 & T2A)

