

工程指示編號：EI / 3343 / 21

修改版次：_

工程編號：J851

工程名稱：青衣明翹匯

工程項目：單元件幕牆 - 地盤用防水片(CW1R 位置)

收件人：生統

發件人：Yancy Chen

日期：30/04/2021

要求提供 / 確認 事項：

- | | | |
|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 初步鋁料 B.M. | <input type="checkbox"/> 加工拆圖，然後生產 | <input type="checkbox"/> 尺寸表 |
| <input type="checkbox"/> 正式鋁料 B.M. | <input type="checkbox"/> 技術上資料 / 指示 | <input type="checkbox"/> 報價 |
| <input type="checkbox"/> 配件 B.M. | <input type="checkbox"/> 樣辦或貨品說明書 | <input type="checkbox"/> 分判合約 |
| <input type="checkbox"/> 其他：_____ | | |

內容：

根據地盤指示，請按附件圖紙加工，送地盤。

請在 08/05/2021 前完成上列要求。

附：

1+ 3 頁

以上項目為：

 原合約工程包
 原合約工程加 / 減賬
 新工程報價

原因：-

分發東莞各部門：

- | | | | |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 生產技術總監 <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 技術部 <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 生產部 <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 機械設計部 <input type="checkbox"/> 連附件 |
| <input type="checkbox"/> 採購部 <input type="checkbox"/> 連附件 | <input checked="" type="checkbox"/> 生產統籌部 <input type="checkbox"/> 連附件 | | |
| <input type="checkbox"/> 質檢部 <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 會計部 <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 報關組 <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 其他 _____ <input type="checkbox"/> 連附件 |

分發香港各部門：


- | | | | | |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----|
| <input type="checkbox"/> 行政部 <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 會計部 <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 統籌部 <input type="checkbox"/> 連附件 | <input checked="" type="checkbox"/> 工程地盤科文 <input type="checkbox"/> 連附件 | 積哥 |
| <input type="checkbox"/> 採購部 <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> QS 部 <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 維修部 <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 其他 _____ <input type="checkbox"/> 連附件 | |



傳遞編號：

AK 0932 / 21

發件人簽署：




項目經理簽署：

| | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|-----|-------|------|---------|------------|----------|--------|---|---|------|--------|
|  美特鋁質有限公司 MIDI Aluminium Fabricator Ltd. | | | | 工程號 | J851 | 類別 | | 物料號 | - | | | | | |
| | | | | 地盘 | 青衣190 | 制圖 | W. E. X | 2020-04-16 | 圖號 | AP-64B | | | | |
| 修改 | - | - | - | 採用 | 工廠 | 地盤 | ✓ | 圖紙名稱 | 铝折件 | 復核 | - | - | 數量 | - |
| 日期 | - | - | - | 材料 | 顏色 | MILL | | 材料 | 2.0mm 铝板 | 批准 | - | - | 單件重量 | - (KG) |



| | | | |
|------|--------|----|------|
| CW12 | 1~35/F | 85 | 170 |
| CW1R | 1~35/F | 85 | |
| 位置 | 楼层 | 数量 | 合计数量 |

| | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|------|-------|----|---------|------------|----|--------|------|--------|
|  美特鋁質有限公司 MIDI Aluminium Fabricator Ltd. | | | | 工程號 | J851 | 類別 | | 物料號 | - | | | |
| | | | | 地盘 | 青衣190 | 制圖 | W. E. X | 2020-04-16 | 圖號 | AP-64C | | |
| 修改 | - | - | - | 採用工廠 | 地盤 | ✓ | 圖紙名稱 | 鋁折件 | 復核 | - | 數量 | - |
| 日期 | - | - | - | 材料顏色 | MILL | | 材料 | 2.0mm 鋁板 | 批准 | - | 單件重量 | - (KG) |

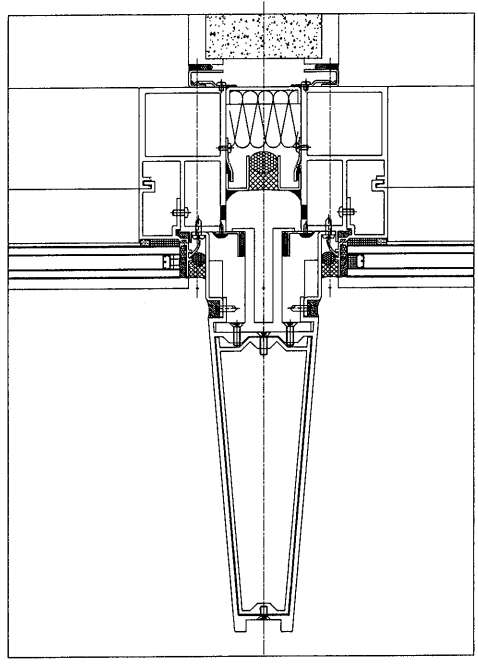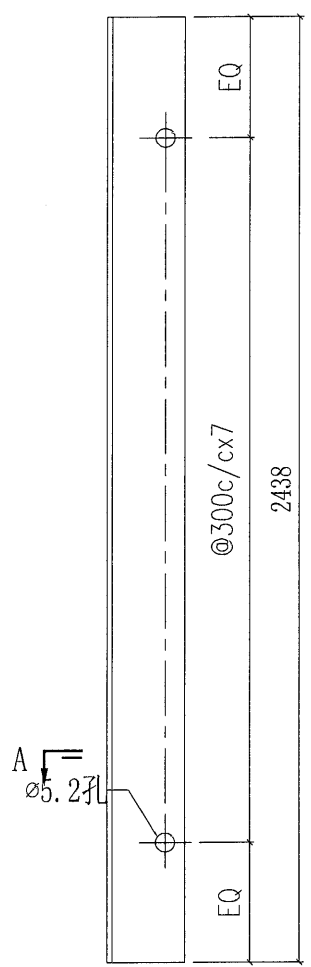

SECTION A-A

| | | | |
|------|--------|----|------|
| CW12 | 1~35/F | 85 | 170 |
| CW1R | 1~35/F | 85 | |
| 位置 | 楼层 | 数量 | 合计数量 |

