

工程指示 / 要求簡箋(E.I.)

工程指示編號：EI/3547/21 修改版次：-
 工程編號 : J851 工程名稱 : 青衣明翹匯
 工程項目 : 單元件幕牆 - 地盤用鋁料加工圖(收鋁用之鋁角)(天面頂收鋁板)
 收件人 : 生統 發件人 : Yancy Chen 日期 : 18/06/2021

要求提供 / 確認 事項 :

- | | | |
|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 初步鋁料 B.M. | <input type="checkbox"/> 加工拆圖，然後生產 | <input type="checkbox"/> 尺寸表 |
| <input type="checkbox"/> 正式鋁料 B.M. | <input type="checkbox"/> 技術上資料 / 指示 | <input type="checkbox"/> 報價 |
| <input type="checkbox"/> 配件 B.M. | <input type="checkbox"/> 樣辦或貨品說明書 | <input type="checkbox"/> 分判合約 |
| <input type="checkbox"/> 其他 : _____ | | |

內容 :

根據與東莞廠 6 月 18 日溝通, 請按附件圖紙加工. 送地盤.

請在 25/06/2021 前完成上列要求。

附 :

1+ 2 頁

以上項目為:

- 原合約工程包 原合約工程加 / 減賬 新工程報價

原因 :- _____

分發東莞各部門 :

- () 生產技術總監 連附件 () 技術部 連附件 () 生產部 連附件 () 機械設計部 連附件
 () 採購部 連附件 () 生產統籌部 連附件
 () 質檢部 連附件 () 會計部 連附件 () 報關組 連附件 () 其他 _____ 連附件

分發香港各部門 :



- () 行政部 連附件 () 會計部 連附件 () 統籌部 連附件 () 工程部地盤科文 連附件 **積哥**
 () 採購部 連附件 () QS 部 連附件 () 維修部 連附件 () 其他 _____ 連附件

傳遞編號 :


HK 1313 / 21

發件人簽署 :

項目經理簽署 :

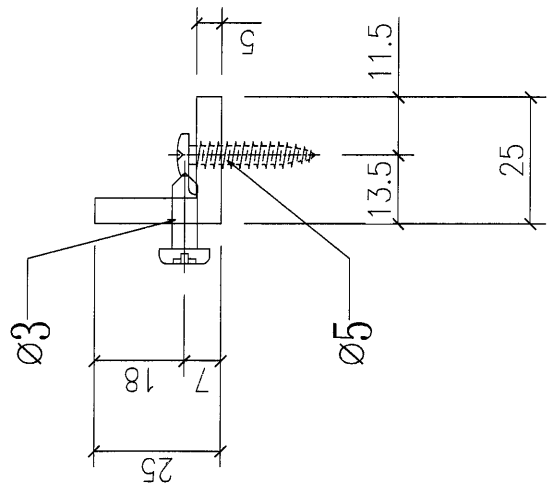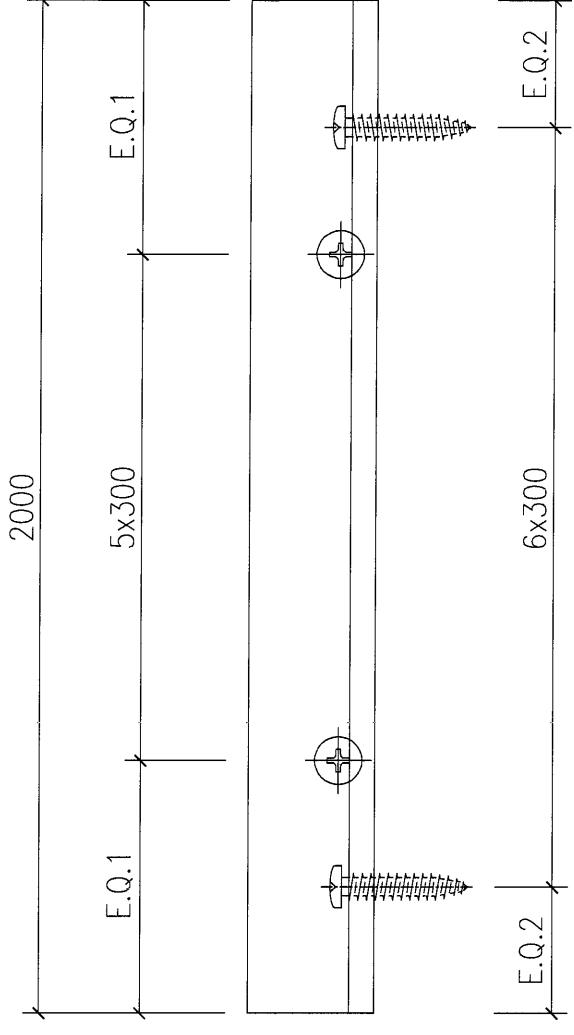

數量:50支
顏色:mill

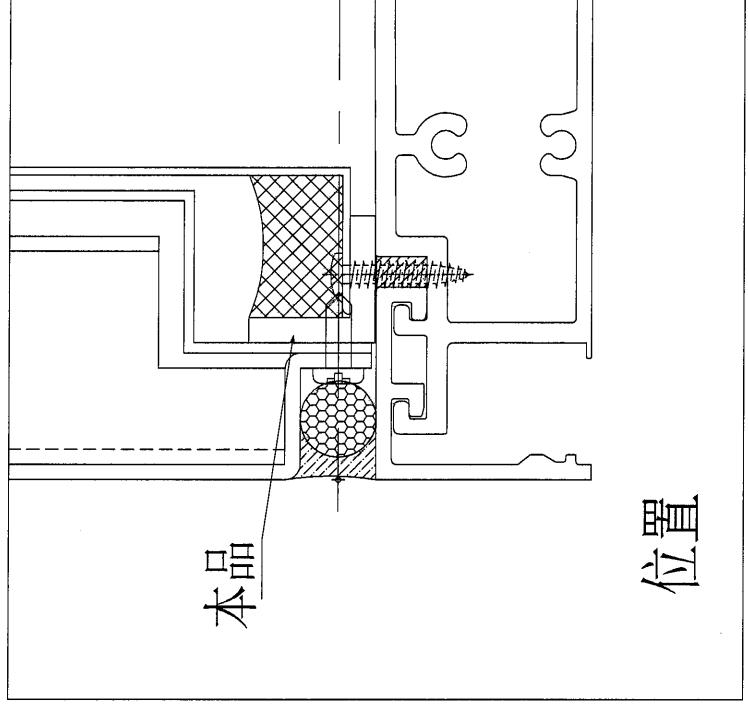




+852 9340 2882

18/6/2021 下午 12:02

所有多媒體



今天下午送 J851 的材料就 4 款，
X85790 没有见送货，到时向荣阳了
解下是什么情况



料编码	名称	长
5787	UP边企料	
5706	企料	
5707	转角企料	
5796	UP格栅通	

華哥！有沒倉存料可削成 5mm 厚鋁
角，Mill 或任何顏色均可，所需呎吋
25x25x5mm Thk



我問的是上述倉存料？



收到！



陈进华：今天下午送J851的材料就4
款，X85790没有见送货，到时向荣阳了解...

週三 19:13



25x25x5mm 鋁角只能用其它尺寸
厚度相同角削制就会有，刚刚适合
細佬！上述5mm厚幕牆收鋁用之鋁角，記
得出E1給廠拿倉存料割成上述所需呎吋.....

