

工程指示 / 要求簡箋(E.I.)

工程指示編號：EI / 3538 / 21

修改版次：

工程編號：J - 852

工程名稱：亞皆老街中電

工程項目：回覆質檢報告-石紋色百頁

收件人：生統/ 王良

發件人：Ant Yeung

日期：16/06/2021

要求提供 / 確認 事項：

- | | | |
|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 初步鋁料 B.M. | <input type="checkbox"/> 加工拆圖，然後生產 | <input type="checkbox"/> 尺寸表 |
| <input type="checkbox"/> 正式鋁料 B.M. | <input type="checkbox"/> 技術上資料 / 指示 | <input type="checkbox"/> 報價 |
| <input type="checkbox"/> 配件 B.M. | <input type="checkbox"/> 樣辦或貨品說明書 | <input type="checkbox"/> 分判合約 |
| <input type="checkbox"/> 其他：_____ | | |

內容：

按質檢報告 QIR-852-21-012 有石紋色百頁有色差+ 表面脫落問題. 請儘快送回噴塗廠處理免阻生產.

請在 2021.06.18 前完成上列要求。

附有關圖紙 / 文件：3頁質檢報告

以上項目為：

- 原合約工程包 原合約工程加 / 減賬 新工程報價

原因：-_____

分發東莞各部門：

- | | | | |
|--|--|--|--|
| <input type="checkbox"/> 生產技術總監 <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 技術部 <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 生產部 <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 機械設計部 <input type="checkbox"/> 連附件 |
| <input type="checkbox"/> 採購部 <input type="checkbox"/> 連附件 | <input checked="" type="checkbox"/> 生產統籌部 <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 小羅&清 <input type="checkbox"/> 連附件 | |
| <input checked="" type="checkbox"/> 質檢部 <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 會計部 <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 報關組 <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 其他 _____ <input type="checkbox"/> 連附件 |

分發其他分判：

- 水洪 連附件

分發香港各部門：

- | | | | |
|---|--|---|--|
| <input type="checkbox"/> 行政部 <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 會計部 <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 統籌部 <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 工程部地盤科文 <input type="checkbox"/> 連附件 |
| <input type="checkbox"/> 採購部 <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> QS 部 <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 維修部 <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 其他 _____ <input type="checkbox"/> 連附件 |

傳遞編號：

HK 1298 / 21

發件人簽署：

項目經理簽署：

质量检验报告

Quality Inspection Report

2021.6.15

版次: 0 表格 MD-08

REPORT NO. 质量检验报告编号: QIR-852-21-012

PROJECT NO. 工程编号: J-852 JPROJECT NAME 工程名称: 亚皆老街

DRAWING NO. 物料编号/图号: INSPECTED BY 质检员: 霍柱登/李良平

N.C.REP.NO. 不合项目报告编号: REPORT DATE 报告日期: 2021.06.13

LOT QTY. 总数量: 短料: 1095 支 PPROVAL BY 核准人: 李良平

SAMPLING. 抽样标准: QCWI-11 APPROVAL DATE 核准日期: 2021.06.13

CONCLUSION 结果: UNACCEPTABLE 不接受 ACCEPTED ON DEVIATION 降级收货


处理要求: 由於該項目緊急, 且工藝特殊, 煩請源哥給出使用指示!

检验工序编号: QRA-852-21-052	霍柱登 霍柱登 霍柱登 霍柱登				次品 比率
E I 编号: EI/3296/21	序号	数量	严重	轻微	
项目名称: 百葉窗		80	80		100%
次品详细描述及图示: FN0910M/石紋色二次噴塗回廠存在如下質量問題: 1、噴塗表面光澤暗淡, 與色板相比光澤明顯偏差嚴重。 色板實測光澤值: 14~15GU。 來貨型材光澤值: 4~5U 偏低約 10GU。 2、噴塗表面疑似漏噴光油, 噴塗表面在接觸水的情況下, 出現噴塗層被軟化, 用指甲即可刮脫噴塗表面。 3、窗框料室外面局部位有輕微露底現象; (詳見附頁相片)					
导致质量事件原因 (由发生质量事件原因部门填写)					
跟进结果:					
<input type="checkbox"/> 另有附页说明	<input type="checkbox"/> 图纸	<input type="checkbox"/> 相片			

分发 叶先生 统筹部-黄瑛梅 采购部 (罗小姐) 技术部 ()

质量指导 生产部-邱秉安 项目经理 (胡哥、Ant) 其它 (仓务-陈进华)

供应商-公司名称: 南海藍鑫

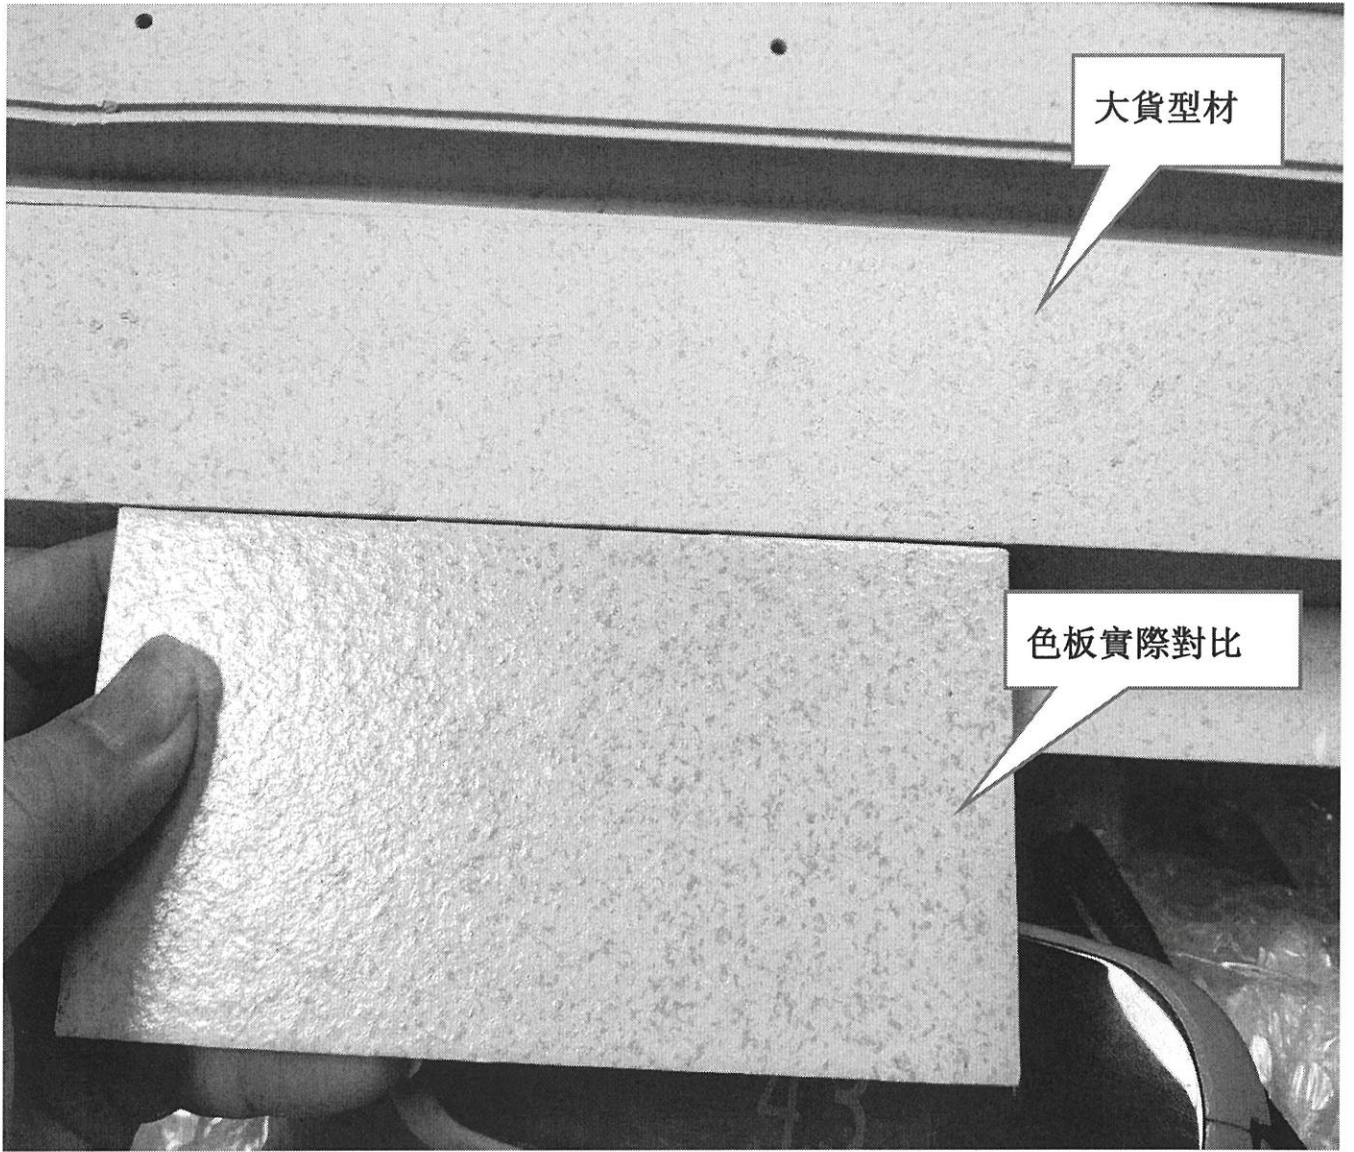

表面接觸水后，油漆層被軟化；
用指甲即可刮脫表面。

