

工程指示 / 要求簡箋 ENGINEER INSTRUCTIONS(E.I.)

工程指示編號:	EI- 8189	修改版本:	-
	HK-1490		
工程編號:	J 853	工程名稱:	延坪道
收件人:	生統	發件人:	Joe Chan
工程項目:	Row E 大屋泳池欄 河頂橫加工組裝	日期:	14/8/2024

<input type="checkbox"/> 原合約工程包	<input type="checkbox"/> 原合約工程加 / 減賬 QT-	<input type="checkbox"/> 新工程報價 QT-
---------------------------------	--	------------------------------------

信件批核號碼/圖紙參考編號:	批核模具圖紙編號:
客戶指示附件:	管理內部批簽署:

<input type="checkbox"/> 初步鋁料 B.M.	<input type="checkbox"/> 加工拆圖, 然後生產	<input type="checkbox"/> 尺寸表
<input type="checkbox"/> 正式鋁料 B.M.	<input type="checkbox"/> 技術上資料/指示	<input type="checkbox"/> 報價
<input type="checkbox"/> 配件 B.M.	<input type="checkbox"/> 樣辦或貨品說明書	<input type="checkbox"/> 分判合約
<input type="checkbox"/> 其他:		

內容: 請依附件資料, 加工組裝頂橫料, 送地盤
(廠用鐵件: EI 8020.)

完成上列要求日期: 15/9/2024


國內

<input type="checkbox"/> 生產技術總監	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 技術部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 生產部	<input type="checkbox"/> 連附件
<input type="checkbox"/> 採購部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input checked="" type="checkbox"/> 生產統籌部	<input checked="" type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 報關組	<input type="checkbox"/> 連附件
<input type="checkbox"/> 質檢部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 會計部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 機械設計部	<input type="checkbox"/> 連附件
<input type="checkbox"/> 香港辦	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 其他:			

香港

<input type="checkbox"/> 行政部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 會計部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 統籌部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 工程部	<input type="checkbox"/> 連附件
<input type="checkbox"/> 採購部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> QS部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input checked="" type="checkbox"/> 地盤管理	<input checked="" type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 維修部	<input type="checkbox"/> 連附件

*發件人簽署:		*組別成員批核簽署:	
傳遞編號:	HK/1490/24	項目經理簽署:	



美特鋁質有限公司

MIDI ALUMINIUM FABRICATOR LTD

鋁材開料總表

工程號碼: J853 工程名稱: 延坪道別墅(GB-House A立柱橫梁)

序號	鋁料編號	名稱	表面處理		開料長度	實用長料總數量		浪費率(%)
			顏色	層厚		支數	長度	
2	JM1015	25x25x3mm鋁角	JMQ2134		6000	6	36000	29.21
			57					

送至: _____

由: _____

日期: _____

簡短說明: _____

共2頁 第1頁

打印日期: 2024/8/12 打印時間: 17:03


工程號碼: J853, 工程名稱: 延坪道別墅(GB-House A立柱橫梁)



開料長度: 6000, 總長料支數: 6, 總開料支數: 10

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 29.21

鋁材開料清單 JM1015

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
J853-GB-JM1015-500A	1-6	3000.0	6	6	6	0	1-6@(2944)x6
J853-GB-JM1015-500B	(餘料)1-4	1781.0	4	4	0	4	1-4@(1157)x4

 美特铝质有限公司 MIDI Aluminium Fabricator Ltd.				工程号 J853	制图 J.L.	09/7/24	物料号 -	
				地盘 香港延坪路	复核 -	-	图号 J853-GB-JM1015-500	
版本 -	采用 -	工厂 √	地盘 -	名称 25x25x3mm铝角加工图	批准 -	-	数量 -	
日期 -	颜色 JMQ213457			材料 JM1015	单件重量(kg) -	-	长度 -	宽度 -
物料编号		DIM.A	DIM.B	DIM.C	DIM.D	DIM.E	数量	单件重量(kg)
J853-GB-JM1015-500A		3000	@300x9				-	-
J853-GB-JM1015-500B		1781	@300x5				-	-

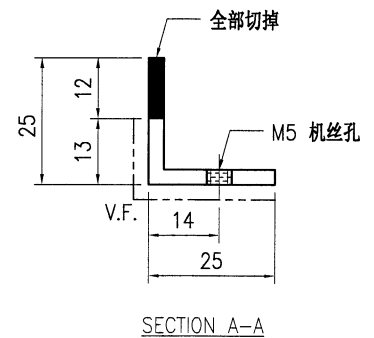



技术说明:

1. 铝合金型材截料之前应进行校直调整, 截料端头不应有加工变形, 并应去除毛刺;
2. 加工长度允许偏差为 $\pm 0.5\text{mm}$, 端头斜度的允许偏差为 $\pm 0.25^\circ$, 孔位的允许偏差为 $\pm 0.3\text{mm}$, 孔距的允许偏差为 $\pm 0.3\text{mm}$, 累计偏差为 $\pm 0.5\text{mm}$;
3. 槽口、豁口的长宽边允许偏差为 $+0.5\text{mm}$, 榫头的长宽边允许偏差为 -0.5mm , 中心线允许偏差都为 $\pm 0.5\text{mm}$;
4. "-----" 为外露喷涂装饰面, 应贴保护膜, 加工过程中不得破坏装饰面, 加工完毕须标示代号及长度。



美特鋁質有限公司
MIDI Aluminium Fabricator Ltd.

工程号	J853	制图	J.L.	12/7/24	物料号	J853-GB-TA-800			
地盘	香港延坪路	复核	-	-	图号	J853-GB-TA-800			
版本		名称	铁件扶手组装图	批准	-	数量	-		
日期		材料	-	单件面积(m ²)	-	长度	3000	宽度	83.5

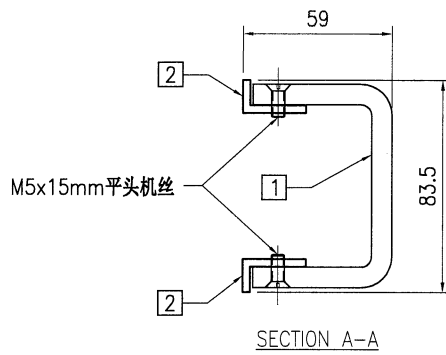
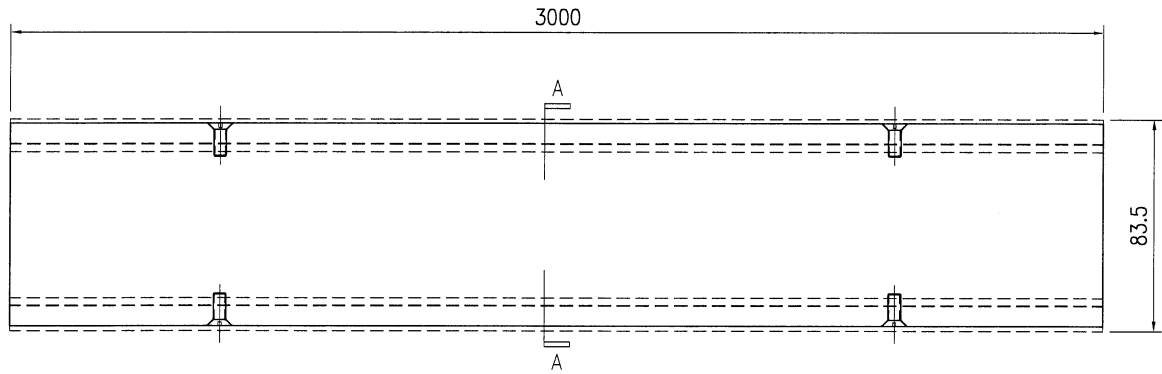


序号	物料编号	长度	数量
1	J853-GB-ST-690A	3000	1
2	J853-GB-JM1015-500A	3000	2
-	M5x15mm平头机丝	-	20



美特鋁質有限公司
MIDI Aluminium Fabricator Ltd.

工程号	J853	制图	J.L.	12/7/24	物料号	J853-GB-TA-801
地盘	香港延坪路	复核	-	-	图号	J853-GB-TA-801
名称	铁件扶手组装图	批准	-	-	数量	-
材料	-	单件面积(m ²)	-	-	长度	1781
					宽度	83.5

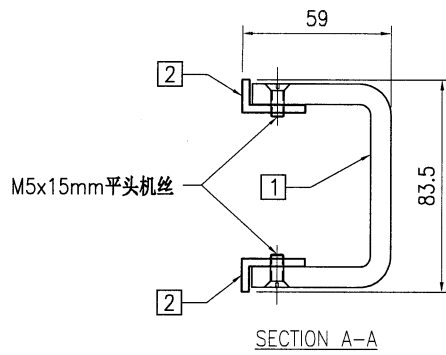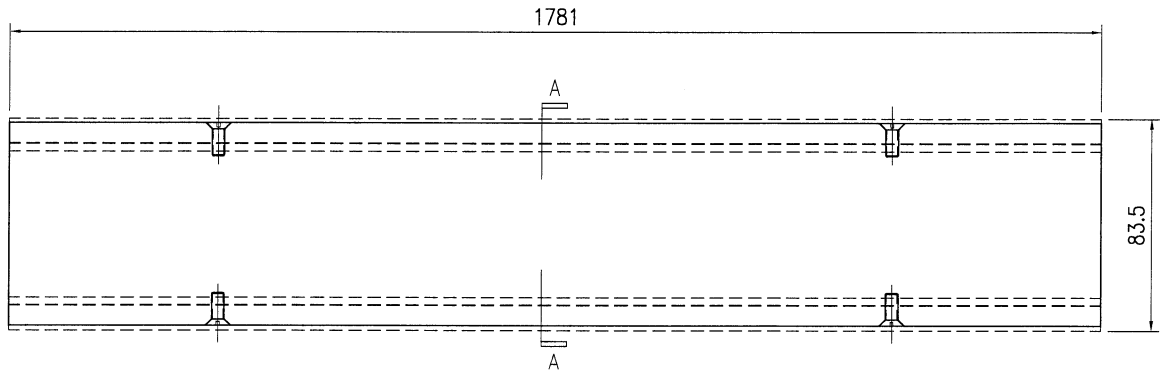

序号	物料编号	长度	数量
1	J853-GB-ST-690B	1781	1
2	J853-GB-JM1015-500B	1781	2
-	M5x15mm平头机丝	-	12

