



工程指示 / 要求簡箋(E.I.)

工程指示編號：EI / 5527 / 23 (原 EI 5272) 修改版次：M  
 工程編號：J - 858 工程名稱：將軍澳日出康城 LP 11  
 工程項目：幕牆 大貨單元件加工圖  
 收件人：生統 / 王良 / 水洪 發件人：Ant Yeung 日期：21/02/2023

要求提供 / 確認 事項：

- M 版: 因應業主要求飾線收封口片後圍邊啣黑膠 DC791。注意：膠不要太粗 (已附電郵確認)
- L 版: 因應地盆安裝時，原本在地盆安裝的防火棉托，會阻礙安裝有飾線的單元件。

所以凡有飾線的單元件此防火棉需改由廠安裝。顧問已同意。(附報告)

- L \*請留意 防火棉需貼上錫紙，錫紙包好完整，不露出防火棉。  
參考相片，該個飾線背空間全裝密，單元背凸出 30MM 便可以，唔夠地盤後補。
- L \*單元件落架：因防火棉墊高，請留意高低。
- L \*拆圖，請計算防火棉用量

(原 EI 5272)

請在 2023.02.22 前完成上列要求。w

附：頁

原合約工程包  原合約工程加 / 減賬  新工程報價

分發 拆圖 ( )BUN 連附件

分發東莞各部門：

( )生產技術總監 連附件 (✓)技術部 連附件 ( )生產部 連附件 ( )機械設計部 連附件  
 ( )採購部 連附件 (✓)生產統籌部 連附件 (✓)小羅&清 連附件  
 (✓)質檢部 連附件 ( )會計部 連附件 ( )報關組 連附件 (✓)其他 水洪 連附件

分發香港各部門：


( )行政部 連附件 ( )會計部 連附件 ( )統籌部 連附件 (✓)工程部地盤科文 積哥、二寶 連附件  
 ( )採購部 連附件 ( )QS 部 連附件 ( )維修部 連附件 ( )其他 \_\_\_\_\_ 連附件

傳遞編號：

發件人簽署： 

HK 275 / 23

項目經理簽署： 

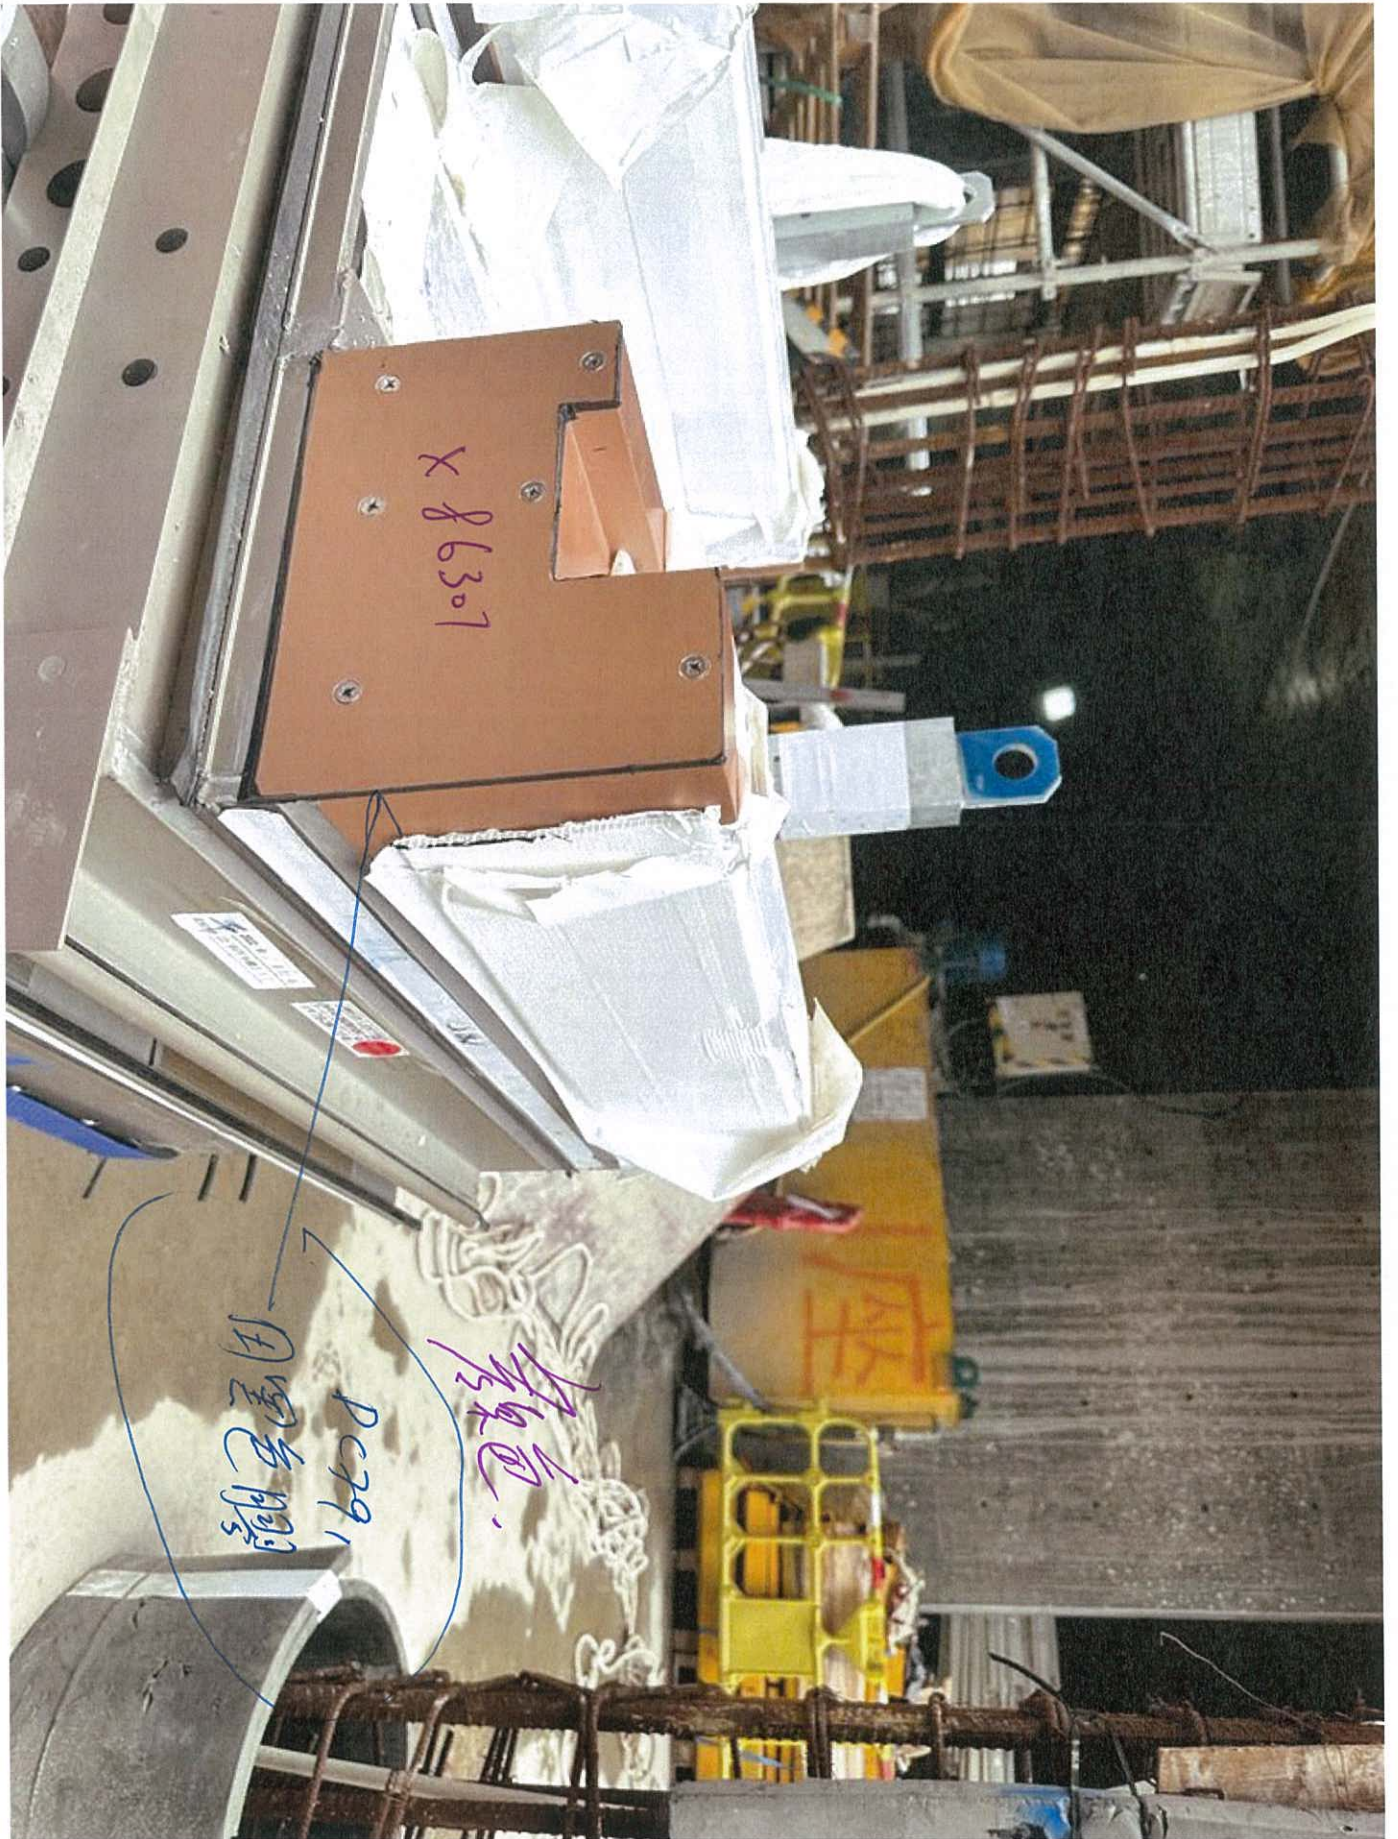

蓝色

PC291

蓝色胶



midi@midiltd.com.hk

---

*From:* j858@midiltd.com.hk <j858@midiltd.com.hk>  
*To:* Jun.Tsui@gammonconstruction.com, Brian.Ng@gammonconstruction.com,  
j3931@gammonconstruction.com, KaHei.Wong@gammonconstruction.com,  
Woody.Wong@gammonconstruction.com, Donny.Lo@gammonconstruction.com,  
Terry.KT.Leung@gammonconstruction.com, Edward.Chiang@gammonconstruction.com,  
Eunice.Tang@gammonconstruction.com, rss19084mw@rlphk.com,  
P19084@rlp.asia, marinatong@rlp.asia,  
ginnychau@rlp.asia, wallaceng@rlp.asia,  
andywchan@sino.com, terrywan@sino.com,  
simonspleung@sino.com, kennethleung@sino.com,  
stephenchow@sino.com, mckay.zhang@aecom.com  
*Subject:* LP11-CW -確認 幕牆飾線圍邊封口黑色膠  
*Copies to:* ant.ysy.midi@gmail.com, jason.lcs.midi@gmail.com  
*Date sent:* Mon, 20 Feb 2023 18:11:22 +0800

Dear Andy Sir

附上現場修改幕牆飾線圍邊封口黑色膠相片和圖紙

按今日會議確認，使用黑色膠作為圍邊封口。

謝謝

源

Attachments: \\midinas0\job\Jobs\J-858\7 Email & Letter\Email\to Gammon\20230220 飾線圍邊封口黑色膠\20230220 confirm 飾線圍邊封口黑色膠.pdf

琳已經電郵已確認信件  
如主

如蒙不棄，請到現場改色。
