



工程指示 / 要求簡箋(E.I.)

工程指示編號：EI / 5754 / 23

修改版次： B

工程編號： J - 858

工程名稱：將軍澳日出康城 11

工程項目：偏林箱 生產 大貨 (鉻化) (雀網版本)

收件人：生統 / 鈹金

發件人：Paul Wong

日期：17/04/2023

內容：

B 版：

T1-已完成樣板層，放行 T1 餘下數量。

T2,T3-先完成樣板層 (12, 15, 16/F)才放行。

(T1 大貨)

A 版 請生產偏林箱共 8 件 (雀網版本)。

T2 3 件用在樣板層 12, 15, 16/F + 1 件後備。

T3 3 件用在樣板層 12, 15, 16/F + 1 件後備。

做樣板層後，才放行大貨

已再加頂鋁角，修雀網

請生產偏林箱共 4 件 (雀網版本)。

3 件用在樣板層 T1 12, 15, 16/F, 1 件後備。

所有偏林箱，需要鉻化。3mm 厚

按 Aecom Spec 要求：

加雀網(線粗 2mm, 網眼 10mm) 316 料

位置圖在(舊 EI5618)

請在 2023.04.27 前完成上列要求。

分發東莞各部門：

- () 生產技術總監 連附件 () 技術部 連附件 () 生產部 連附件 () 機械設計部 連附件
 () 採購部 連附件 (✓) 生產統籌部 連附件 (✓) 小羅&清 連附件
 () 質檢部 連附件 () 會計部 連附件 () 報關組 連附件 () 其他 連附件

分發香港各部門：

- () 行政部 連附件 () 會計部 連附件 () 統籌部 連附件 (✓) 工程部地盤科文 積哥 連附件
 () 採購部 連附件 () QS 部 連附件 () 維修部 連附件 () 其他 連附件

傳遞編號：

HK 745 / 23

發件人簽署：


項目經理簽署：



美特鋁質有限公司
MIDI Aluminium Fabricator Ltd.

| | | | |
|----|-----|-----------|------------------|
| 類別 | | 物料號 | |
| 制圖 | 胡冬雲 | 2023.1.10 | 圖號 858-PL-BOX01 |
| 復核 | - | - | 數量 146+4(後備)=150 |
| 批准 | | | 位置 |

| | | | | |
|----|-----------|-----------|--|--|
| 修改 | A | B | | |
| 日期 | 2023.2.17 | 2023.4.20 | | |

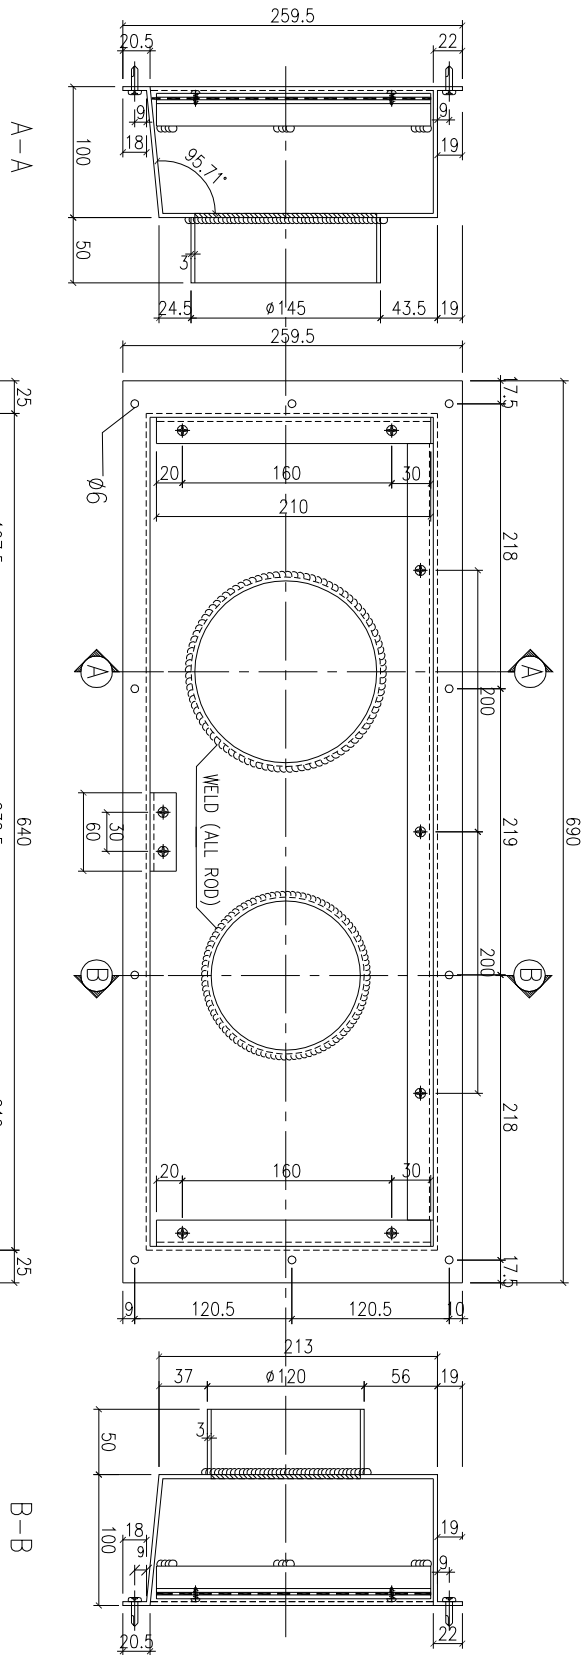

| | | | | |
|-----|--------|----|-----------|--------|
| 工程號 | J-858 | 地盤 | 將軍澳日出康城11 | 附 件 |
| 名稱 | 偏林箱加工圖 | | 採用 | |
| 材料 | 3mm厚鋁板 | | 地盤 | |
| 顏色 | 鉻化 | | 工廠 | |
