



工程指示 / 要求簡箋(E.I.)

工程指示編號：EI / 7924 / 24

修改版次：A

工程編號：J - 858

工程名稱：將軍澳日出康城 LP 11

工程項目：Glass Cladding 落架/出貨次序

收件人：生統 / 青哥

發件人：Ant Yeung

日期：19/06/2024

要求提供 / 確認 事項

A 版

落架/出貨次序:

因應會議要求，加快！修改出貨次序。不會被最頂的佔據 A 架。3 柱有工開

將未能安裝的 Glass Cladding 從 A 字架卸貨，給予可安裝的 Glass Cladding 優先裝上 A 字架出貨。

附次序和現時使用 A 架狀況。出~~備~~貨不用試水位和已試水位的 Glass Cladding。

先預本星期五出貨 T1A-CW4 #1, #2

原版:

1. 落架/出貨次序:

2. 點數清算:

\*請青哥、倉庫協助安排人手，地方位置供點算。儘快處理。

3. 如地盆有 A 架完成，請儘快回架供流傳落貨用，謝謝。

請在 2024.06.20 前完成上列要求。

附：頁

原合約工程包

原合約工程加 / 減賬

新工程報價

分發東莞各部門：

( ) 生產技術總監  連附件 ( ) 技術部  連附件 ( ) 生產部  連附件 ( ) 機械設計部  連附件  
 ( ) 採購部  連附件 (✓) 生產統籌部  連附件 (✓) 小羅&清  連附件 (✓) 倉庫 華哥  連附件  
 ( ) 質檢部  連附件 ( ) 會計部  連附件 ( ) 報關組  連附件 (✓) 青哥  連附件

分發香港各部

( ) 行政部  連附件 ( ) 會計部  連附件 ( ) 統籌部  連附件 (✓) 工程部地盤科文 積哥  連附件  
 ( ) 採購部  連附件 ( ) QS 部  連附件 ( ) 維修部  連附件 ( ) 其他 \_\_\_\_\_  連附件

傳遞編號：

發件人簽署：

HK 1178 / 24

項目經理簽署：

2024-06-19  
EI7924A

T959 未出货 GC 出货次序 (EI7924)

不用試水位

93 1847

代表已完成!

代表已落架!

代表欠数!

102

1745

6月18日晚 上地盘通 知优先	要货次序	栋数	位置	单位	柱子	涉及楼层	A字架数量	GC数量	涉及货架							已出货数量	未出货数量	备注
									9-17F	18-26F	27-35F	36-45F	46-53F	55-62F	63-67F			
☆	已出	T2	T2A-CW4	AB单位	#1	18-67F	6	111		N04:030	N04:056	N04:066	N04:071	N04:076	N04:081	102	9	
☆	①	T1	T1A-CW4	AB单位	#1	18-62F	5	101		N04:040	N04:048	N04:086	N04:094	N04:102		急出	101	
☆	①	T1	T1A-CW4	AB单位	#2	18-62F	5	101		N04:041	N04:049	N04:087	N04:095	N04:103			101	
	②	T2	T2A-CW2	AB单位	#4	18-67F	6	98		N04:028	N04:054	N04:064	N04:069	N04:074	N04:079		98	
	②	T2	T2A-CW2	AB单位	#5	18-67F	6	98		N04:029	N04:055	N04:065	N04:070	N04:075	N04:080		98	
☆	③	T2	T2A-CW2	AB单位	#2	18-67F	6	131		N04:026	N04:052	N04:062	N04:067	N04:072	N04:077	出	131	
	③	T2	T2A-CW2	AB单位	#3	18-67F	6	131		N04:027	N04:053	N04:063	N04:068	N04:073	N04:078		131	
	④	T1	T1A-CW4	AB单位	#3	36-62F	3	61				N04:088	N04:096	N04:104			61	
	④	T1	T1A-CW4	AB单位	#4	36-62F	3	61				N04:089	N04:097	N04:105			61	
☆	⑤	T1	T1A-CW2	AB单位	#5	18-62F	5	119		N04:036	N04:044	N04:082	N04:090	N04:098		出	119	
☆	⑤	T1	T1A-CW2	AB单位	#6	18-62F	5	119		N04:037	N04:045	N04:083	N04:091	N04:099			119	
	⑥	T1	T1A-CW2	AB单位	#7	36-62F	3	54				N04:084	N04:092	N04:100			54	
	⑥	T1	T1A-CW2	AB单位	#8	36-62F	3	52				N04:085	N04:093	N04:101			52	
	⑦	T3	T3A-CW4	AB单位	#1	18-67F	6	131		N04:035	N04:061	N04:110	N04:115	N04:120	N04:125		131	
	⑦	T3	T3A-CW2	AB单位	#2	9-67F	7	152	N04:021	N04:031	N04:057	N04:106	N04:111	N04:116	N04:121		152	
	⑦	T3	T3A-CW2	AB单位	#3	18-67F	6	131		N04:032	N04:058	N04:107	N04:112	N04:117	N04:122		131	
	⑧	T3	T3A-CW2	AB单位	#4	18-67F	6	98		N04:033	N04:059	N04:108	N04:113	N04:118	N04:123		98	
	⑧	T3	T3A-CW2	AB单位	#5	18-67F	6	98		N04:034	N04:060	N04:109	N04:114	N04:119	N04:124		98	

不用試水位

不用試水位

已試水位



T1AB

#5

#6

#7

#8

不用試水

不用試水  
出#5

T1-2e

T1-40


T1A CW2

M BATH.

M.B.R.

B.R.2

/F, 22/F,  
/F-42/F,  
/F, 58/F-60/F

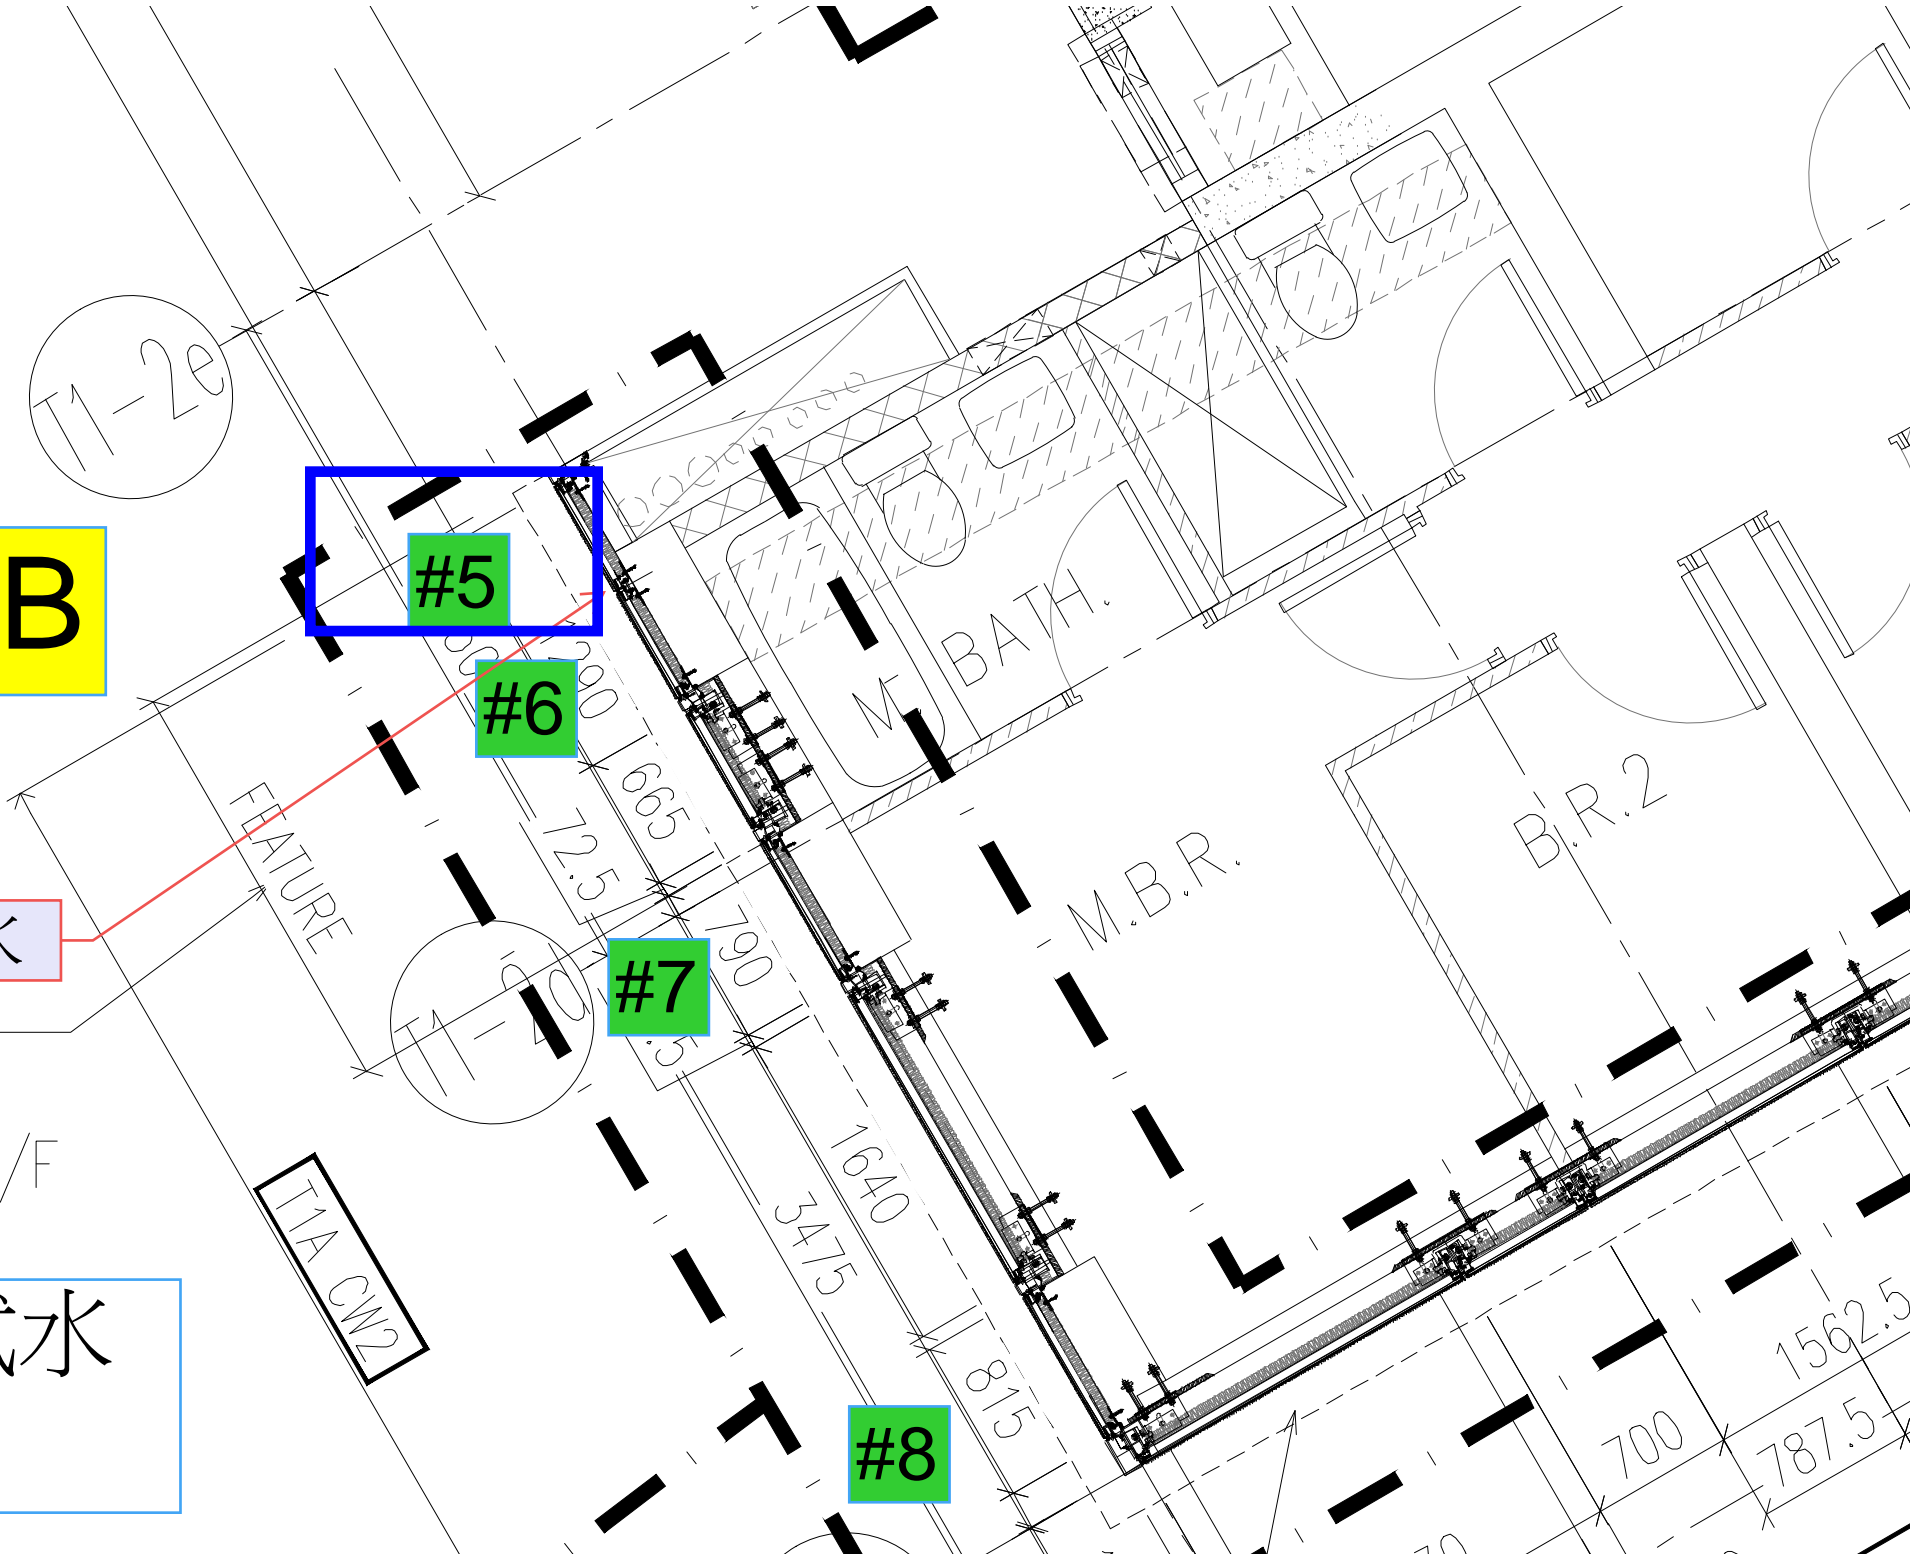



61/F, 66/F

T2A

T210

#1

T2AE

3525

640

72.5 780

2950 1780

840

192.5

192.5

M.B.R.

\*BATH


197.5

1727.5

1727.5

T2A  
CWA

FLAT

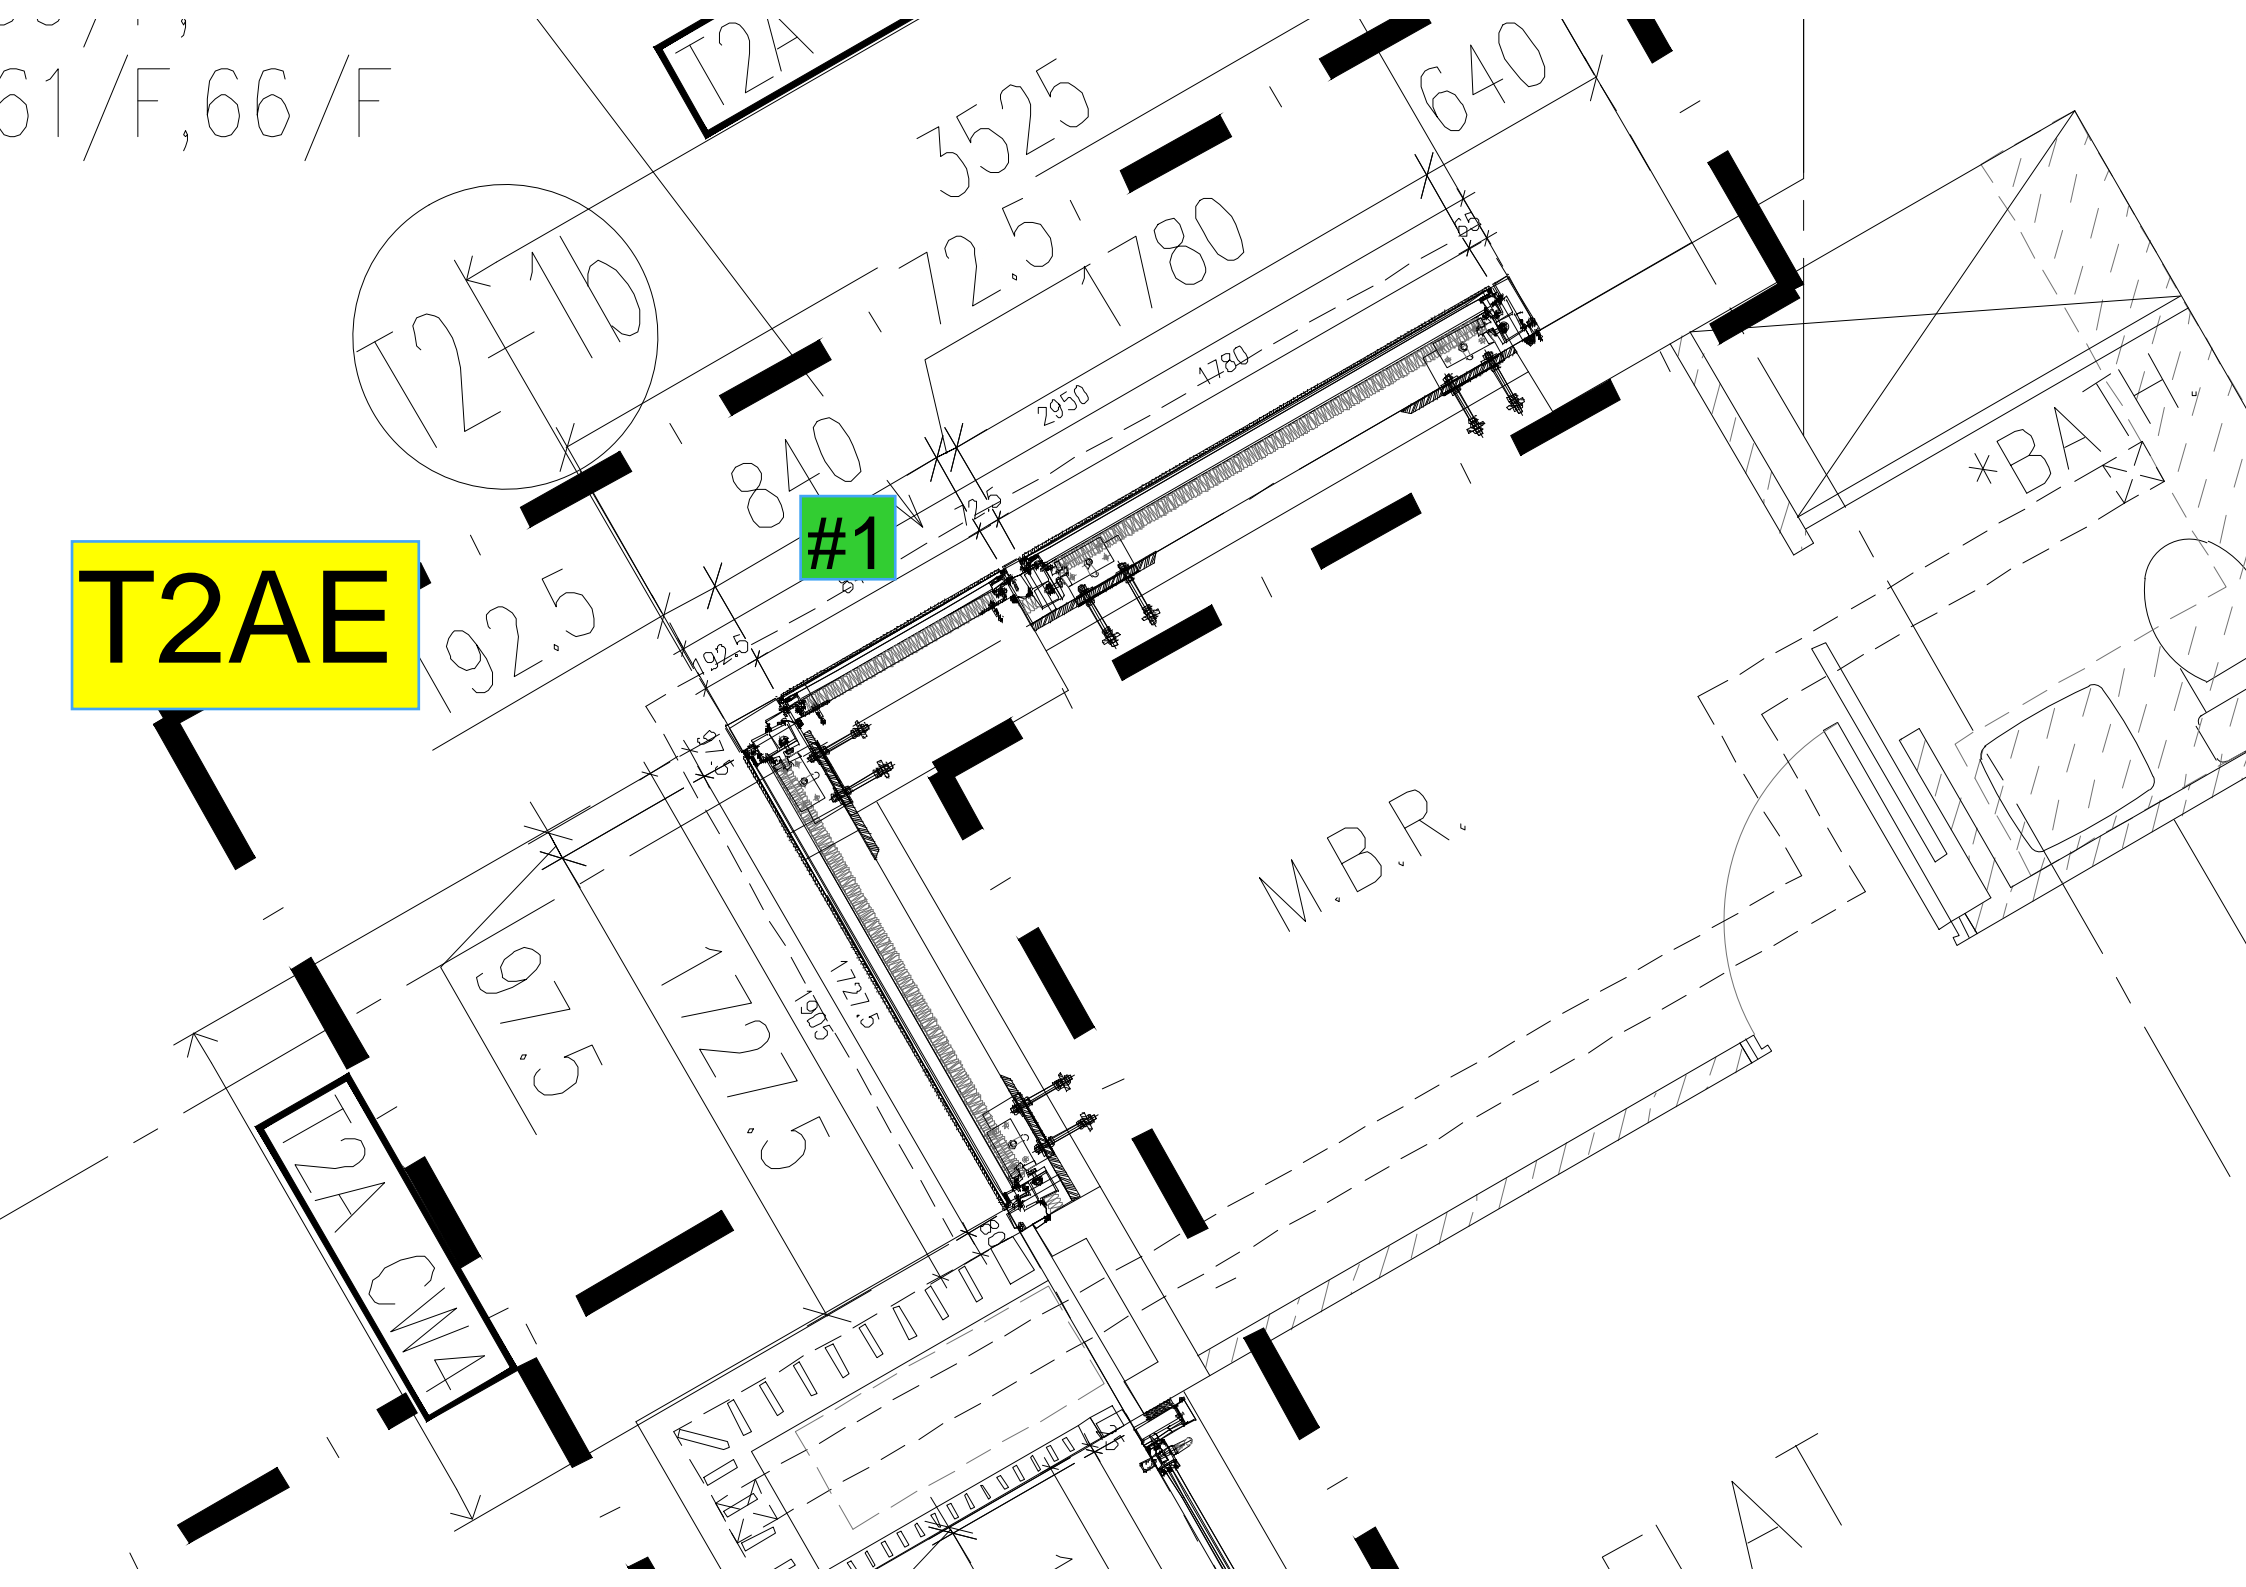

57/F, 61/, 66/FF

T3-1b

T3A CW4

#1

T3AE

OPEN KIT.

FLAT (E)

FLAT (D)

25 BAL. & U.P.

LIV.

3650

285

1219.5

2390

1120.5

1120.5

1120.5

1120.5

1005

700

125

1590

3450

1590

150

92.5

347.5

72.5

192.7

345

72.5

1219.5

1219.5

390

5.0

1120.5

1120.5

1120.5

1120.5



T3-20

#2

#3

不用試水

T3-20

T3AB

#4

#5

T3A CW2

T3A CW2

