工程指示 / 要求簡箋(E.I.)

工程指示編號：EI / 9126 / 25 修改版次：

工程編號：J - 858

工程名稱：將軍澳日出康城

工程項目：欄河玻璃 寶發訂購 1 件 地盤用 (2025-8-30)

收件人：Maggie

發件人：Jason

日期：12/09/2025

□要求提供 / □確認 事項：

- | | | |
|---------------|----------------|----------|
| () 初步鋁料 B.M. | () 加工拆圖，然後生產 | () 尺寸表 |
| () 正式鋁料 B.M. | () 技術上資料 / 指示 | () 報價 |
| () 配件 B.M. | () 樣辦或貨品說明書 | () 分判合約 |

內容：

按(2025-08-30) 信和要求訂玻璃，訂 1 件

1. 有欄河玻璃款式

- 10mmT + 1.52 PVB+ 10mmT

2. 請玻璃廠，安排熱浸

3. 不要印上熱浸標籤。只給“可移除”的標籤。

4. 玻璃標籤請註明樓層，座，單位。 *分座包箱

5. 信和訂購，已安排報價。稍後附信。

6. 此份 BM 資料來源，信和代表 Kenny。

7. 出貨地盆，由信和代表 Kenny 收貨。

謝謝請在 2025.10.11 前完成上列要求。

分發東莞各部門：

- | | | | | | |
|---------------|--------|--------------|---------|--------|----------------------|
| ()生產技術總監□連附件 | ()技術部 | □連附件 | ()生產部 | □連附件 | ()機械設計部□連附件 |
| ()採購部 | □連附件 | ()生產統籌部□連附件 | ()小羅&清 | □連附件 | |
| ()質檢部 | □連附件 | ()會計部 | □連附件 | ()報關組 | □連附件 ()其他 _____□連附件 |

分發香港各部門：

- | | | | |
|------------|------------|------------|----------------------------|
| ()行政部□連附件 | ()會計部□連附件 | ()統籌部□連附件 | ()工程部地盤科文 _____□連附件 |
| (✓)採購部□連附件 | ()QS 部 | □連附件 | ()維修部□連附件 ()其他 _____□連附件 |

傳遞編號：

發件人簽署：


HK

/ 25


項目經理簽署：

BOM NO.	BOM LOG	TOWER	FLOOR/UNIT	GLASS TYPE	GLASS NO.	SIZE	PIECE	DATE	
	S1-G5-01	1	10BF	10 CT + 1.52PV8 + 10 CT	S1-G1-TAG01	2175 x 1160 (H)	1	30/8/2025	已交信和落單30-8-2025

T1
10BF--2175 x 1160 (H) X 1/4"

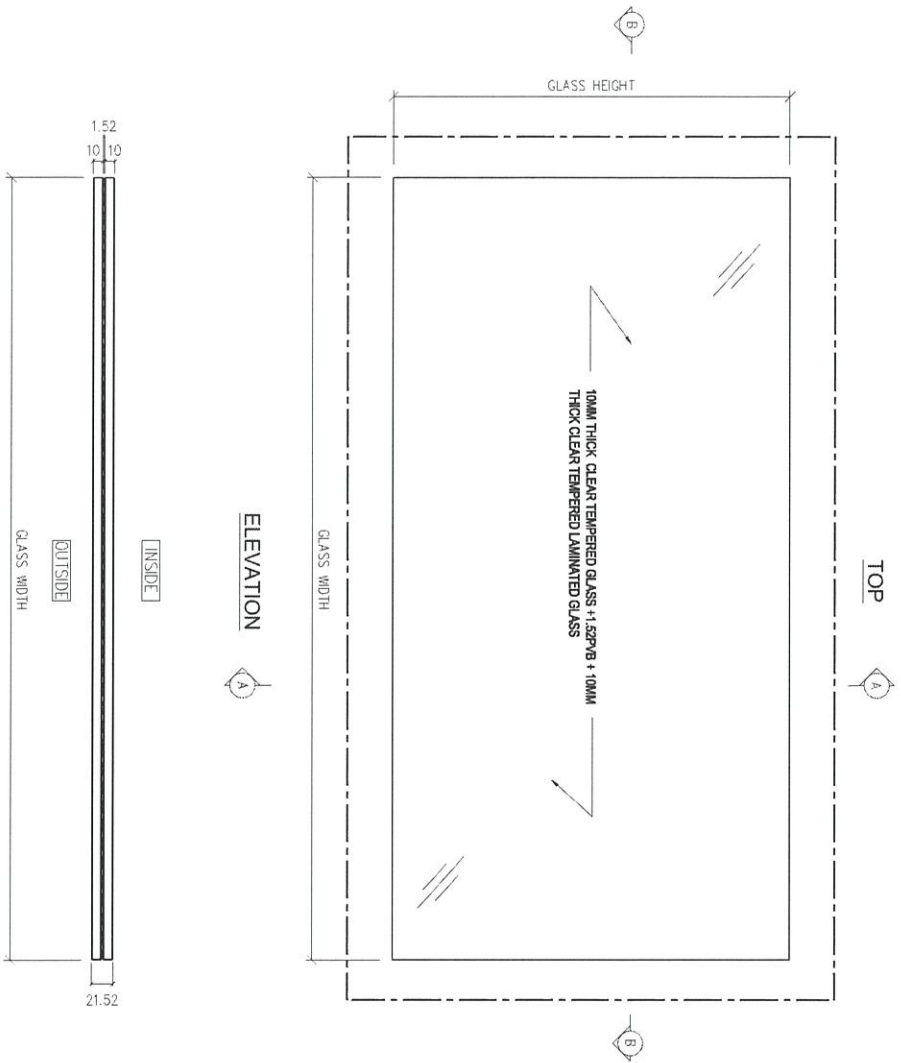

SECTION 'B - B'

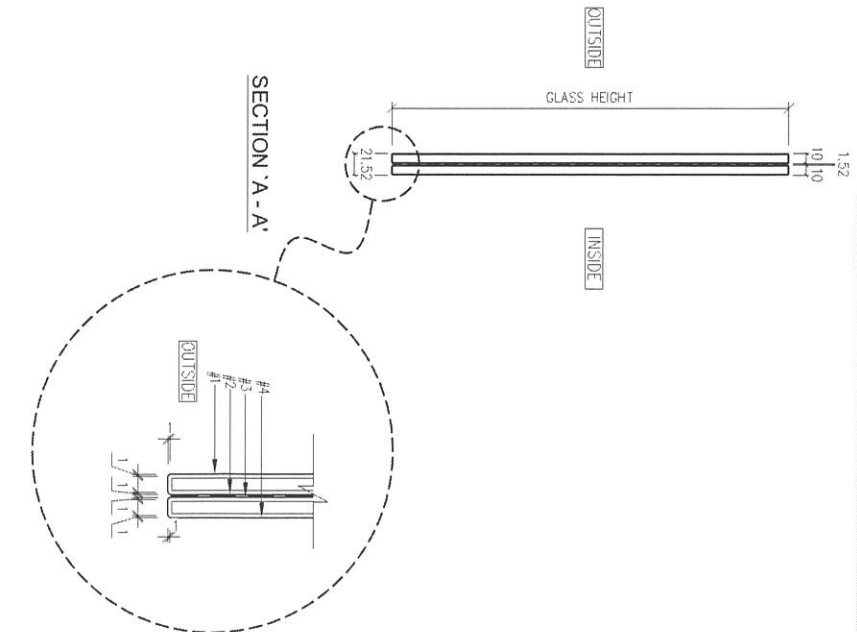

SECTION 'A - A'

LEGEND:

--- ALL EDGES TO BE GRIND FINISH

REMARKS : ALL GLASS SHAPE TO BE VIEWED FROM OUTSIDE

DISTRIBUTION TABLE

編號:	-	校核:	-
材料:	10MM THICK CLEAR TEMPERED GLASS +1.52PVB + 10MM THICK CLEAR TEMPERED LAMINATED GLASS	日期:	-
表面處理:	-	製圖:	LIN
		日期:	2022-06

DF
寶發建設工程有限公司
Polyfair Construction
& Engineering Ltd.

工程名稱:
PROPOSED RESIDENTIAL DEVELOPMENT AT TKOTL/0RP, PHASE 11,
LOHAS PARK, TSEUNG KWAN O, N.T.
項目:
FABRICATION DRAWING OF GLASS PANEL
(FOR (S1) Glass Balustrade and Aluminium Gille)

圖號:
S1-G1-001
工程編號:
PF-21006
比例:
1 : 5

修改:

業主單露台更換玻璃 執修進度表

更新日期 19/8/2025

	玻璃(正面)		玻璃(側面)	
	合標	未訂	已訂	已安裝/完成
業主單(件)	81	99%	1	1%
合標(件)	0	0.00%	0	0.00%
物料未訂(件)	3	3.70%	0	0%
物料已訂(件)	78	96%	1	100%
已安裝/完成(件)	32	40%	1	100%

- 33 用後備玻璃更換
- 5 黃色5月內訂的玻璃 · 7月底前到
- 64 黃色6月內訂的玻璃 · 8月底前到
- 33 已完成的玻璃 · 8月底前到
- 0 安全玻璃已到貨
- 0 合標
- 9 橙色7月內訂的玻璃 · 9月底前到
- 橙色8月內訂的玻璃 · 10月底前到

明細 - 業主單露台玻璃執修進度表

Unit	玻璃(正面)				玻璃(側面)				Total (單位計)				
	合標	未訂	已訂	已安裝/完成	合標	未訂	已訂	已安裝/完成	總數	合標	未訂	已訂	已安裝/完成
	0	3	78	32	0	0	1	1	82	0	3	79	33
T1_60AA			1	1					1	0	0	1	1
T1_47AA			1	1					1	0	0	1	1
T1_35AA			1						1	0	0	1	0
T1_33AA			1	1					1	0	0	1	1
T1_10AB			1	1					1	0	0	1	1
T1_19AB			1						1	0	0	1	0
T1_22AB			1	1					1	0	0	1	1
T1_38AB(業主回覆不用更換)			1						1	0	0	1	0
T1_17AC			1	1					1	0	0	1	1
T1_43AC			1	1					1	0	0	1	1
T1_16AD			1						1	0	0	1	0
T1_48AD			1						1	0	0	1	0
T1_19AE			1	1					1	0	0	1	1
T1_32AE			1	1					1	0	0	1	1
T1_20AF(業主回覆不用更換)			1						1	0	0	1	0
T1_28AF(業主回覆不用更換)			1						1	0	0	1	0
T1_29AF			1						1	0	0	1	0
T1_39AF(業主回覆不用更換)			1						1	0	0	1	0
T1_32AG(業主回覆不用更換)			1						1	0	0	1	0
T1_39AG			1						1	0	0	1	0
T1_27BA			1	1					1	0	0	1	1
T1_47BA			1						1	0	0	1	0
T1_18BB			1	1					1	0	0	1	1
T1_33BB			1				1	1	2	0	0	2	1
T1_41BC(業主回覆不用更換)			1						1	0	0	1	0
T1_28BC			1	1					1	0	0	1	1
T1_39BC			1	1					1	0	0	1	1
T1_46BC(業主回覆不用更換)			1						1	0	0	1	0
T1_47BC			1	1					1	0	0	1	1
T1_48BC			1						1	0	0	1	0
T1_21BD			1	1					1	0	0	1	1
T1_39BD			1	1					1	0	0	1	1
T1_45BD			1	1					1	0	0	1	1
T1_48BD			1						1	0	0	1	0
T1_10BE			1						1	0	0	1	0
T1_16BE			1						1	0	0	1	0
T1_30BE			1	1					1	0	0	1	1
T1_10BF		1	1	1					1	0	1	0	1
T1_33BF			1	1					1	0	0	1	1
T1_37BF			1	1					1	0	0	1	1
T1_42BF			1	1					1	0	0	1	1
T2_17AB			1						1	0	0	1	0
T2_38BA			1	1					1	0	0	1	1
T2_12BC			1	1					1	0	0	1	1
T2_10BC			1	1					1	0	0	1	1
T2_26BD			1	1					1	0	0	1	1
T2_28BD			1	1					1	0	0	1	1
T2_26BD (更換後出現哈哈)			1	1					1	0	0	1	0
T2_21AF			1						1	0	0	1	0
T2_29AF			1	1					1	0	0	1	1
T2_38AF			1	1					1	0	0	1	1
T2_36AF			1						1	0	0	1	0
T2_15AD			1						1	0	0	1	0
T2_28AD			1						1	0	0	1	0
T2_22BA			1						1	0	0	1	0
T2_36AF			1						1	0	1	0	0
T2_10AF			1	1					1	0	1	0	1
T3_18AA			1						1	0	1	0	0
T3_32AA			1	1					1	0	0	1	1
T3_35AA			1						1	0	0	1	0
T3_37AA			1						1	0	0	1	0
T3_42AB			1	1					1	0	0	1	1
T3_15AC			1						1	0	0	1	0
T3_21AF			1						1	0	0	1	0
T3_27AF			1						1	0	0	1	0
T3_50AF			1						1	0	1	0	0
T3_28BA			1						1	0	0	1	0
T3_21BE			1						1	0	0	1	0
T3_23BE			1						1	0	0	1	0
T3_38BE			1						1	0	0	1	0
T3_41BE			1						1	0	0	1	0
T3_12BF			1						1	0	0	1	0
T3_21BF			1						1	0	0	1	0
T3_23BF			1						1	0	0	1	0
T3_28BF			1						1	0	0	1	0
T3_33BF			1						1	0	0	1	0
T3_36BF			1						1	0	0	1	0
T3_38BF			1						1	0	0	1	0
T3_43BF			1						1	0	0	1	0
T3_52BF			1						1	0	0	1	0
T3_56BF			1						1	0	0	1	0

SI-G1-01

已訂
EI 9101

已訂
EI 9101
