



工程指示 / 要求簡箋 ENGINEER INSTRUCTIONS(E.I.)

工程指示編號:	EI- 7154	修改版本:	A
	HK- 0461 / 24		
工程編號:	J 859	工程名稱:	啟德6551
收件人:	生統	發件人:	nero
工程項目:	預制窗及後裝窗 - 關於預制及後裝窗偏林箱及不銹鋼網包裝要求及出貨安排	日期:	14/03/2024

<input type="checkbox"/> 原合約工程包	<input type="checkbox"/> 原合約工程加 / 減賬 QT-	<input type="checkbox"/> 新工程報價 QT-
---------------------------------	--	------------------------------------

信件批核號碼/圖紙參考編號:	批核模具圖紙編號:
客戶指示附件:	管理內部批簽署:

<input type="checkbox"/> 初步鋁料 B.M.	<input type="checkbox"/> 加工拆圖, 然後生產	<input type="checkbox"/> 尺寸表
<input type="checkbox"/> 正式鋁料 B.M.	<input type="checkbox"/> 技術上資料/指示	<input type="checkbox"/> 報價
<input type="checkbox"/> 配件 B.M.	<input type="checkbox"/> 樣辦或貨品說明書	<input type="checkbox"/> 分判合約
<input type="checkbox"/> 其他:		

內容: 有關於預制窗及後裝窗偏林箱尚未出貨之包裝最新要求

****請注意****
按地盤管理人員反映及請求, 所有偏林箱必需跟其配套的不銹鋼先在廠部安排併裝好才一併包裝出貨到地盤。
*已包裝好的都需拆開重新按以上方案包裝才好出貨。

偏林箱併裝做法可參考附件相片, 如有問題再告知, 謝謝

完成上列要求日期: ASAP

國內


<input type="checkbox"/> 生產技術總監	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 技術部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 生產部	<input type="checkbox"/> 連附件
<input type="checkbox"/> 採購部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input checked="" type="checkbox"/> 生產統籌部	<input checked="" type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 報關組	<input type="checkbox"/> 連附件
<input type="checkbox"/> 質檢部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 會計部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 機械設計部	<input type="checkbox"/> 連附件
<input type="checkbox"/> 香港辦	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 其他:			

香港

<input type="checkbox"/> 行政部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 會計部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 統籌部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 工程部	<input type="checkbox"/> 連附件
<input type="checkbox"/> 採購部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> QS部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input checked="" type="checkbox"/> 地盤管理	<input checked="" type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 維修部	<input type="checkbox"/> 連附件

*發件人簽署:		*組別成員批核簽署:	
傳遞編號:	HK 0461 / 24	項目經理簽署:	14/3/24

1) 徧林箱左右兩頭包上膠紙

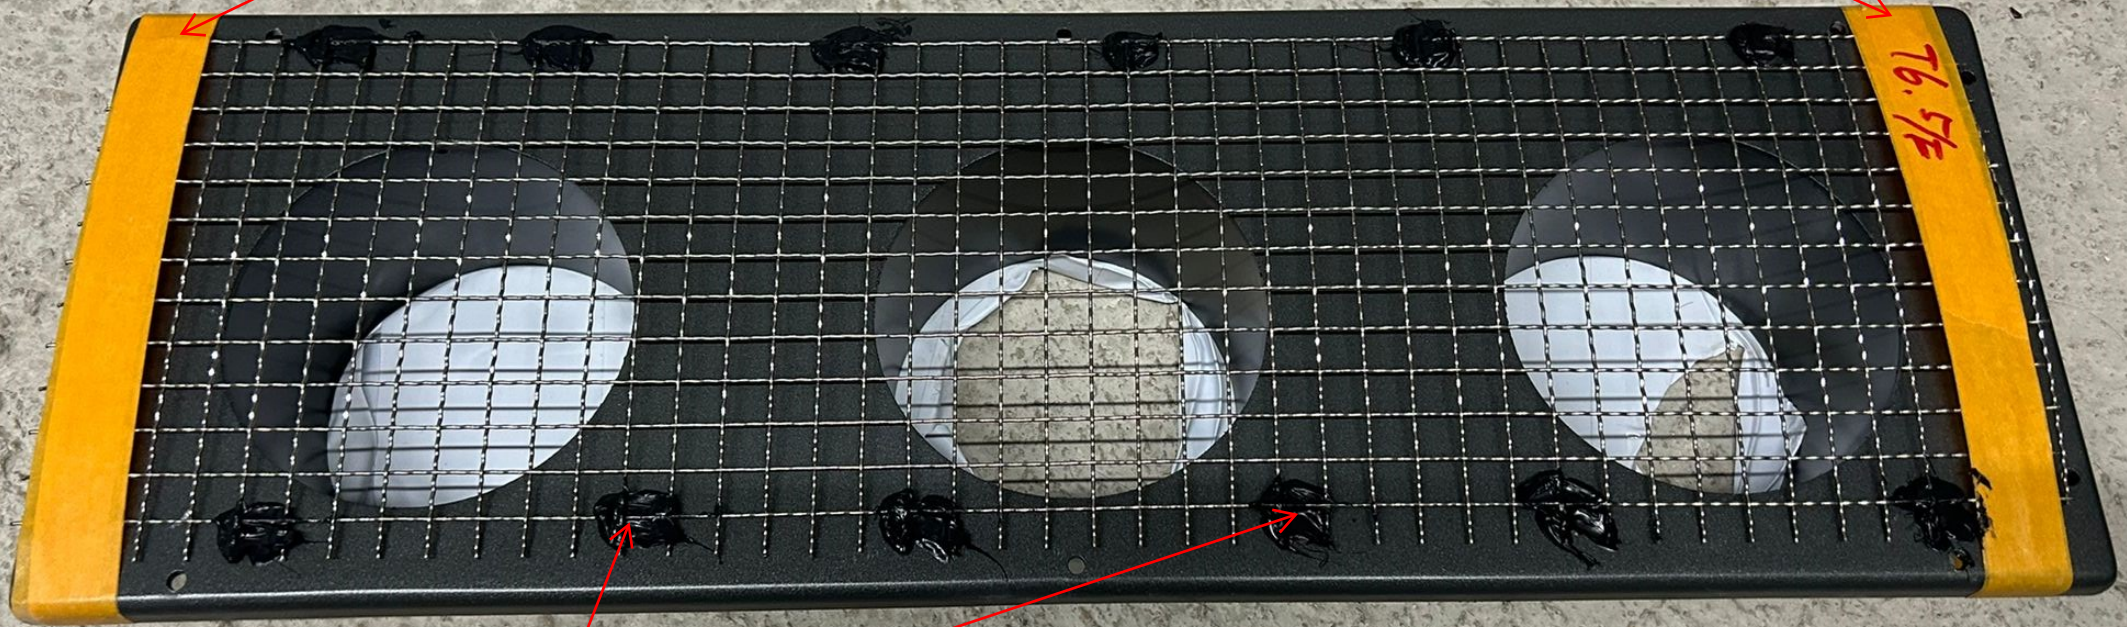

2) 點黑膠固定網於徧林箱面
(距離約中至中50 - 100mm)

徧林箱及不銹鋼網建議併裝做法：

- 1) 先在兩頭包膠紙，如果徧林箱長度超過700 mm長中間位置加多條膠紙固定
- 2) 不銹鋼網頂底點膠固定中至中大約50mm - 100mm (可按穩固程度調節距離)
- 3) 併裝好後再一併獨立包裝, 包裝面貼上標籤(座數/窗號)
