



工程指示 / 要求簡箋(E.I.)

工程指示編號：EI / 1566 / 20

修改版次：J

工程編號：J851

工程名稱：青衣 明翹匯

工程項目：確認模圖(單元件幕牆)

收件人：羅小姐

發件人：Leung Hin Wai

日期：14/04/2020

要求提供 / 確認 事項：

- | | | |
|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 初步鋁料 B.M. | <input type="checkbox"/> 加工拆圖，然後生產 | <input type="checkbox"/> 尺寸表 |
| <input type="checkbox"/> 正式鋁料 B.M. | <input type="checkbox"/> 技術上資料 / 指示 | <input type="checkbox"/> 報價 |
| <input type="checkbox"/> 配件 B.M. | <input type="checkbox"/> 樣辦或貨品說明書 | <input type="checkbox"/> 分判合約 |
| <input type="checkbox"/> 其他：_____ | | |

內容：

現確認附頁模圖。共1頁。

請在_____前完成上列要求。

附：1+1 頁

以上項目為：

- 原合約工程包 原合約工程加 / 減賬 新工程報價

原因：-_____

分發東莞各部門：

- () 生產技術總監 連附件 () 技術部 連附件 () 生產部 連附件 () 機械設計部 連附件
 () 採購部 連附件 () 生產統籌部 連附件
 () 質檢部 連附件 () 會計部 連附件 () 報關組 連附件 () 其他 _____ 連附件

分發香港各部門：

- () 行政部 連附件 () 會計部 連附件 () 統籌部 連附件 () 工程部地盤科文(柄) 連附件
 () 採購部 連附件 () QS 部 連附件 () 維修部 連附件 () 其他 _____ 連附件


傳遞編號：

HIR 0562





發件人簽署：

項目經理簽署：

CUSTOMER	HONGKONG CO.	CUSTOMER APPROVAL	CUST PART NO.	X85743
			SECTION NO.	LH0091171

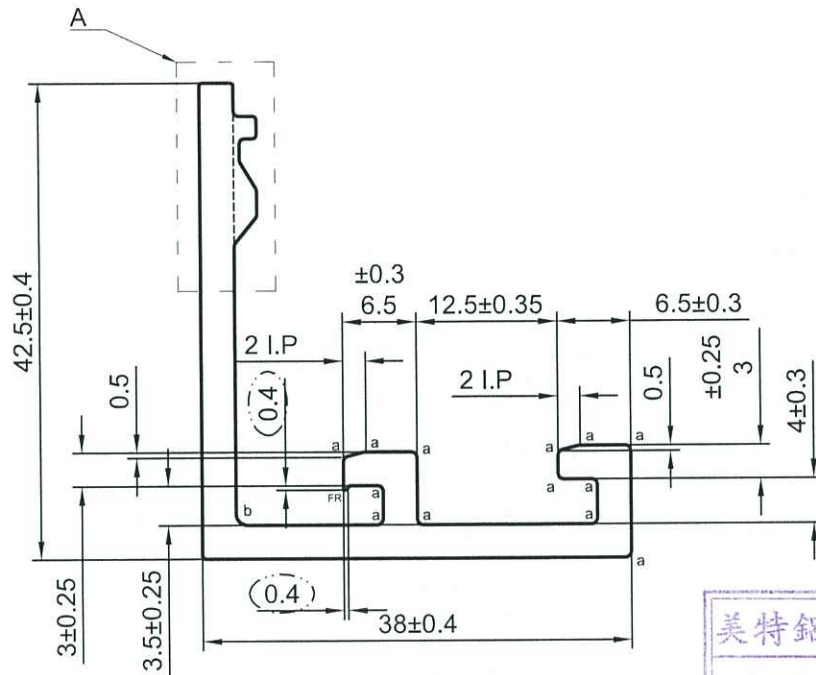

美特铝质有限公司
 承認圖面
 日期 14/4-2020

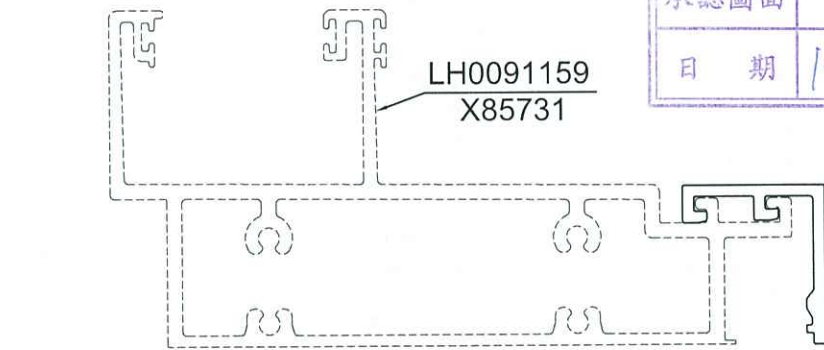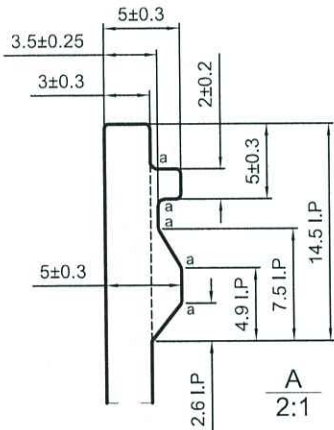

a=R0.5 b=R1 c=R0.2

----- 次要装饰面, 喷涂膜厚不足, 但不露底
 ----- 装饰面

*配合尺寸以实物配合效果为准!

V.F
 SCALE 1:2

SCALE 1:4

SIGNATURE GRADEING	HIGH SIGNATURE GRADEING	C.C.DIA(MM)	Ø 56.68			喷涂收费周长(mm):		83.70
AREA (SQ MM)	308.89	UNSPECIFIED THICKNESS	3±0.25	PERIMETER (MM)	202.52	STANDARD	BS EN755	SCALE 1.5:1
MASS (KG/M)	0.837	UNSPECIFIED CORNERS	R 0.3	SURFACE AREA	83.70	ALLOY	6063-T6	VERSION C
COMPANY ISSUE	B	DRAWN	陈晓舒	DATE	2020-04-01	APPELLATION	-	PAGE OF
		STANDARDIZATION		DATE				
		TO SIGN	陈国提	DATE				
		AUDITING		DATE				
MARKER	MODIFY	FILE NO	SIGNATURE	DATE	APPROV	DATE		
