



工程指示 / 要求簡箋(E.I.)

工程指示編號：EI10813/19

修改版次：

工程編號：J835

工程名稱：TKO66D2 A&A Works

工程項目：廠用玻璃 BM

收件人：Maggie

發件人：Timmy

日期：15/07/2019

要求提供 / 確認 事項：

- | | | |
|---|-------------------------------------|-------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 初步鋁料 B.M. | <input type="checkbox"/> 加工拆圖，然後生產 | <input type="checkbox"/> 尺寸表 |
| <input type="checkbox"/> 正式鋁料 B.M. | <input type="checkbox"/> 技術上資料 / 指示 | <input type="checkbox"/> 報價 |
| <input checked="" type="checkbox"/> 玻璃 B.M. | <input type="checkbox"/> 樣辦或貨品說明書 | <input type="checkbox"/> 分判合約 |
| <input type="checkbox"/> 其他：_____ | | |

內容：

按附頁配件 BM 訂購。

請在 26/7/19 前完成上列要求。

附有關圖紙 / 文件：

1+3 頁

以上項目為：

原合約工程包 原合約工程加 / 減賬 新工程報價

原因：- 則卸改設計

分發東莞各部門：

- () 生產技術總監 連附件 () 技術部 連附件 () 生產部 連附件 () 機械設計部 連附件
 () 採購部 連附件 (X) 生產統籌部 連附件
 () 質檢部 連附件 () 會計部 連附件 () 報關組 連附件 () 其他 _____ 連附件

分發香港各部門：

- () 行政部 連附件 () 會計部 連附件 () 統籌部 連附件 () 工程部地盤科文 連附件
 (X) 採購部 連附件 () QS 部 連附件 () 維修部 連附件 () 其他 _____ 連附件

傳遞編號：HK - 1601/19 (FTP)

發件人簽署：Timmy

項目經理簽署：P.P. [Signature]

工程號:

J-835

計算:

曾建平

日期:

09/07/2019

送呈:

施哥

地盤名稱:

將軍澳66D平台

核對:

日期:

副本:

工廠用玻璃B.M.表

項目類別:

A & A WORKS

批准:

日期:

A/C Code:

BM編號:

修改版次:

總計玻璃面積 (平方米): 4.226

此BM依據

序號	修改內容	玻璃編號	顏色與類型	厚度 (mm)	玻璃尺寸		數量 (塊)	總面積 (平方米)	備注
					寬度W (mm)	高度H (mm)			
1		J835-G40	12mm THK. CLEAR TEMPERED GLASS	12	1400	3010	1	4.23	梗坡 (詳見加工圖J835-GI20)
2									
3									
4									
5									
28							總計:	1	4.23

加工注意事項:


- 1) 本表中所有玻璃對角線尺寸偏差要求不超過正負2mm。
- 2) 本表中所有玻璃要求粗磨邊及精磨邊處理並倒棱角。
- 3) 本表中不同種類玻璃參照玻璃加工圖加工。
- 4) 本表中所有強化玻璃均需HEAT SOAK TEST。
- 5) 本表中所有強化玻璃之人爐方向均以寬度方向進入。
- 6) 本表中所有玻璃成品均需注明室內外面及其玻璃編號，以便識別。 繳

 美特鋁質 有限公司 MIDI Aluminium Fabricator Ltd.				類別	物料號			
修改				制圖	曾建平	2019.07.09	圖號	J835-GL20
日期				復核			數量	見下表
				批准			位置	

玻璃編號	厚度 (mm)	玻璃尺寸		數量 (塊)	备注
		寬度W (mm)	高度H (mm)		
J835-G40	12mm	1404	3010	1	


1400

頂

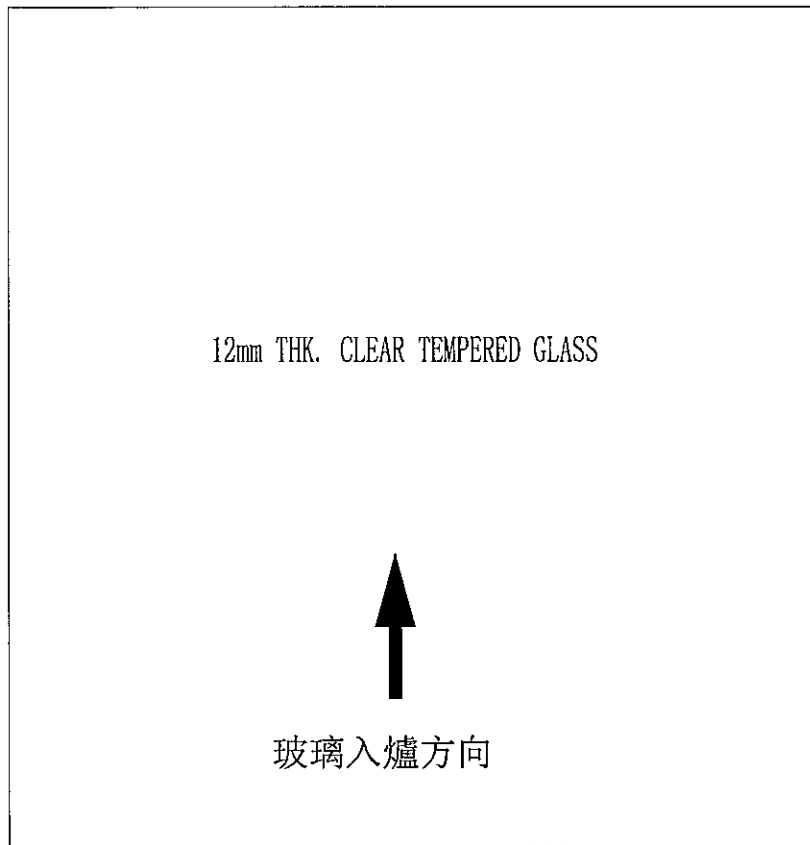


玻璃入爐方向

底



室外面

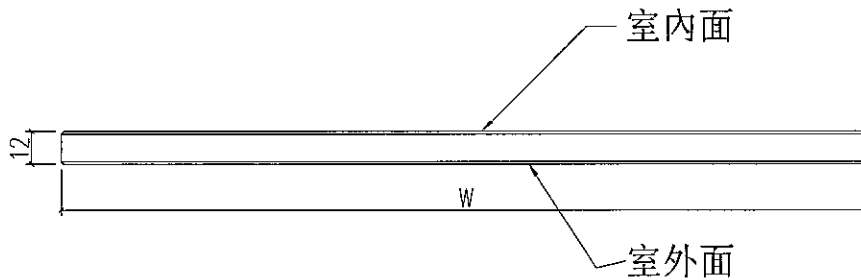

室內面

室外面

工程號	J-835	地盤	將軍澳天晉平臺		附 件
名稱	玻璃加工圖		採用		
材料	12mm THK. CLEAR TEMPERED GLASS		地盤		
顏色	--		工廠		

