



工程指示 / 要求簡箋(E.I.)

工程指示編號：EI / 9897/8 修改版次：
 工程編號：J835 工程名稱：TKO66D2
 工程項目：地盤用玻璃 (T3 Lobby 通道門玻璃)
 收件人：羅小姐 發件人：Timmy 日期：05/11/2018

要求提供 / 確認 事項：

- | | | |
|--|-------------------------------------|-------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 初步鋁料 B.M. | <input type="checkbox"/> 加工拆圖，然後生產 | <input type="checkbox"/> 尺寸表 |
| <input type="checkbox"/> 正式鋁料 B.M. | <input type="checkbox"/> 技術上資料 / 指示 | <input type="checkbox"/> 報價 |
| <input checked="" type="checkbox"/> 玻璃 B.M. | <input type="checkbox"/> 樣辦或貨品說明書 | <input type="checkbox"/> 分判合約 |
| <input checked="" type="checkbox"/> 其他：玻璃加工圖 | | |

內容：

按附頁加工圖紙加工，並請按期完成。

請在 21/11/2018 前完成上列要求。

附有關圖紙 / 文件：

1+1 頁

以上項目為：

- 原合約工程包 原合約工程加 / 減賬 新工程報價

原因：- 相關報價已批回

分發東莞各部門：

- () 生產技術總監 連附件 () 技術部 連附件 () 生產部 連附件 () 機械設計部 連附件
 () 採購部 連附件 () 生產統籌部 連附件
 () 質檢部 連附件 () 會計部 連附件 () 報關組 連附件 () 其他 _____ 連附件


分發香港各部門：

- () 行政部 連附件 () 會計部 連附件 () 統籌部 連附件 (X) 工程部地盤科文 連附件 **傑**
 (X) 採購部 連附件 () QS 部 連附件 () 維修部 連附件 () 其他 _____ 連附件

傳遞編號：HK - (FTP)

發件人簽署：

項目經理簽署：P.R.



美特鋁質有限公司
MTD Aluminium Fabricator Ltd.

工程號: J-835
地盤名稱: 將軍澳66D平台

計算: 曾建平
日期: 05/11/2018
送呈: 施哥

工廠用玻璃B.M.表
項目類別: GLASS WALL 玻璃BM表

核對:
批准:
日期:


副本:
A/C Code:
此BM依據


BM編號: 修改版次: 總計玻璃面積 (平方米): 1.996

序號	修改內容	玻璃編號	顏色與類型	厚度 (mm)	玻璃尺寸		數量 (塊)	總面積 (平方米)	備注
					寬度W (mm)	高度H (mm)			
1		J835-GL234	XINYI 12mm THK. Clear Tempered Glass	12	766	2606	1	2.00	
2									
3									
4									
5							1	2.00	
				總計:					

加工注意事項:

- 1). 本表中所有玻璃對角線尺寸偏差要求不超過正負2mm。
- 2). 本表中所有玻璃要求粗磨邊處理並倒稜角。
- 3). 本表中不同種類玻璃參照玻璃加工圖加工。
- 4). 本表中所有強化玻璃均需HEAT SOAK TEST。
- 5). 本表中所有強化玻璃之入爐方向均以寬度方向進入。
- 6). 本表中所有玻璃成品均需注明室內外面及其玻璃編號，以便識別。

 美特鋁質 有限公司 MIDI Aluminium Fabricator Ltd.				類別		物料號		
				制圖	曾建平	2017.06.29	圖號	J835-GL234
修改				復核	王禮秋	2017.06.29	數量	1
日期				批准			位置	GD05

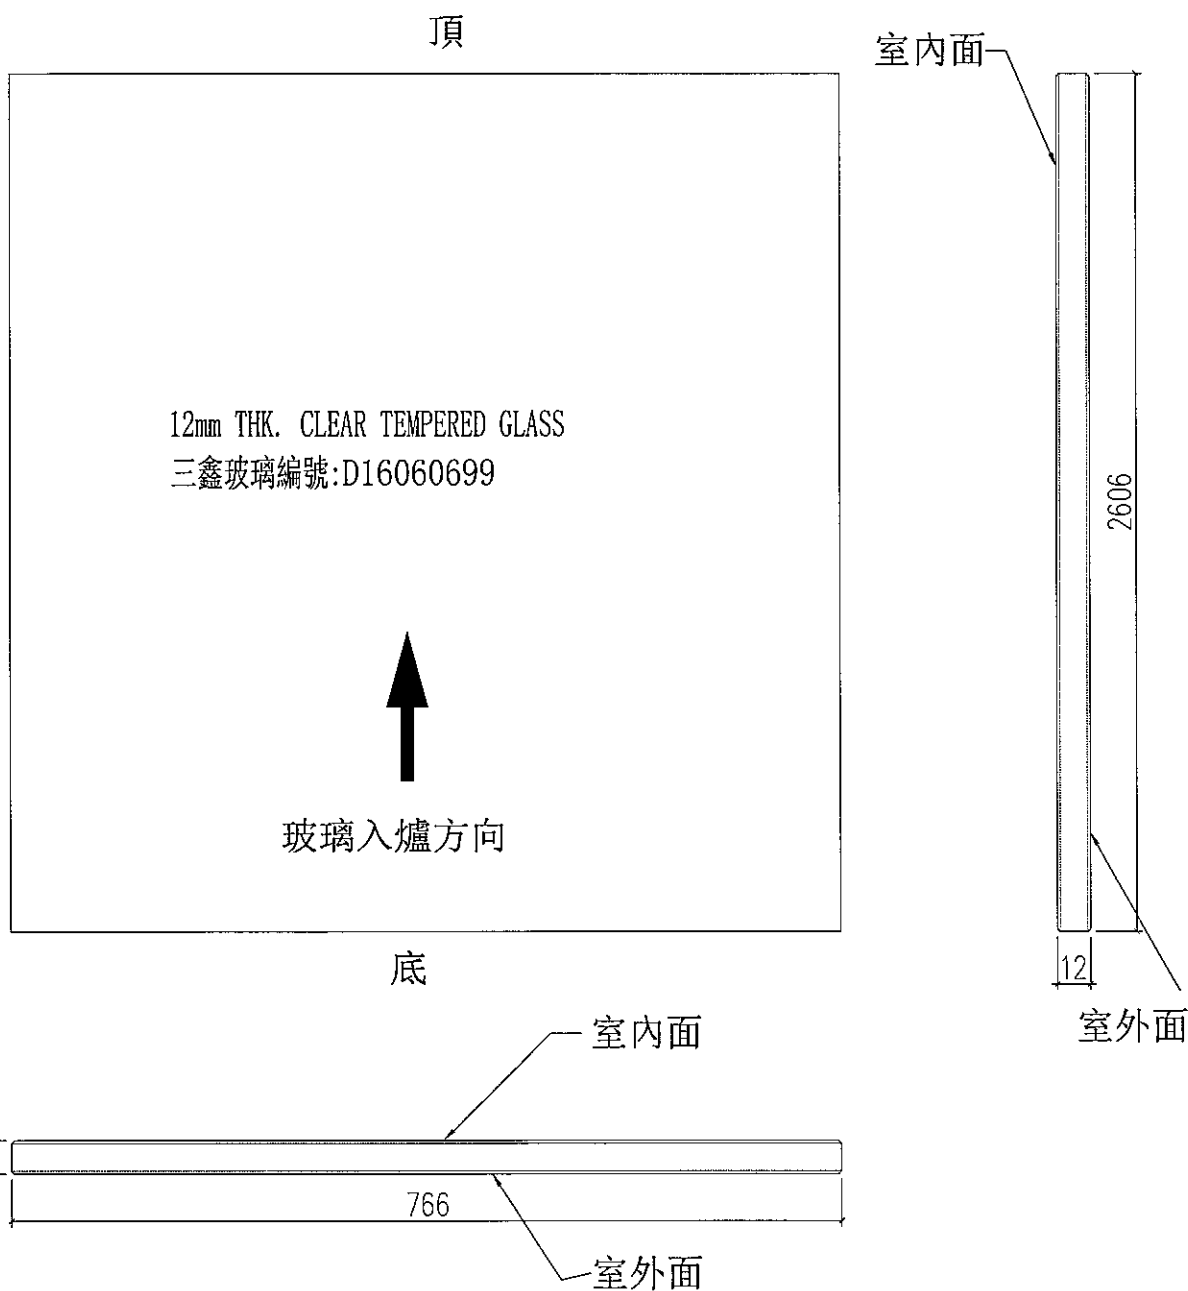

工程號	J-835	地盤	將軍澳天晉平臺		附 件
名稱	玻璃加工圖		採用		
材料	12 THK. CLEAR TEMPERED GLASS		地盤	<input checked="" type="checkbox"/>	
顏色	--		工廠		
