

工程指示 / 要求簡箋(E.I.)

工程指示編號：EI 9651 / 18 修改版次：
 工程編號：JB36 工程名稱：日出康城7期平台
 工程項目：kindergarten canopy 大便鋁料B.M
 收件人：Maggie Lor, 王統 發件人：李耀明 日期：2018/8/22

要求提供 / 確認 事項：

- | | | |
|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 初步鋁料 B.M. | <input type="checkbox"/> 加工拆圖，然後生產 | <input type="checkbox"/> 尺寸表 |
| <input type="checkbox"/> 正式鋁料 B.M. | <input type="checkbox"/> 技術上資料 / 指示 | <input type="checkbox"/> 報價 |
| <input type="checkbox"/> 配件 B.M. | <input type="checkbox"/> 樣辦或貨品說明書 | <input type="checkbox"/> 分判合約 |
| <input type="checkbox"/> 其他：_____ | | |

內容：

請後附件資料，安排訂購鋁料自廠

請在 2018/8/30 前完成上列要求。

附有關圖紙 / 文件：

2頁

以上項目為：

- 原合約工程包 原合約工程加 / 減賬 新工程報價

原因：-

分發東莞各部門：

- () 生產技術總監 連附件 () 技術部 連附件 ^{冬雲} () 生產部 連附件 () 機械設計部 連附件
 () 採購部 連附件 () 生產統籌部 連附件 ^{梅軍}
 () 質檢部 連附件 () 會計部 連附件 () 報關組 連附件 () 其他 _____ 連附件

分發香港各部門：


- () 行政部 連附件 () 會計部 連附件 () 統籌部 連附件 () 工程部地盤科文 連附件
 () 採購部 連附件 () QS 部 連附件 () 維修部 連附件 () 其他 _____ 連附件

傳遞編號：

HK1296 / 18

發件人簽署：

項目經理簽署：



美特鋁質有限公司
MIDI Aluminum Fabricator Ltd.

工程號: J-836

計算:

胡冬雲

日期:

2018.08.18

送呈:

胡哥

地盤名稱: 日出康城7期平台

核對:

劉春

日期:

2018.08.20

副本:

廠用鋁型材B.M.表

項目類別: CANOPY AT KINDERGARTI 批准:

日期:

BM編號:

A/C Code:

有顏色鋁料(Kg): 312.71


無顏色鋁料(Kg): 181.79

V.F總(米)


20.15

序號	修改標示	物料編號	鋁料名稱	顏色	合金狀態	長度 (mm)	數量(支)		重量(Kgs)		V.F.(米 ²)		備注	
							實用	後備	總數	Kg/M	總重量	米 ² /米		Total V.F.
1		X85543	破瑞角	TUC51602AL(RS)-3深	6063-T6	4600	5	1	6	11.33	312.708	0.73	20.148	
2		X85534	加力角	MILL	6063-T6	5200	16	1	17	1.055	93.262		0.000	
3		50x50x3鋁角		MILL	6063-T6	5100	20	2	22	0.789	88.526		0.000	
								合計:	45		494.50		20.148	


J-836 (日出康城) CANOPY AT KINDERGARTEN 鋁料V.F噴圖

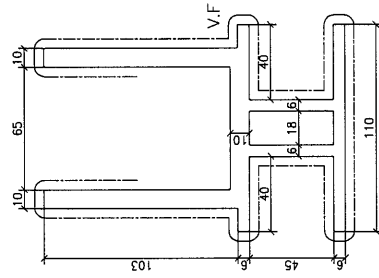

模號: X85543
 名稱: 玻璃骨
 合金狀態: 6063-T6
 重量: 11.33KG/M
 V.F.: 730 mm



模號: X85534
 名稱: 加力骨
 合金狀態: 6063-T6
 重量: 1.055KG/M
 V.F.: -- mm



模號:
 合金狀態: 6063-T6
 重量: 0.789KG/M
 名稱: 50x50x3mm鋁角
