

工程指示 / 要求簡箋(E.I.)

工程指示編號：EI / 0076 / 19

修改版次：-

工程編號：J - 837

工程名稱：觀塘裕民坊

工程項目：幕牆 拆 BM、包箱、上料等資料

收件人：Maggie / 生統 / 永林 發件人：Ant Yeung

日期：12/01/2019

要求提供 / 確認 事項：

- | | | |
|------------------------------------|--|-------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 初步鋁料 B.M. | <input type="checkbox"/> 加工拆圖，然後生產 | <input type="checkbox"/> 尺寸表 |
| <input type="checkbox"/> 正式鋁料 B.M. | <input checked="" type="checkbox"/> 技術上資料 / 指示 | <input type="checkbox"/> 報價 |
| <input type="checkbox"/> 配件 B.M. | <input type="checkbox"/> 樣辦或貨品說明書 | <input type="checkbox"/> 分判合約 |

內容：

永林：請在出單日前一星期傳來 BM 作訂購玻璃

1) 熱浸爐數為初步估算，實際以玻璃廠為準。本地盆業主要求 T3：100% 駐廠視察熱浸

2) 請留意包箱要求，BM Excel 請也注明

3) 請留意玻璃加工時不要印鋼化標籤及半鋼化標籤

4) BD 要求：IGU 夾膠用 DC 983 結構膠

5) 因阻唧膠，玻璃拍正後拍，見 EI-10067B。

6) 請留意大細玻璃說明

7) 地盆：如有後做位，要後上玻璃，請給資料。

謝謝！

請在 2019 / 01 / 22 前完成上列要求。

附：

以上項目為：

- 原合約工程包 原合約工程加 / 減賬 新工程報價

原因：-

分發東莞各部門：

- () 生產技術總監 連附件 () 技術部 連附件 永林 () 生產部 連附件 () 機械設計部 連附件
 () 採購部 連附件 () 生產統籌部 連附件 梅
 () 質檢部 連附件 () 會計部 連附件 () 報關組 連附件 () 其他 楊榮輝 連附件

分發香港各部門：

- () 行政部 連附件 () 會計部 連附件 () 統籌部 連附件 () 工程部地盤科文 連附件 炳哥
 () 採購部 連附件 () QS 部 連附件 () 維修部 連附件 () 其他 _____ 連附件

傳遞編號：

發件人簽署：

HK 0128 / 19

項目經理簽署：

72 0076
HK 0128

2019.01.12	幕牆 (大貨)		幕牆 (生窗玉)		幕牆 (門玉)		Glass Cladding		鋁窗		Acoustic Door (隔音室內趟)	
	日期	Remark	日期	Remark	日期	Remark	日期	Remark	日期	Remark	日期	Remark
備料	2018.12.13	EI 10030	2018.12.13	EI 10030	2018.12.13	EI 10030	2018.12.18	EI 10050	2018.12.18	EI 10050	N/A	N/A
出單	2019.03.17		2019.03.17		2019.03.17		2019.05.01		2019.07.17		2019.08.17	
熱浸	2019.04.16	200 爐	N/A	N/A	N/A	N/A	2019.05.31	15 爐	2019.08.16	20 爐	2019.09.16	12 爐
加工	2019.05.01	IGU	2019.05.01	IGU	2019.05.01	Lam	N/A	單片	N/A	單片	N/A	單片
*包箱	大玻璃： 按座按層 按單位按kg, 兩件一箱不 可超出 450kg		細玻璃 按座按層 按單位		按座 按尺寸		按座 按單位 按尺寸		按座 按樓層 按尺寸		按座 按尺寸	
出貨	2019.05.16	直到地盆	2019.05.16	送廠加工 窗玉	2019.05.16	送廠加工 門玉	2019.06.15	送廠加工 打膠	2019.09.15	直到地盆	2019.10.16	送廠加工
拆棚	2019.08.01 (預算)											
*上料	要用2個月	大玻： 開棚用秤 細玻： 沙機	2019.06.16 廠按單位 連窗玉出貨 到地盆	沙機	2019.06.16 廠按單位 出 貨到地盆	大玻： 開棚用秤 細玻： 沙機	2019.07.01 廠按單位 連窗玉出貨 到地盆	沙機		沙機		大玻： 開棚用秤 細玻： 沙機 / 粒
安裝	2019.07.15	追拆棚/吊船	2019.07.15	追拆棚/吊船	2019.07.15	拆棚後	2019.07.15	拆棚前	2019.10.15	拆棚後	2019.11.15	拆棚後

最大件	2160Wx 2250H (CW-2503)	m2	T.H. 1075Wx 1380H (CW-2102)	m2	1825Wx 2625H (CW-2106)	m2	917.5Wx 2250H	m2	720x1395	m2	1745x2625 (T5)	m2
最重	230	kg	75	kg	280	kg	60	kg	25	kg	120	kg

*大細玻璃 說明	大於沙機尺寸寬度 = 大玻璃，見下沙機尺寸	
沙機	T1,T2 = 1180 W	T2,5 = 1250 W
Jump 粒	1400x1700 對角=2200	
消防粒	未有資料	

為了玻璃來貨暢順，需要臨時存貨區和樓面存貨區。請大判提供臨時存貨區作為緩沖玻璃上落貨之用，也提供每座四個單位作為樓面的玻璃存貨區。請先做好樓面的存貨單位的牆身和地台泥水，以免因做泥水導致多次搬運玻璃。

附件為各座臨時存貨區和樓面存貨區的平面圖建議位置

MC38727
此份記錄



	臨時存貨區	(大玻璃入貨)	樓面存貨區 (大玻璃)	(細玻璃入貨)	樓面存貨區 (細玻璃)
T1	3/F 緩沖區	用#4 號秤上 3/F, 再由 H 單位 露台入貨	G,H 單位	沙基(B 單位)入	A,C 單位
T2	5/F 緩沖區	先從 G/F 上 5/F, 再由 N 單位 露台入貨	M,N 單位	沙基(B 單位)入	A,C 單位
T3	地下緩沖區	從緩沖區上， 由 F 單位露台入 貨	E,F 單位	沙基(M 單位) 入	L,K 單位
T5	地下緩沖區	從緩沖區上， 由 H 單位露台入 貨	G,H 單位	沙基(D 單位)入	C,E 單位

以上為臨時存貨區和樓面存貨區建議位置簡表，預算首批玻璃來貨為四月中，請大判協調提供存貨區和開棚從上述露台入大玻璃。

另外，請提供消防裝修圖供參考之用。

敬希垂注。如有問題可直接聯絡本司。

2019.1.7

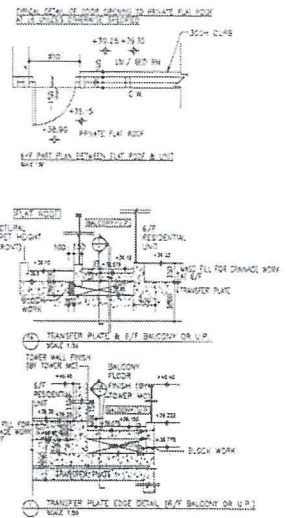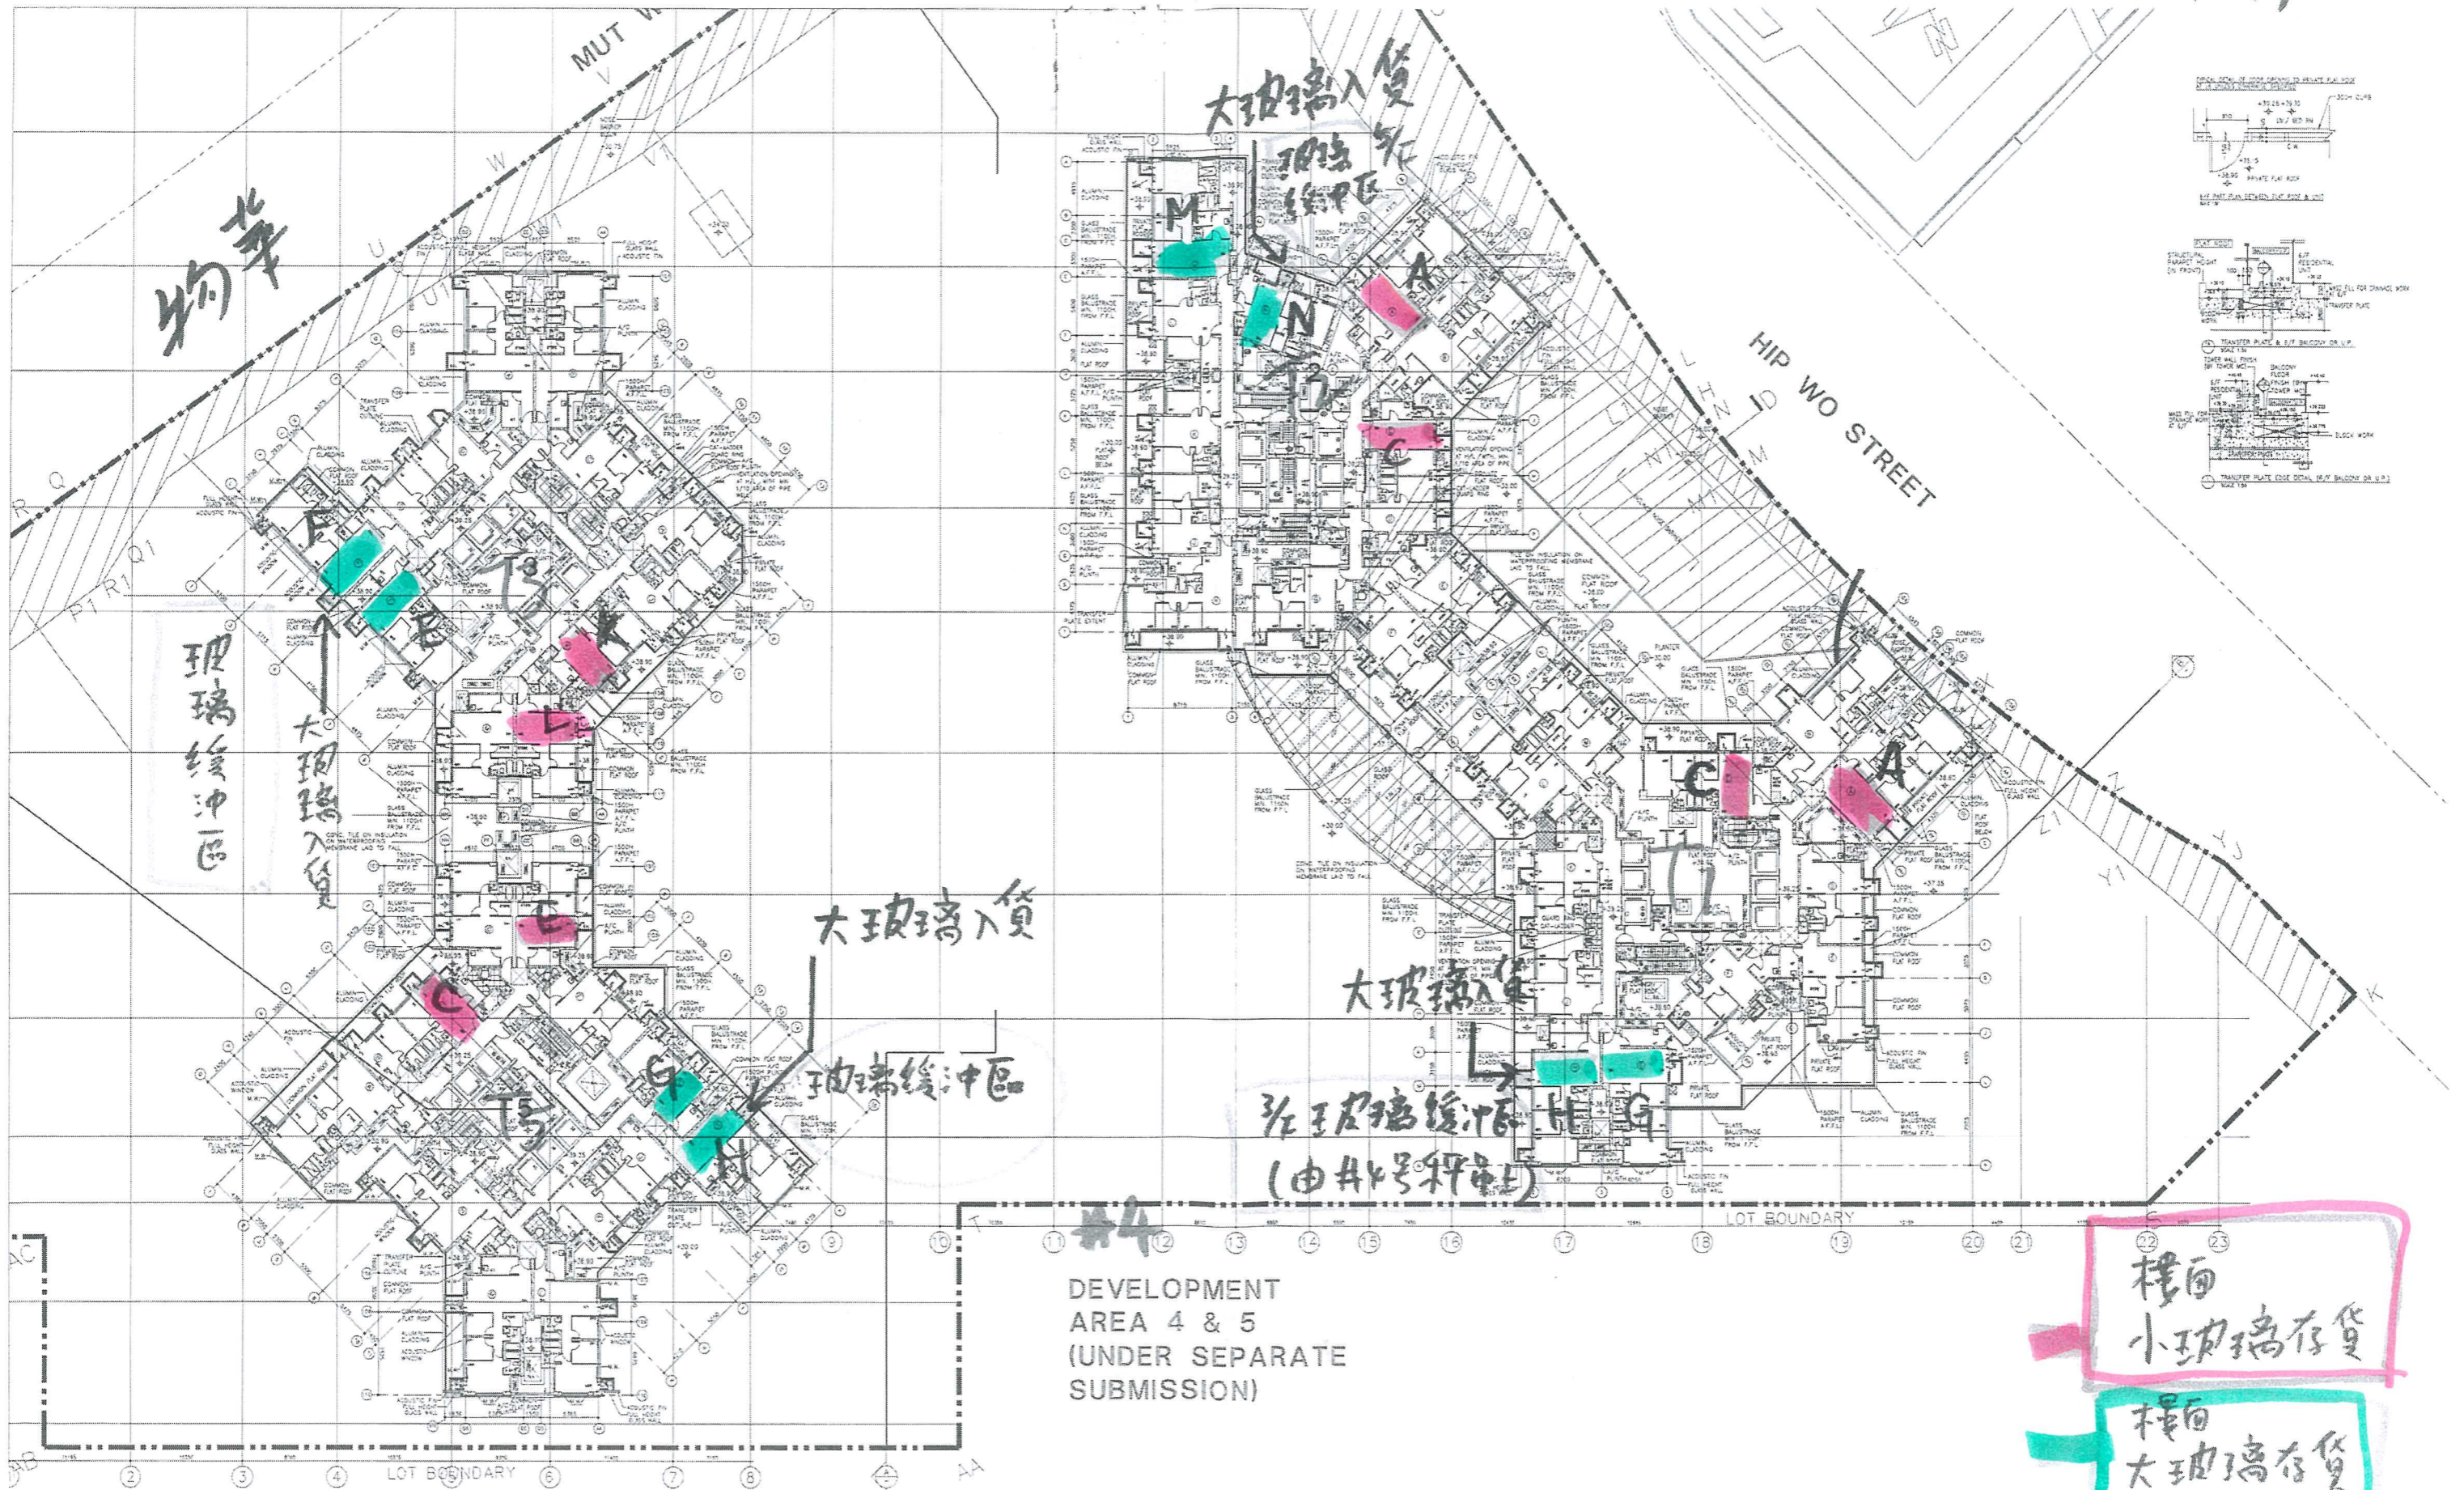

DEVELOPMENT
AREA 4 & 5
(UNDER SEPARATE
SUBMISSION)

樓面
小玻璃存貨

樓面
大玻璃存貨

史伊魯考

						數量	總面積
						(塊)	(平方米)
CW	Door FD/ SD	8+1.52+8	Blue	LAM	8mm THK. HS Blue Tinted + 1.52PVB + 8mm THK. Clear HS	3893	9444.0
CW	SD Fix (HS)	10+9+8	Blue	IGU	10mm THK HS Blue Tinted + 9A + 8mm THK Clear Tempered	2712	4811.0
CW	SD Fix (Temper)	10+9+8	Blue	IGU	10mm THK Tempered Blue Tinted + 9A + 8mm THK Clear Tempered	619	1701.0
CW	Openable Win	8+9+8	Blue	IGU	8mm THK HS Blue Tinted + 9A + 8mm THK Clear HS	8117	5512.3
CW	Protective Barrier	10	Clear	Temper	10 mm THK. Tempered	8117	555.7
CW	Small Fix below Openab	8+9+8	Blue	IGU	8mm THK HS Blue Tinted + 9A + 8mm THK Clear Tempered	8117	3413.0
CW	Fix 玻璃 (HS)	10+9+8	Blue	IGU	10mm THK HS Blue Tinted + 9A + 8mm THK Clear Tempered	830	1422.0
CW	Fix 玻璃 (Temper)	10+9+8	Blue	IGU	10mm THK Tempered Blue Tinted + 9A + 8mm THK Clear Tempered	3243	9639.0
CW	Spandrel Glass (HS)	8	Blue	HS	8mm THK HS Blue Tinted Glass	4611	2914.5
CW	Spandrel Glass (Temper)	8	Blue	Temper	8 mm THK. Tempered Blue Tinted Glass	9224	5828.9
GC	Glass Cladding HS	8	Blue	HS	8mm THK HS Blues Tinted Glass	3074	1763.4
GC	Glass Cladding Temper	8	Blue	Temper	8 mm THK. Tempered Blue Tinted Glass	2715	3907.6
Al Win	Precast Win	8	Clear	Temper	8 mm THK. Tempered	3590	1897.2
Al Win	Insitu Win	8	Clear	Temper	8 mm THK. Tempered	2792	1328.1
Acoustic	Acoustic Sliding Door	8	Clear	Temper	8 mm THK. Tempered	1037	2875.3

Total: 61654 54137.7
 (塊) (平方米)

室外=藍片
