



工程指示 / 要求簡箋(E.I.)

工程指示編號：EI/ 3044/21 修改版次：

工程編號：J-837

工程名稱：官塘 (裕民坊)

工程項目：3/F Glass Wall 玻璃生產 (SI 2310)

收件人：Maggie 姐

發件人：大明

日期：04/02/2021

要求提供 / 確認 事項：

- | | | |
|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 初步鋁料 B.M. | <input type="checkbox"/> 加工拆圖，然後生產 | <input type="checkbox"/> 尺寸表 |
| <input type="checkbox"/> 正式鋁料 B.M. | <input type="checkbox"/> 技術上資料 / 指示 | <input type="checkbox"/> 報 |
| <input type="checkbox"/> 配件 B.M. | <input type="checkbox"/> 樣辦或貨品說明書 | <input type="checkbox"/> 分判合約 |
| <input type="checkbox"/> 其他：_____ | | |

內容：

煩請 按 BM 表生產玻璃後 送地盤安裝

(不需要做熱浸)

請在 03/03/2021 前完成上列要求。

附有關圖紙 / 文件：附 B.M 表 1 頁, 圖紙 1 頁

以上項目為:

原合約工程包 原合約工程加 / 減脹 新工程報價

原因：-

分發東莞各部門：

- () 生產技術總監 連附件 () 技術部 連附件 () 生產部 連附件 () 機械設計部 連附件
 () 採購部 連附件 () 生產統籌部 連附件
 () 質檢部 連附件 () 會計部 連附件 () 報關組 連附件 () 其他 _____ 連附件


分發香港各部門：

- () 行政部 連附件 () 會計部 連附件 () 統籌部 連附件 () 工程部地盤科文 連附件 大明
 () 採購部 連附件 () QS 部 連附件 () 維修部 連附件 () 其他 _____ 連附件

傳遞編號：

發件人簽署：

項目經理簽署：



美特鋁質有限公司
MIDI Aluminium Fabricator Ltd.

工程號:	J-837	計算:	曾楚平	日期:	4/2/2021	送呈:	施哥
地盤名稱:	欄堵平台	核對:	李禮秋	日期:	4/2/2021	副本:	
項目類別:	S.I. 2310 GLASS DOOR	批准:		日期:		A/C Code:	





BM編號:	修改內容:	修改版次:	總計玻璃面積 (平方米):	56.380	此BM依據
-------	-------	-------	---------------	--------	-------

序號	修改內容	玻璃圖號	顏色與類型	厚度 (mm)	玻璃尺寸		數量 (塊)	總面積 (平方米)	樓層	備注
					寬度 (mm)	高度 (mm)				
1		J837-PE-G01	12mm THICK CLEAR TEMPERED GLASS (需精磨邊)	12	952.0	2888.0	2	5.499	3/F	詳見加工圖: J837-GW-GL11
		J837-PE-G02	12mm THICK CLEAR TEMPERED GLASS (需精磨邊)	12	970.0	2888.0	8	22.411	3/F	詳見加工圖: J837-GW-GL11
2		J837-PE-G03	12mm THICK CLEAR TEMPERED GLASS (需精磨邊)	12	1021.0	2888.0	2	5.897	3/F	詳見加工圖: J837-GW-GL11
		J837-PE-G04	12mm THICK CLEAR TEMPERED GLASS (需精磨邊)	12	977.0	2888.0	8	22.573	3/F	詳見加工圖: J837-GW-GL11
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10							合計	20		56.380

- 加工注意事項:
- 1) 本表中所採用之玻璃為信義玻璃廠出品之玻璃原片
 - 2) 本表中所有玻璃對角線尺寸偏差要求不超過正負2mm。
 - 3) 本表中所有玻璃要求粗磨邊處理並倒棱角。
 - 4) 本表中不同種類玻璃參照玻璃加工圖加工。
 - 5) 本表中所有強化玻璃均需TEMPERED TEST。
 - 6) 本表中所有強化玻璃之入爐方向均以寬度方向進入。
 - 7) 本表中所有玻璃成品送交東莞莞美而特廠，每次交貨時須齊層、齊款、齊數量，每次來貨之具體數量由美而特廠生產統籌部提供。
 - 8) 本表中所有玻璃成品均需注明室內外面及其玻璃編號，以便識別。

Glasbearbeitung
Beschlage

Glass preparation details –
Fittings

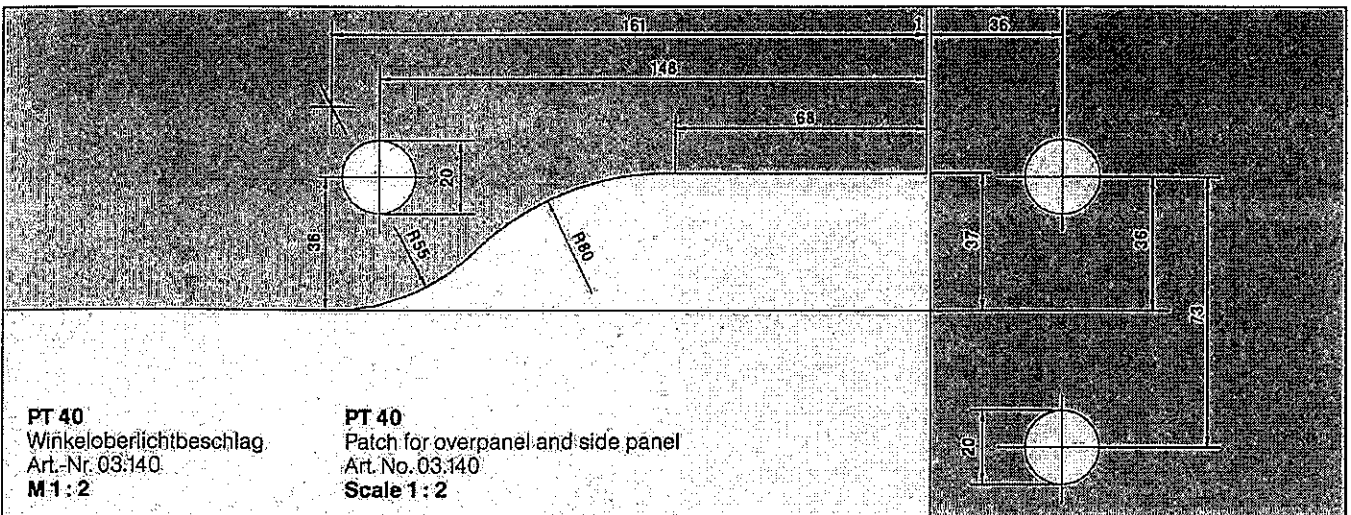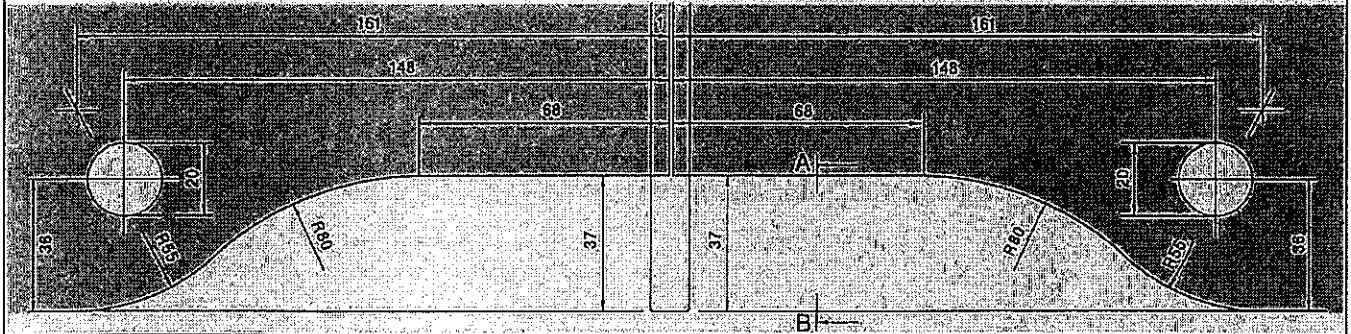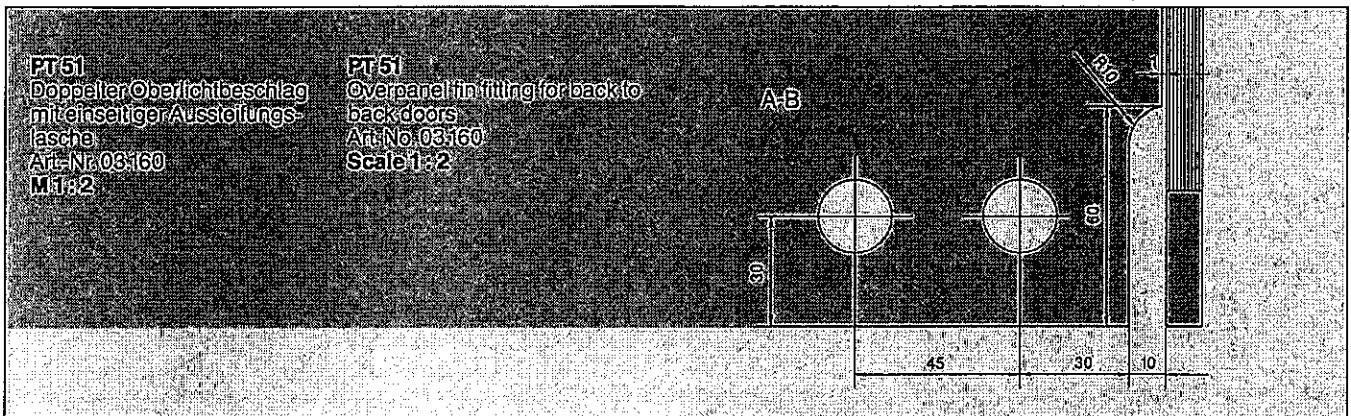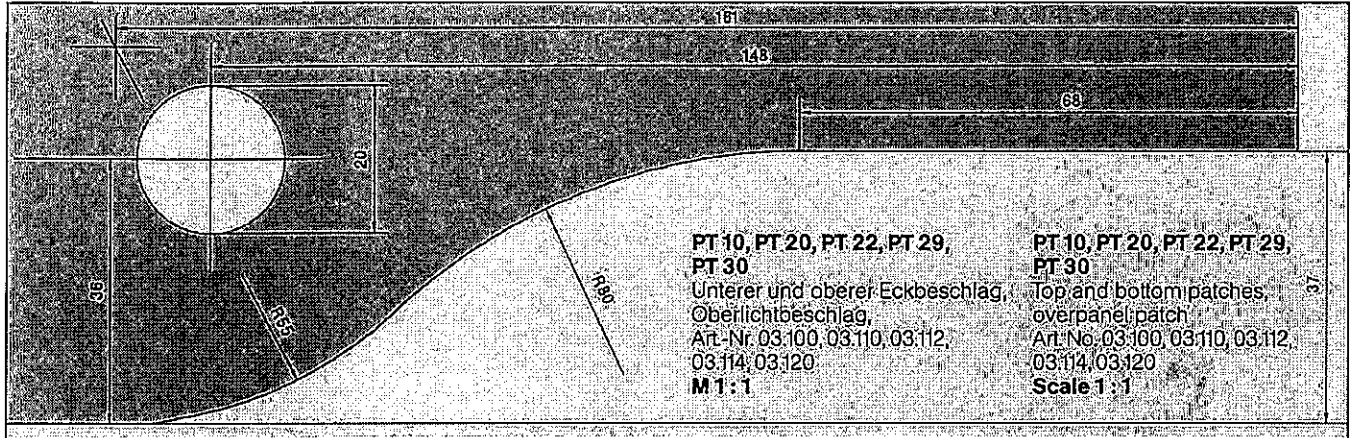


DORMA Universal

Glasbearbeitung Schlösser

Glass preparation details – Locks



US 10
Eckschloß
Art.-Nr. 03.200
M 1:2

US 10
Corner locks
Art. No. 03.200
Scale 1:2

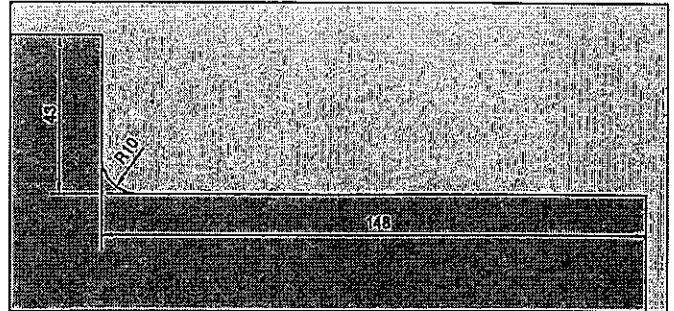


GK 30 (PT 30)
Oberlichtgegenkasten
Art.-Nr. 03.230
M 1:2

GK 30 (PT 30)
Single overpanel strike box
Art. No. 03.230
Scale 1:2

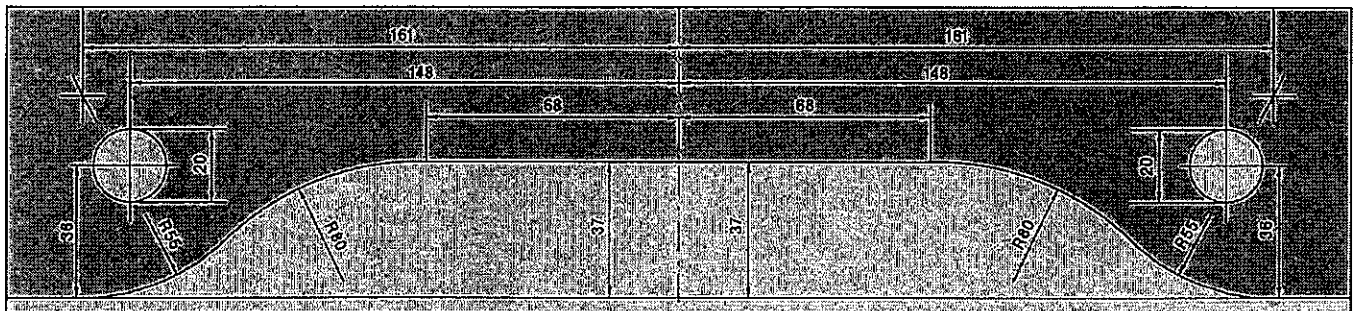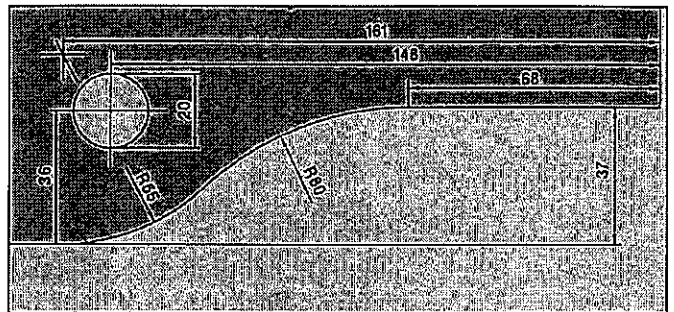

GK 20
Doppelter Oberlichtgegenkasten
Art.-Nr. 03.245, 03.247
M 1:2

GK 20
Double overpanel strike box
Art. No. 03.245, 03.247
Scale 1:2

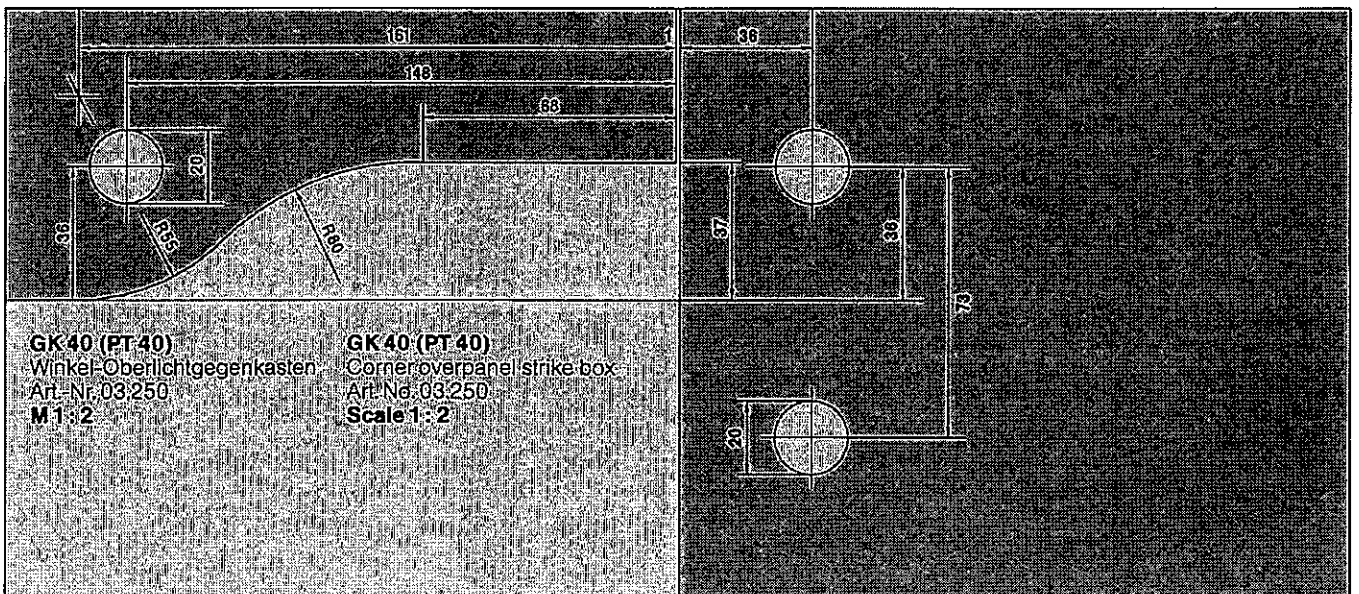

GK 40 (PT 40)
Winkel-Oberlichtgegenkasten
Art.-Nr. 03.250
M 1:2

GK 40 (PT 40)
Corner overpanel strike box
Art. No. 03.250
Scale 1:2
