



工程指示 / 要求簡箋(E.I.)

工程指示編號：EI / 1153 / 19

修改版次：-

工程編號：J - 837

工程名稱：觀塘裕民坊

工程項目：幕牆 死牆二合一背板 鋁角 BM

收件人：生統 / 永林 / Maggie

發件人：Eric Liu

日期：23/10/2019

要求提供 / 確認 事項：

- | | | |
|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 初步鋁料 B.M. | <input type="checkbox"/> 加工拆圖，然後生產 | <input type="checkbox"/> 尺寸表 |
| <input type="checkbox"/> 正式鋁料 B.M. | <input type="checkbox"/> 技術上資料 / 指示 | <input type="checkbox"/> 報價 |
| <input type="checkbox"/> 配件 B.M. | <input type="checkbox"/> 樣辦或貨品說明書 | <input type="checkbox"/> 分判合約 |
| <input type="checkbox"/> 其他：_____ | | |

內容：

請按 BM 訂購死牆二合一背板用鋁角送廠加工

15*15 鋁角，頂底修死牆二合一背板用

謝謝！

請在 2019/ 11/ 08 前完成上列要求。

附： 1 頁 BM，1 頁模圖

以上項目為：

- 原合約工程包 原合約工程加 / 減賬 新工程報價

原因：-

分發東莞各部門：

- () 生產技術總監 連附件 () 技術部 連附件 *永林* () 生產部 連附件 () 機械設計部 連附件
 () 採購部 連附件 () 生產統籌部 連附件 *楊*
 () 質檢部 連附件 () 會計部 連附件 () 報關組 連附件 () 其他 楊榮輝 連附件

分發其他分判：

- () 王禮秋 連附件

分發香港各部門：

- () 行政部 連附件 () 會計部 連附件 () 統籌部 連附件 () 工程部地盤科文 連附件
 () 採購部 連附件 () QS 部 連附件 () 維修部 連附件 () 其他 _____ 連附件

傳遞編號：


HK 2191 / 19

發件人簽署：


Eric Liu

項目經理簽署：

[Signature]

		美特鋁質有限公司 MIDI Aluminium Fabricator Ltd.		工程號: J-837		計算: 鞠章芳		日期: 2019.10.18		送呈: 胡哥				
		地盤名稱: 觀塘裕民坊		核對: 謝永林		日期:		副本:		袁惠貞 (QS部)				
廠用鋁型材B.M.表		項目類別: 幕牆		批准: Jason Leung		日期:		此BM依據EI/0282 G 施工圖 來計算						
BM編號: 837-CW-M01-F-AP05		A/C Code :		有顏色鋁料(Kg): 0.00		無顏色鋁料(Kg): 3538.46		V.F總(米 ²): 0.00						
序號	修改標示	物料編號	鋁料名稱	顏色	合金狀態	長度	數量(支)			重量(Kgs)		V.F.(米 ²)		備註
						(mm)	實用	後備	總數	Kg/M	總重量	米 ² /米	Total_V.F.	
1		A10000020	15.88X15.88X3.18 鋁角	MILL	6063-T5	5800	2450	30	2480	0.246	3538.464	0.000	0.000	用此款代替 15X15X3 鋁角
2								合計:	2480		3538.464		0.000	
備註:		依據EI/1021 業主要求死牆二合一位置增加背板, 橫向增加鋁角。												

幕牆-鋁料模圖

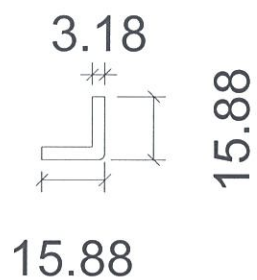

模號: A10000020

名稱: 15.88X15.88X3.18鋁角

合金狀態: 6063-T5

重量: 0.246KG/M

V.F.: 0 mm
