

工程指示 / 要求簡箋(E.I.)

工程指示編號：EI / 1868 / 20

修改版次：-

工程編號：J - 837

工程名稱：觀塘裕民坊

工程項目：幕牆 吊趟毛條位置改用膠條(16/F 現場換)

收件人：楊榮輝

發件人：Eric Liu

日期：27/05/2020

要求提供 / 確認 事項：

- | | | |
|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 初步鋁料 B.M. | <input type="checkbox"/> 加工拆圖，然後生產 | <input type="checkbox"/> 尺寸表 |
| <input type="checkbox"/> 正式鋁料 B.M. | <input type="checkbox"/> 技術上資料 / 指示 | <input type="checkbox"/> 報價 |
| <input type="checkbox"/> 配件 B.M. | <input type="checkbox"/> 樣辦或貨品說明書 | <input type="checkbox"/> 分判合約 |
| <input type="checkbox"/> 其他：_____ | | |

內容：

吊趟企身 9X18 毛條後仍有露光問題，

6x10 單面貼 只有 16 件數量用

按廠內樣板，更換單面貼+膠條後外觀接受

請廠提供 6X10 單面貼(120 米)及 J837-SASH 膠條(120 米)供現場更換 16/F 數量

地盤：請按附件相片做法，更換現場企身毛條做單面貼+膠條

謝謝！

請在 2020 / 05 / 29 前完成上列要求。

附：1 頁 BM，7 頁

以上項目為：

- 原合約工程包 原合約工程加 / 減賬 新工程報價

原因：-

分發東莞各部門：

- () 生產技術總監 連附件 () 技術部 連附件 永林 () 生產部 連附件 () 機械設計部 連附件
 () 採購部 連附件 () 生產統籌部 連附件 梅
 () 質檢部 連附件 () 會計部 連附件 () 報關組 連附件 () 其他 楊榮輝 連附件

分發香港各部門：

- () 行政部 連附件 () 會計部 連附件 () 統籌部 連附件 () 工程部地盤科文 連附件 火內哥
 () 採購部 連附件 () QS 部 連附件 () 維修部 連附件 () 其他 _____ 連附件

傳遞編號：


HK 0970 / 20

發件人簽署：

(Signature)

項目經理簽署：

(Signature)

 美特鋁質有限公司 MIDI Aluminium Fabricator Ltd.	J-837	計算:	日期:	送呈: Jason哥
	觀塘裕民坊	核對:	日期:	副本:
廠用配件B.M.表	幕牆 - 大樓	批准:	日期:	
BM編號:	吊趟			此B.M依據 計算

序號	修改標示	配件圖號	物料編號	配件名稱	顏色/材質	實用	後備	總數	單位	備注
1			6黏面	6X10mm單面貼		120		120	米	
2				J837-SASH膠條		120		120	米	


35

35

底加膠黏

857-Sash

膠條

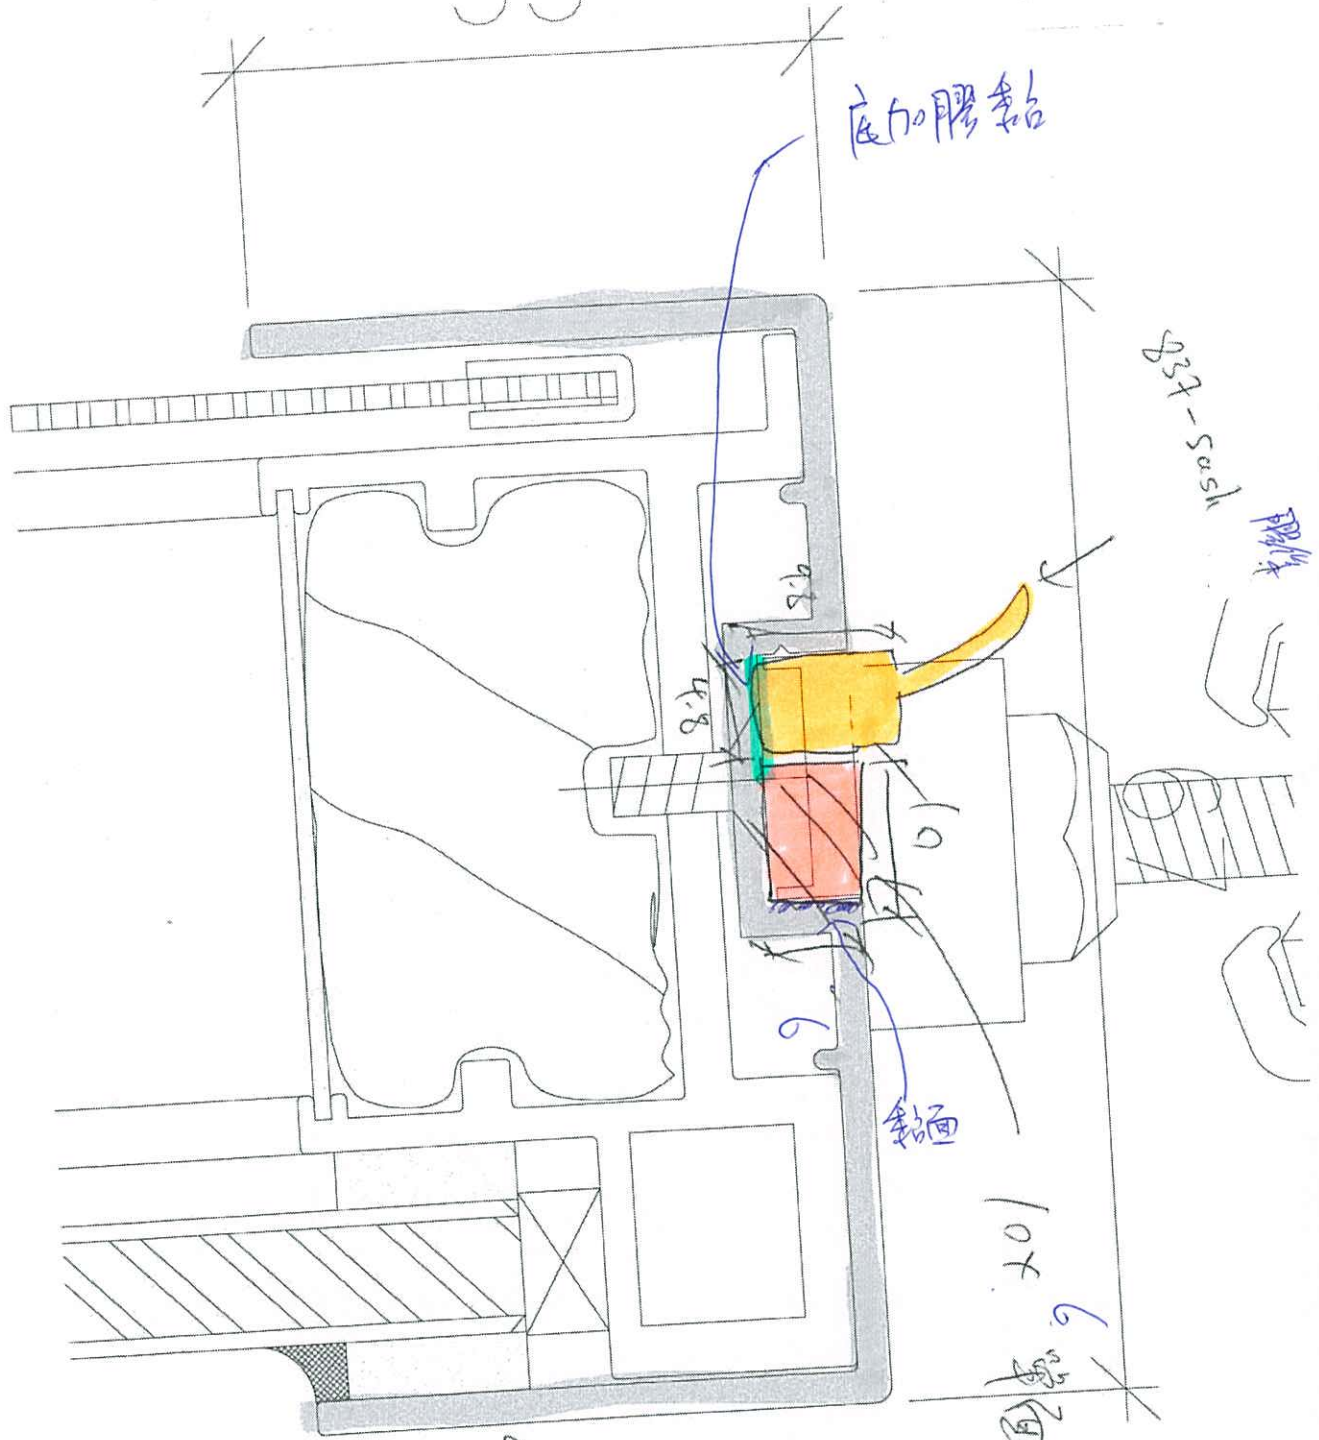

x85665

16/F 更換方案

正身 關門磁鐵 方向





