

工程指示 / 要求簡箋(E.I.)

工程指示編號：EI / 3972 / 21

修改版次：-

工程編號：J - 837

工程名稱：觀塘裕民坊

工程項目：現場崩花玻璃 BM (金威藍片玻璃)

收件人：Maggie

發件人：Eric Liu

日期：28/10/2021

要求提供 /  確認 事項：

- |                                    |                                     |                               |
|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 初步鋁料 B.M. | <input type="checkbox"/> 加工拆圖，然後生產  | <input type="checkbox"/> 尺寸表  |
| <input type="checkbox"/> 正式鋁料 B.M. | <input type="checkbox"/> 技術上資料 / 指示 | <input type="checkbox"/> 報價   |
| <input type="checkbox"/> 配件 B.M.   | <input type="checkbox"/> 樣辦或貨品說明書   | <input type="checkbox"/> 分判合約 |
| <input type="checkbox"/> 其他：_____  |                                     |                               |

內容：

請按提供 BM 訂購玻璃送地盤更換用

現場執修更換崩花用玻璃，包括藍片及清片玻璃

請留意，藍片玻璃用金威厚片，由三鑫加工

補玻璃資料為 10 月 29 日收資料，請留意藍片及清片數量

謝謝

請在 2021/ 11/ 20 前完成上列要求。

是補 308 件玻璃，包含 307 件藍片

10mm 藍片 = 133 件 ~ 316 m<sup>2</sup>  
8mm 藍片 = 174 件 ~ 270 m<sup>2</sup>  
= 307 件 = 586 m<sup>2</sup>

附： 頁

以上項目為：

- 原合約工程包                       原合約工程加 / 減賬                       新工程報價

分發東莞各部門：

- ( ) 生產技術總監  連附件    ( ) 技術部  連附件    ( ) 生產部  連附件    ( ) 機械設計部  連附件  
( ) 採購部  連附件    ( ) 生產統籌部  連附件  
( ) 質檢部  連附件    ( ) 會計部  連附件    ( ) 報關組  連附件    ( ) 其他 楊榮輝  連附件

分發香港各部門：

- ( ) 行政部  連附件    ( ) 會計部  連附件    ( ) 統籌部  連附件    ( ) 工程部地盤科文  連附件 天  
( ) 採購部  連附件    ( ) QS 部  連附件    ( ) 維修部  連附件    ( ) 其他 \_\_\_\_\_  連附件

傳遞編號：

HK                      121

發件人簽署：

項目經理簽署：

玻璃款式	玻璃厚度		玻璃尺寸		地盤有	可安裝玻璃	T1	T2	T3	T5	28/10已到玻璃	需再補玻璃(件)	面積數(m2)
趟門梗(藍片:10mm)			闊度	高度									
G1	10+9+8	27	1015	2466			4				1	3	7.5
G1	10+9+8	27	870	2466			7				3	4	8.6
G1	10+9+8	27	865	2466					4		2	2	4.3
G1	10+9+8	27	847	2466			4	6				10	20.9
G1	10+9+8	27	840	2466			3				1	2	4.1
G1	10+9+8	27	815	2466		2	5	2	1		3	3	6.0
G1	10+9+8	27	787	2466			6	2	1	1		6	11.6
G3	10+9+8	27	740	2466				2	2		2	2	3.6
G3	10+9+8	27	696	2466	1	1			9		3	5	8.6
G3	10+9+8	27	687	2466	2	2	2					2	3.4
G3	10+9+8	27	647	2466			6	1	10	1	6	12	19.1
G3	10+9+8	27	640	2466			4				2	3	4.7
											總數	54	102.6
玻璃款式	玻璃厚度		玻璃尺寸		地盤有	可安裝玻璃	T1	T2	T3	T5	28/10已到玻璃	需再補玻璃(件)	面積數(m2)
趟門玉(室外8mm藍片,室內8mm清片)			闊度	高度									
G7	8+1.52+8	17.52	1641	2386			1					1	3.9
G7	8+1.52+8	17.52	1336	2386			3	4	4			11	35.1
G7	8+1.52+8	17.52	1302	2386						1		1	3.1
G7	8+1.52+8	17.52	1196	2386			2					2	5.7
G7	8+1.52+8	17.52	1186	2386			5	11	10	4		30	84.9
G7	8+1.52+8	17.52	986	2386			5	1	4	5		15	35.3
G7	8+1.52+8	17.52	936	2386			2	2	4			8	17.9
G7	8+1.52+8	17.52	906	2386			2					2	4.3
G7	8+1.52+8	17.52	1073	2386				2				2	5.1
G7	8+1.52+8	17.52	775	2386						1		1	1.8
											總數	73	197.1

玻璃款式	玻璃厚度		玻璃尺寸		地盤有'27/10	可安裝玻璃	T1 '27/10	T2 '27/10	T3 '27/10	T5 '27/10	28/10已到玻璃	需再補玻璃(件)	面積數(m2)
			闊度	高度									
幕牆(藍片:10mm)													
G1	10+9+8	27	1882	2190				7			1	6	24.7
G1	10+9+8	27	1850	2190	1	1	2					1	4.1
G1	10+9+8	27	1700	2190				1				1	3.7
G1	10+9+8	27	1675	2190				8			3	5	18.3
G1	10+9+8	27	1632	2190			5				2	3	10.7
G1	10+9+8	27	1620	2190			5				2	3	10.6
G1	10+9+8	27	1500	2190					3			3	9.9
G1	10+9+8	27	1250	2190				2	1			3	8.2
G1	10+9+8	27	1082	2190			8	3	10		4	17	40.3
G1	10+9+8	27	1057	2190			9	4	9	3	4	21	48.6
G1	10+9+8	27	982	2190			8	3	4	3	3	15	32.3
G3	10+9+8	27	695	2190	2	2	4				1	1	1.5
											總數	79	213.0


玻璃款式	玻璃厚度		玻璃尺寸		地盤有	可安裝玻璃	T1	T2	T3	T5	28/10已到玻璃	需再補玻璃(件)	面積數(m2)
FD門(室外8mm藍片,室內8mm清片)			闊度	高度									
G7	8+1.52+8	17.52	518	2342			5					7	8.5
G7	8+1.52+8	17.52	612	2342						2		4	5.7
G7	8+1.52+8	17.52	412	2342								2	1.9
G7	8+1.52+8	17.52	205	2432			7					9	4.5
G7	8+1.52+8	17.52	367	2342				7				7	6.0
<b>總數</b>												29	26.7


玻璃款式	玻璃厚度		玻璃尺寸		地盤有	可安裝玻璃	T1	T2	T3	T5	28/10已到玻璃	需再補玻璃(件)	面積數(m2)
後裝窗(清片)			闊度	高度									
TG11	8	8	552	2024	4	4		5				1	1.1
<b>總數</b>												1	1.1

玻璃款式	玻璃厚度		玻璃尺寸		地盤有	可安裝玻璃	T1	T2	T3	T5	28/10已到玻璃	需再補玻璃(件)	面積數(m2)
幕牆生下梗(室外8mm藍片,室內8mm清片)			闊度	高度									
G5	8+9+8	25	857	810	3	3	4					1	0.7
G5	8+9+8	25	320	810						2		2	0.5
G5	8+9+8	25	1015	810	1	1	2					2	1.6
											總數	5	2.9
玻璃款式	玻璃厚度		玻璃尺寸			地盤有	T1	T2	T3	T5	28/10已到玻璃	需再補玻璃(件)	面積數(m2)
幕牆生窗玉(室外8mm藍片,室內8mm清片)			闊度	高度									
G2	8+9+8	25	590	1320	室內左鎖柄	8	7	4		4		5	3.9
G2	8+9+8	25	590	1320	室內右鎖柄	10	5	8	1	2		6	4.7
G2	8+9+8	25	390	1320	室內左鎖柄	2	4	3				6	3.1
G2	8+9+8	25	390	1320	室內右鎖柄	1	4	5				9	4.6
G2	8+9+8	25	490	1320	室內左鎖柄		1			1		2	1.3
G2	8+9+8	25	340	1320	室內右鎖柄		1					1	0.4
G2	8+9+8	25	320	1320	室內右鎖柄							1	0.4
G2	8+9+8	25	590	1320	室內左鎖柄双掩		3		1			4	3.1
G2	8+9+8	25	590	1320	室內右鎖柄 双掩				6			6	4.7
G2	8+9+8	25	390	1320	室內左鎖柄双掩		1		5	1		7	3.6
G2	8+9+8	25	390	1320	室內右鎖柄 双掩				3	1		5	2.6
G2	8+9+8	25	320	1320	室內右鎖柄双掩					1		1	0.4
G2	8+9+8	25	390	1320	室內左鎖柄維修窗			6				6	3.1
G2	8+9+8	25	390	1320	室內右鎖柄 維修窗			4				4	2.1
G2	8+9+8	25	1015	1320	千秋窗		2					2	2.7
G2	8+9+8	25	857	1320	千秋窗		2					2	2.3
											總數	67	42.9

EG-DWG4

4

 美特鋁質有限公司 MIDI Aluminium Fabricator Ltd.				類別	物料號		
修改				制圖 陳俊樺	2019.3.4	圖號 G1	
日期				復核		數量 見BOM表	
				批准		位置	

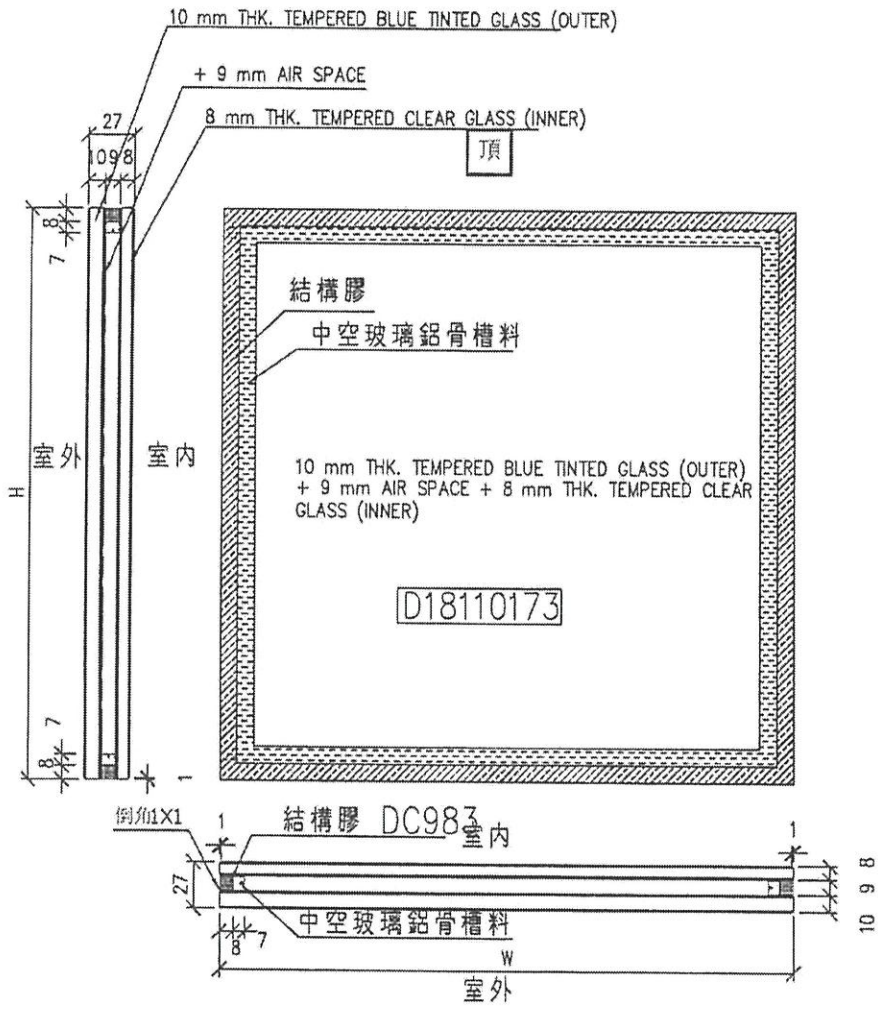


工程號	J-837	地盤	觀塘裕民坊	附 件	①
名稱	玻璃加工圖	採用			
材料		地盤			
顏色	10BLUE T+9A+8T中空玻璃	工廠			




EG-DWG4

 美特鋁質有限公司 MIDI Aluminium Fabricator Ltd.				類別	物料號		
				制圖 陳俊樺	2019.3.4	圖號 G3	
修改				復核		數量	見BOM表
日期				批准		位置	

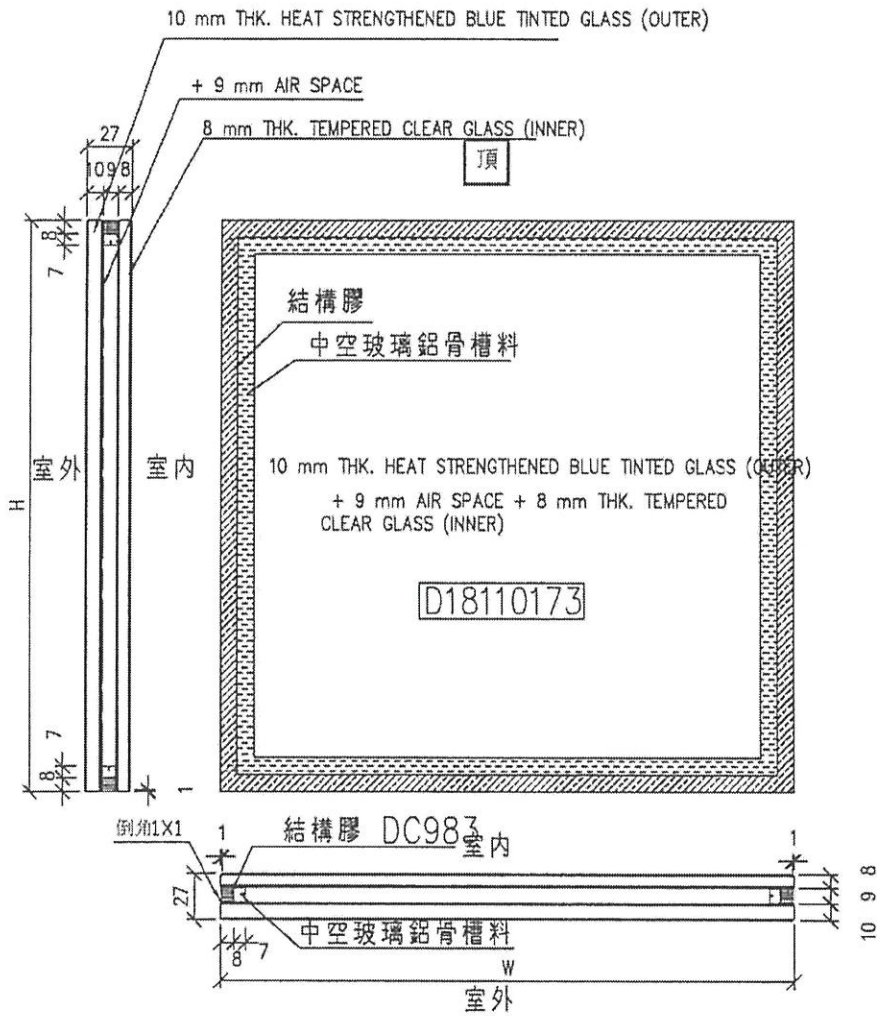

工程號	J-837	地盤	觀塘裕民坊	附件	③
名稱	玻璃加工圖		採用		
材料			地盤		
顏色	10BLUE HS+9A+8T中空玻璃		工廠		


 美特鋁質有限公司 MIDI Aluminium Fabricator Ltd.			類別	物料號	
			制圖 陳俊樺	2019.3.4	圖號 G5
修改			復核		數量 見BOM表
日期			批准		位置

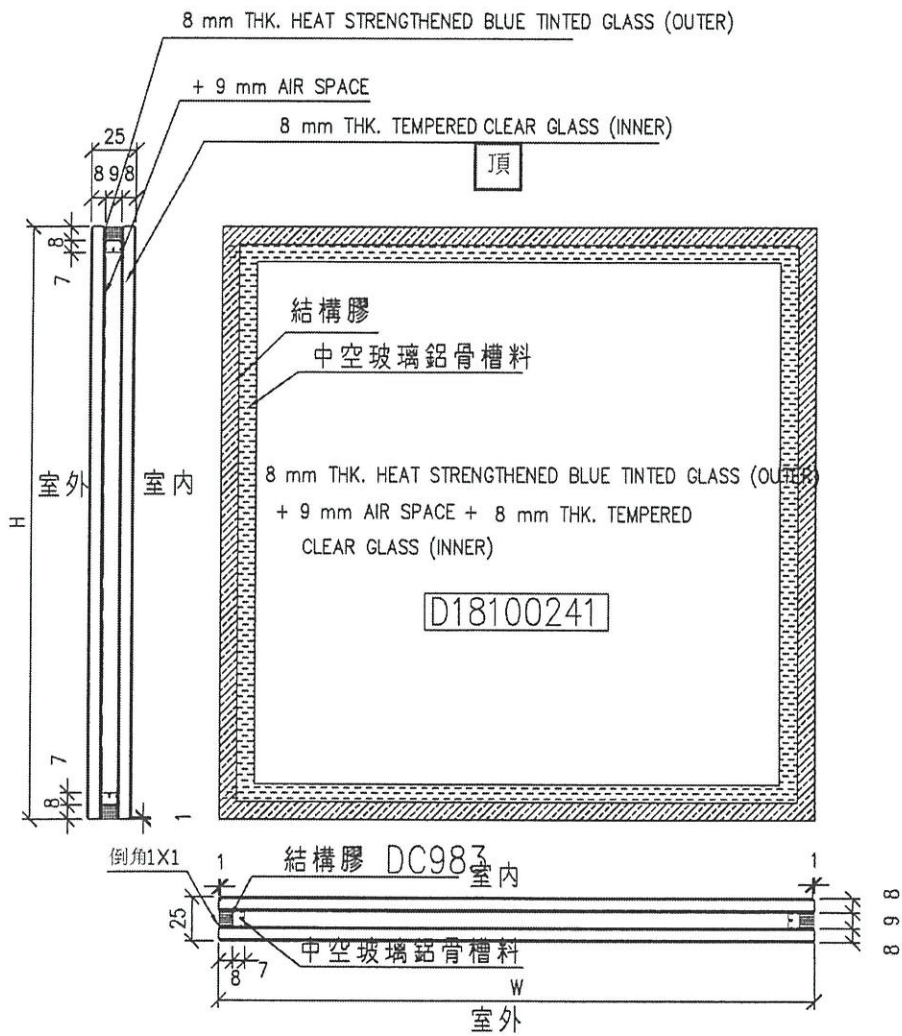

工程號	J-837	地盤	觀塘裕民坊	附 件	⑤
名稱	玻璃加工圖	採用			
材料		地盤			
顏色	8BLUE HS+9A+8T中空玻璃	工廠			

EG-DWG4

 美特鋁質有限公司 MIDI Aluminium Fabricator Ltd.				類別	物料號		
				制圖 陳俊樺	2019.3.17	圖號 G7	
修改				復核		數量	見BOM表
日期				批准		位置	

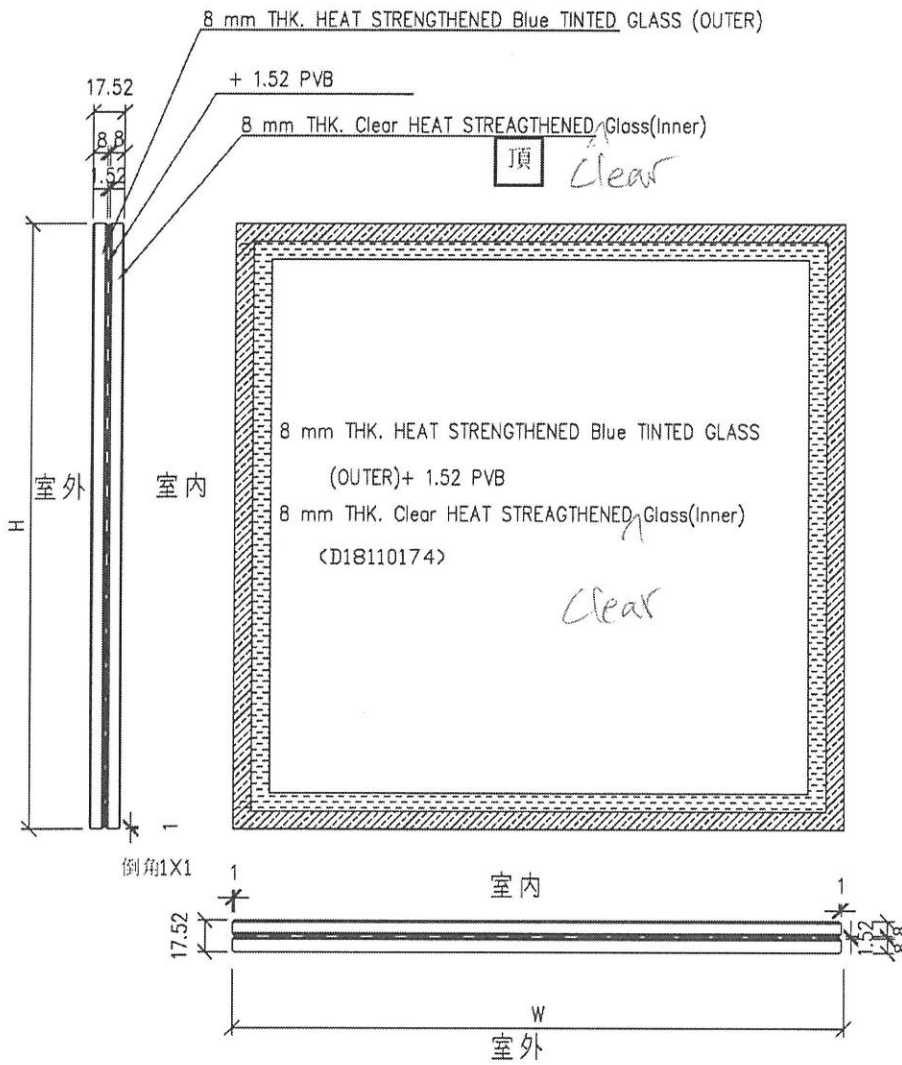


工程號	J-837	地盤	觀塘裕民坊	附 件	⑦
名稱	玻璃加工圖	採用			
材料		地盤			
顏色	見BOM表	工廠			

EG-DWG4

美特鋁質有限公司 MIDI Aluminium Fabricator Ltd.				類別	物料號		
				制圖 譚林輝	2020.5.5	圖號	IW-TG11
修改				復核 謝永林	2020.5.6	數量	見BOM表
日期				批准 Jason		位置	

玻璃類型：TG11

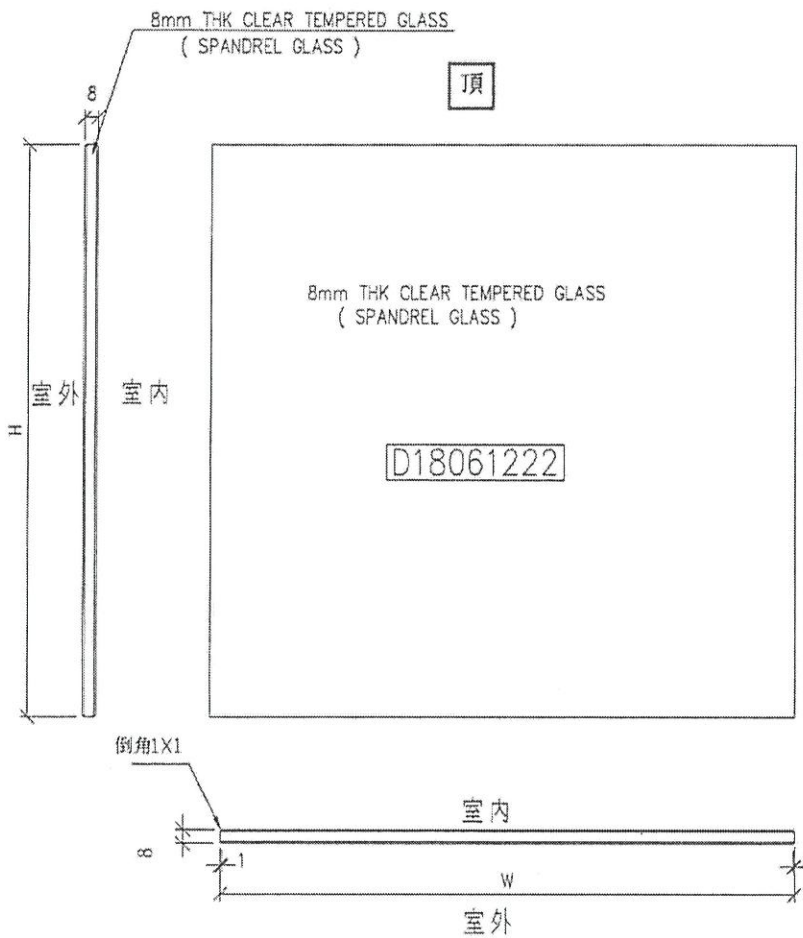

工程號	J-837	地盤	觀塘裕民坊	附 件
名稱	玻璃加工圖	採用		
材料	8mm THK CLEAR TEMPERED GLASS	地盤		
顏色	( SPANDREL GLASS )	工廠		
