



工程指示 / 要求簡箋(E.I.)

工程指示編號：EI / 9870 / 18

修改版次：A

工程編號：J - 837

工程名稱：觀塘裕民坊

工程項目：後裝窗大貨 - 地盤用配件 BM

收件人：林哥 / 生統

發件人：Eric Liu

日期：31/10/2018

要求提供 / 確認 事項：

- | | | |
|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 初步鋁料 B.M. | <input type="checkbox"/> 加工拆圖，然後生產 | <input type="checkbox"/> 尺寸表 |
| <input type="checkbox"/> 正式鋁料 B.M. | <input type="checkbox"/> 技術上資料 / 指示 | <input type="checkbox"/> 報價 |
| <input type="checkbox"/> 配件 B.M. | <input type="checkbox"/> 樣辦或貨品說明書 | <input type="checkbox"/> 分判合約 |
| <input type="checkbox"/> 其他：_____ | | |

內容：

請按 B.M. 訂購配件送地盤安裝使用

A 版請留意: 1) A 版提供磨耳加工圖

2) 請留意修改數量#1,2,3,4,6,7,8,9

3) 新增#10,11 為 PLENUM 箱用雙面貼及窗用木尖

4) 裝玻璃用膠塞及 SETTING BLOCK 暫停 (#3, #4)

5) 提供數量明細表作參考

謝謝！

請在 2018/11/23 前完成上列要求。

附： 1 頁 B.M. + 2 頁加工圖 + 1 頁明細表

以上項目為：

- 原合約工程包 原合約工程加 / 減賬 新工程報價

原因：-

分發東莞各部門：

- () 生產技術總監 連附件 () 技術部 連附件 永楷 () 生產部 連附件 () 機械設計部 連附件
 () 採購部 連附件 () 生產統籌部 連附件 梅
 () 質檢部 連附件 () 會計部 連附件 () 報關組 連附件 () 其他 楊榮輝 連附件

分發香港各部門：

- () 行政部 連附件 () 會計部 連附件 () 統籌部 連附件 林哥 () 工程部地盤科文 連附件 林哥/祥哥
 () 採購部 連附件 () QS 部 連附件 () 維修部 連附件 () 其他 _____ 連附件

傳遞編號：

HK 1663 / 18

發件人簽署：


項目經理簽署：

(Handwritten signatures)


 美特鋁質有限公司 MIDI Aluminium Fabricator Ltd.		工程號:	J-837	計算:	陳俊賢	日期:	2018.10.11	送呈:	胡哥	
		地盤名稱:	觀塘裕民坊	核對:	謝永林	日期:	2018.10.30	副本:		
地盤用配件B.M.表		項目類別:	後裝窗	批准:		日期:				
BM編號: 837-WI-M01-S-HP01		A/C Code:	A版, EI9870, 2018.10.30			此BM依據EI/9626/18(B版)施工圖紙計算				
序號	修改標示	配件圖號	物料編號	配件名稱	顏色	實用	後備	總數	單位	備注
1	A減少			Dowsil791	Bronze	1057		1057	支	用於牆邊防水膠(300ml/支)
2	A減少			Dowsil791	Bronze	2017		2017	支	用於玻璃四周密封用(300ml/支)
3	A暫停		Santoprene 65±5	6X5mm厚玻璃膠塞(L=30)		40928	272	41200	隻	用於玻璃兩側
4	A暫停		EPDM 85±5	15X9mm墊塊(L=30)		5116	134	5250	隻	用於玻璃底部
5	暫停			#8x1/2"圓頭鋼牙	A4-70	15306	294	15600	粒	收百叶位鋁盒通風裝置用
6	A增加		05-900000-X-C P8 27-00	子彈	紅藥/黃藥	36722	328	37050	個	配子彈釘用(FD門/後裝窗)
7	A增加		05-900001-0000-YL	子彈釘 X-U 27 P8	不銹鋼	36722	328	37050	個	用於固定磨耳(@300c/c)FD門/後裝窗
8	A增加		MT-GMB-02	磨耳(FD門50截面用)	熱浸鋅	4314	86	4400	支	固定FD門外框牆邊用
9	A增加		MT-GMB-01	磨耳	熱浸鋅	32408	152	32560	支	後裝窗磨耳(@300c/c)
10	A新增			15mm*1mm厚雙面貼	黑色	2379	121	2500	米	後裝窗通風盒用
11	A新增			木尖		7268	152	7420	個	每窗四個(後裝窗)

 美特鋁質有限公司 MIDI Aluminium Fabricator Ltd.				類別	物料號	
修改				制圖	陳俊賢	2018.10.30
日期				復核	謝永林	2018.10.30
				批准		
				圖號	MT-GMB-01	
				數量	40620	
				位置	用於50後裝窗框四周	

後裝窗摩耳: $32408+152=32560$
 佛沙轉後裝窗摩耳: $7972+88=8060$

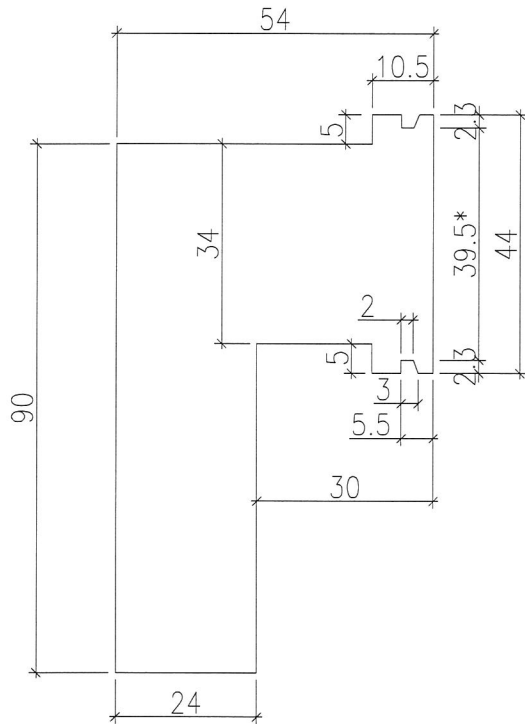

注：帶"*"號為重要尺寸




扭曲後圖樣


後裝窗

工程號	J-837	地盤	觀塘裕民坊	附 件	
名稱	50後裝窗摩耳加工圖		採用		
材料	2mm厚鐵板		地盤		<input checked="" type="checkbox"/>
顏色	熱浸鋅		工廠		

 美特鋁質有限公司 MIDI Aluminium Fabricator Ltd.	類別	物料號				
	制圖	陳俊賢	2018.10.30	圖號	MT-GMB-02	
修改		復核	謝永林	2018.10.30	數量	4314+86=4400
日期		批准			位置	用於50FD門框四周

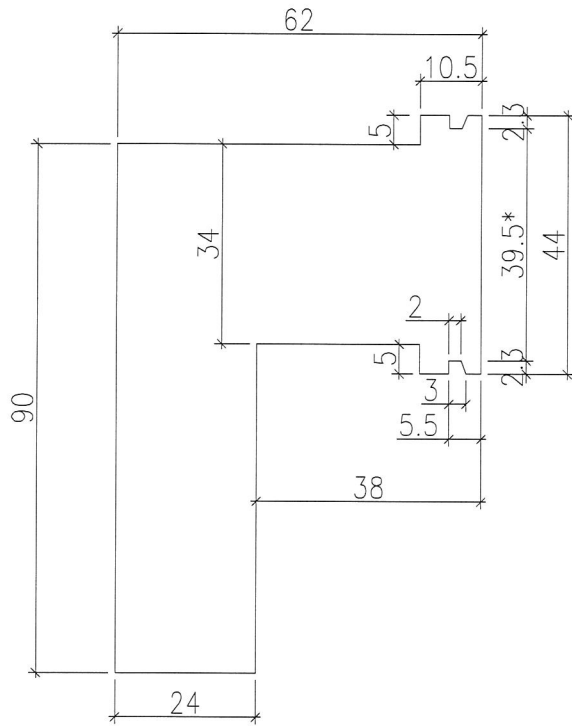

注：帶"*"號為重要尺寸

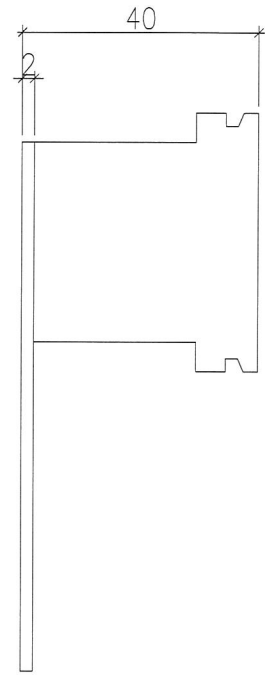

扭曲後圖樣

FD門

工程號	J-837	地盤	觀塘裕民坊	附 件	
名稱	後裝門摩耳加工圖		採用		
材料	2mm厚鐵板		地盤		✓
顏色	熱浸鋅		工廠		

膠數量表細表

T5k

窗數
1817

框企		玻璃線	
		生窗玉周長	6133530
		梗窗玻璃密封	1286390
FD門周長	後裝窗周長	FD門玉玻璃線周長	窗玉玻璃線周長
1121714	7687102	986146	7419920
40381.704	276735.67	35501.256	267117.12
135	922	237	1781

36 截面積
封牆膠 (300ml/支)

\ /
1957支
堵邊膠

\ /
2017支
玻璃四周
