



工程指示 / 要求簡箋(E.I.)

工程指示編號：EI/ 3065 /21      修改版次：  
 工程編號      : J851      工程名稱      : 青衣明翹滙  
 工程項目      : 廠用加力骨  
 收件人      : 生統      發件人      : Joe Chan      日期 : 11/2/2021

要求提供 /  確認 事項：

- |                                    |                                     |                               |
|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 初步鋁料 B.M. | <input type="checkbox"/> 加工拆圖，然後生產  | <input type="checkbox"/> 尺寸表  |
| <input type="checkbox"/> 正式鋁料 B.M. | <input type="checkbox"/> 技術上資料 / 指示 | <input type="checkbox"/> 報價   |
| <input type="checkbox"/> 配件 B.M.   | <input type="checkbox"/> 樣辦或貨品說明書   | <input type="checkbox"/> 分判合約 |
| <input type="checkbox"/> 其他：_____  |                                     |                               |

內容：

請依附件資料，加工加力骨。  
 (用於 EI 3064 鋁板加工)

請在 28/2/2021 前完成上列要求。

附有關圖紙 / 文件：

什項

以上項目為：

- 原合約工程包       原合約工程加 / 減賬       新工程報價

原因：-

分發東莞各部門：

- ( ) 生產技術總監  連附件    ( ) 技術部  連附件    ( ) 生產部  連附件    ( ) 機械設計部  連附件  
 ( ) 採購部  連附件    ( ) 生產統籌部  連附件    梅軍  
 ( ) 質檢部  連附件    ( ) 會計部  連附件    ( ) 報關組  連附件    ( ) 其他 \_\_\_\_\_  連附件

分發香港各部門：

- ( ) 行政部  連附件    ( ) 會計部  連附件    ( ) 統籌部  連附件    ( ) 工程部地盤科文  連附件  
 ( ) 採購部  連附件    ( ) QS 部  連附件    ( ) 維修部  連附件    ( ) 其他 \_\_\_\_\_  連附件

傳遞編號：

HK 0313/21

發件人簽署：

JL

項目經理簽署：

P.P. JL



鋁材開料總表

工程號碼: J-851 工程名稱: 青衣明翹匯


序號	鋁料編號	名稱	表面處理		開料長度	實用長料總數量		浪費率(%)
			顏色	層厚		支數	長度	
1	X85349-加力骨	加力骨	MILL		6000	6	36000	8.17

送至: \_\_\_\_\_

由: \_\_\_\_\_

日期: \_\_\_\_\_

簡短說明: \_\_\_\_\_



②

工程號碼: J-851, 工程名稱: 青衣明翹匯  
開料長度: 6000, 總長料支數: 6, 總開料支數: 20

鋁材開料清單 X85349-加力骨

鋸片厚度(mm): 4, 料頭尾總切除(mm): 20, 浪費率(%): 8.17

鋁料 長度	窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
6000	J851-AL7-JL20a	3-4	2255.5	4	4	2	0	3-4@(1461)x2
6000	J851-AL7-JL20	1-2	2248.0	4	4	2	0	1-2@(1476)x2
6000	J851-AL7-JL23	5	1495.5	2	2	1	0	5@(2981)x1
6000	J851-AL7-JL21	(餘料)1-5	1208.0	8	6	0	5	1-2@(264)x2 3-4@(249)x2 5@(557)x1
6000	J851-AL7-JL21	6	1208.0		2	1	0	6@(3556)x1
6000	J851-AL7-JL22	(餘料)6	1095.5	2	2	0	1	6@(1357)x1



3

EG-DWG3


**美特鋁質** 有限公司  
 MIDI Aluminium Fabricator Ltd.

工程號	J-851	地盤	青衣明匯
-----	-------	----	------

加力骨编号	长度	数量	N	A
J851-AL7-JL20	2248	4	300 x 7	74
J851-AL7-JL21	1208	8	300 x 3	154
J851-AL7-JL22	1095.5	2	300 x 3	97.75
J851-AL7-JL23	1495.5	2	300 x 4	147.75
J851-AL7-JL20a	2255.5	4	300 x 7	77.75

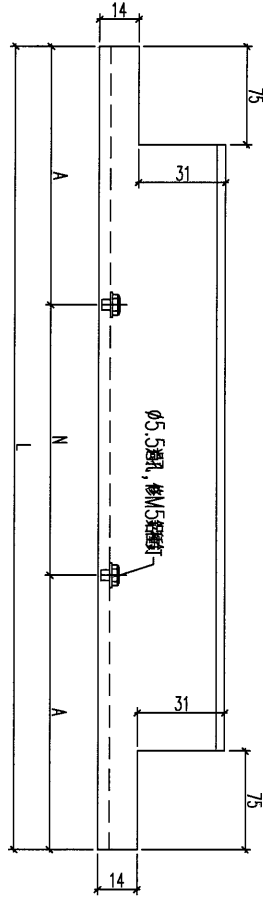

名稱	加力骨加工圖	制圖	HHQ	2021.2.8	修改			
材料	X85349	復核	WLQ	2021.2.8	日期			
顏色	MILL	批准			圖號	J851-AL5-JL1		
