

工程指示 / 要求簡箋 ENGINEER INSTRUCTIONS(E.I.)

工程指示編號:	EI- 7284	修改版本:	-
	HK- /		
工程編號:	J 853	工程名稱:	延坪道 (第2期)
收件人:	Maggie Lor	發件人:	Joe Chan
工程項目:	幕牆 Row B (HBS~HBS) 地盤用玻璃	日期:	26/01/2024 (黃色)

<input type="checkbox"/> 原合約工程包	<input type="checkbox"/> 原合約工程加 / 減賬 QT-	<input type="checkbox"/> 新工程報價 QT-
---------------------------------	--	------------------------------------

信件批核號碼/圖紙參考編號:	批核模具圖紙編號:
客戶指示附件:	管理內部批簽署:

<input type="checkbox"/> 初步鋁料 B.M.	<input type="checkbox"/> 加工拆圖, 然後生產	<input type="checkbox"/> 尺寸表
<input type="checkbox"/> 正式鋁料 B.M.	<input type="checkbox"/> 技術上資料/指示	<input type="checkbox"/> 報價
<input type="checkbox"/> 配件 B.M.	<input type="checkbox"/> 樣辦或貨品說明書	<input type="checkbox"/> 分判合約
<input type="checkbox"/> 其他:		

內容: 請依附件資料, 生產玻璃, 送地盤
 - 按 BSEN 14179-1:2016 標準熱浸
 - 請分屋包裝出貨

完成上列要求日期: 30/3/2024

國內

<input type="checkbox"/> 生產技術總監	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 技術部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 生產部	<input type="checkbox"/> 連附件
<input type="checkbox"/> 採購部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 生產統籌部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 報關組	<input type="checkbox"/> 連附件
<input type="checkbox"/> 質檢部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 會計部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 機械設計部	<input type="checkbox"/> 連附件
<input type="checkbox"/> 香港辦	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 其他:			

香港

<input type="checkbox"/> 行政部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 會計部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 統籌部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 工程部	<input type="checkbox"/> 連附件
<input type="checkbox"/> 採購部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> QS部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input checked="" type="checkbox"/> 地盤管理	<input checked="" type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 維修部	<input type="checkbox"/> 連附件

*發件人簽署:		*組別成員批核簽署:	
傳遞編號:		項目經理簽署:	

J853-香港延坪道(第二期別墅)-Curtain Wall (地盤玻璃)-分棟數量統計表

工程： J853-香港延坪道(第二期別墅)

日期： 16-Nov-23

序号	部件图编号	HB5	HB6	HB7	HB8	总数量	备注
1	J853-CW-GL4-01-007	2	2	2	2	8	
2	J853-CW-GL4-01-009	2	2	2	2	8	
3	J853-CW-GL4-01-010	1	1	1	1	4	
4	J853-CW-GL4-01-011	2	2	2	2	8	
5	J853-CW-GL4-01-012	2	2	2	2	8	
		9	9	9	9	36	

地盤用玻璃B.M.表

項目類別: Curtain Wall (HB5-HB8)

核對:

日期:

副本:

B/M編號:

A/C Code:

批准:

日期:

版本:

總數量: 36

總面積 (m²): 6.16

序號	修改標示	加工圖号	玻璃编号	玻璃名稱	厚度 (mm)	玻璃尺寸		數量 (塊)	面積 (m ²)		備註
						寬度 (mm)	高度 (mm)		單件	總面積	
1		J853-CW-GL4-01	J853-CW-GL4-01-007	GL4: 12mm THK. CLEAR TEMPERED GLASS	12.00	940	257.5	8	0.24	1.94	
2		J853-CW-GL4-01	J853-CW-GL4-01-009			340	257.5	8	0.09	0.70	
3		J853-CW-GL4-01	J853-CW-GL4-01-010			475	257.5	4	0.12	0.49	
4		J853-CW-GL4-01	J853-CW-GL4-01-011			813	257.5	8	0.21	1.67	
5		J853-CW-GL4-01	J853-CW-GL4-01-012			660	257.5	8	0.17	1.36	
						總合計:		36	6.16		

1). 本表中所有玻璃對角線尺寸偏差要求不超過正負2mm.

2). 本表中所有玻璃要求粗磨邊處理並倒棱角.


3). 本表中玻璃要求粗磨邊處理並倒棱角, 攔河玻璃頂底要精磨邊, 而所有玻璃之入爐方向需保持一致.

4). 本表中不同種類玻璃參照玻璃加工圖加工.

5). 本表中所有強化玻璃均需HEAT SOAK TEST.


6). 本表中所有玻璃均需注明室內外面及其玻璃編號, 以便識別.

加工注意事項:



美特铝质有限公司
MIDI Aluminium Fabricator Ltd.

版本号		采用	工厂	√	地盘	名称	GL4:12T	制图	J.L.	27/09/23	物料号	详见玻璃BM表		
日期		颜色	-			地盘	GL4:12T	复核	-	-	图号	J853-CW-GL4-01		
						名称	玻璃加工图	批准	-	-	数量	-		
						材料	GL4:12T	单件面积(m ²)	-	-	长度	-	宽度	-

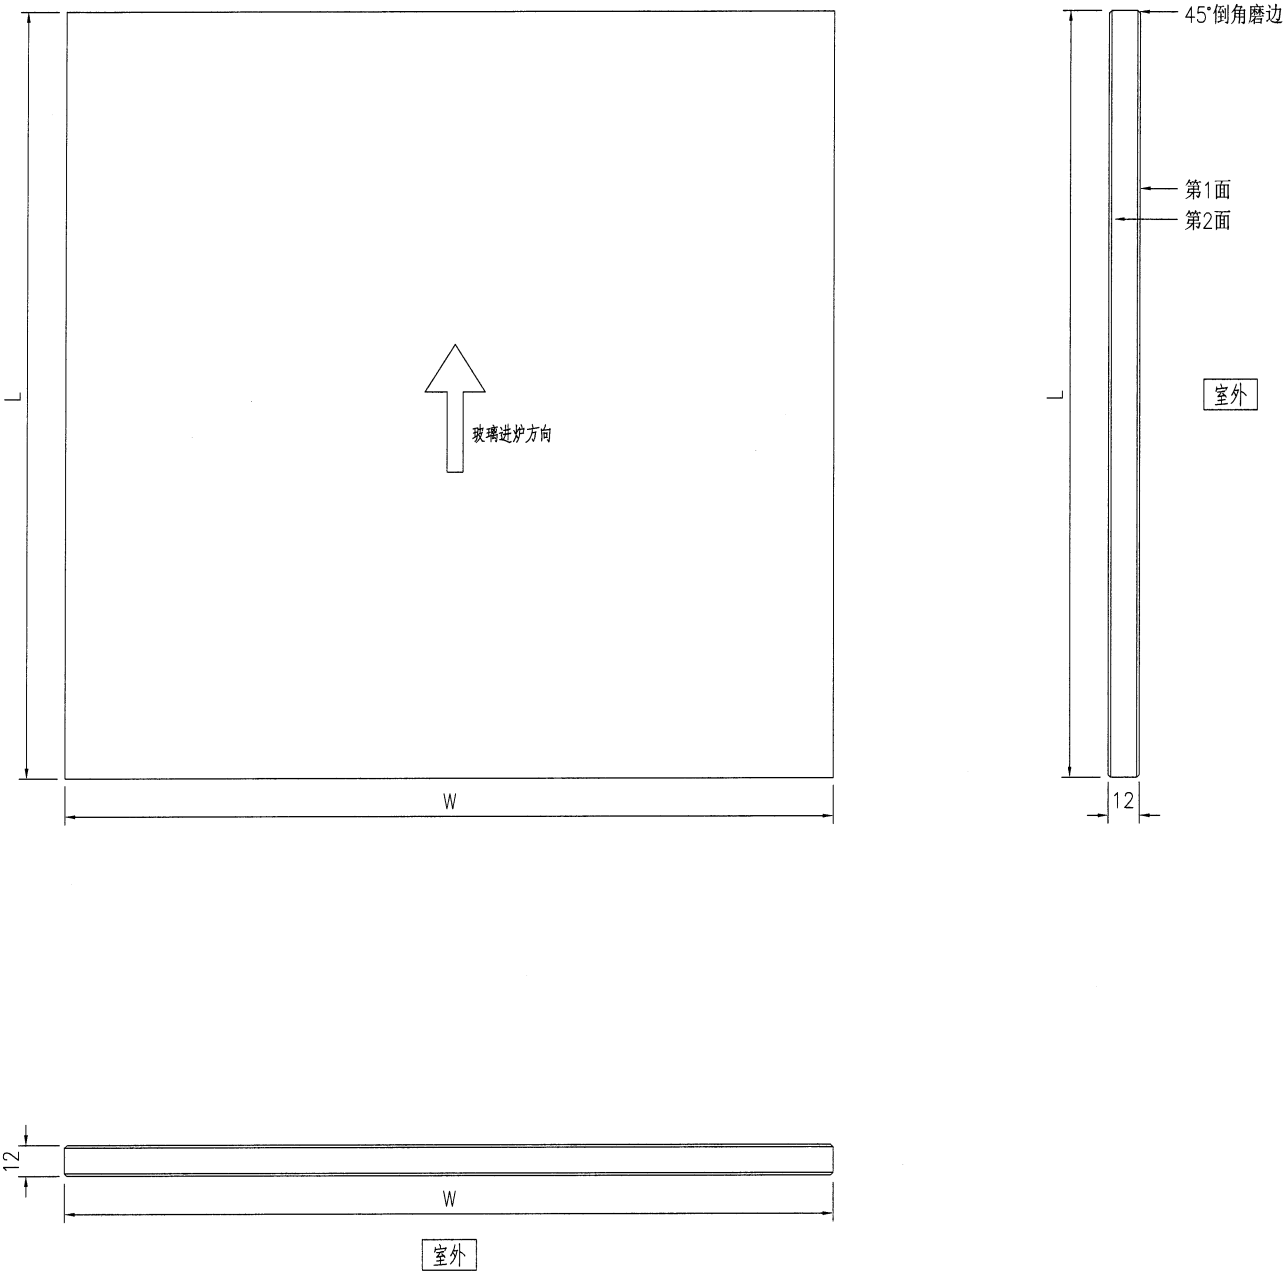

技术说明:

- 1.玻璃为: GL4:12mm THK. CLEAR TEMPERED GLASS
- 2.色号为: -
- 3.中空铝隔条, 两面涂丁基胶涂抹均匀, 内层为铝框本色, 玻璃四周1x45°机磨边;
- 4.玻璃密封胶采用: 聚硫胶, 胶深符合相应规范要求;
- 5.中空玻璃应符合《中空玻璃》GB1194-2002国家标准, 并按《玻璃幕墙工程质量检验标准》JGJ/T139-2001进行质量检验;
- 6.玻璃出厂前必须粘好相应编号及内外标签, 玻璃单边长度超过2m, 所有全钢化玻璃需要热浸处理;
- 7.玻璃钢化波纹方向平行分布; 图中标注尺寸单位为mm, 进炉方向与滚轮垂直。

