



工程指示 / 要求簡箋 ENGINEER INSTRUCTIONS(E.I.)

工程指示編號:	EI- 7450	修改版本:	-
	HK-0443		
工程編號:	J 853	工程名稱:	延坪道 (第2期)
收件人:	生統	發件人:	Joe Chan
工程項目:	Row C & Row D 幕牆橫 企料廠用鋁摺角.	日期:	12/03/2024

<input type="checkbox"/> 原合約工程包	<input type="checkbox"/> 原合約工程加 / 減賬 QT-	<input type="checkbox"/> 新工程報價 QT-
---------------------------------	--	------------------------------------

信件批核號碼/圖紙參考編號:	批核模具圖紙編號:
客戶指示附件:	管理內部批簽署:

<input type="checkbox"/> 初步鋁料 B.M.	<input type="checkbox"/> 加工拆圖, 然後生產	<input type="checkbox"/> 尺寸表
<input type="checkbox"/> 正式鋁料 B.M.	<input type="checkbox"/> 技術上資料/指示	<input type="checkbox"/> 報價
<input type="checkbox"/> 配件 B.M.	<input type="checkbox"/> 樣辦或貨品說明書	<input type="checkbox"/> 分判合約
<input type="checkbox"/> 其他:		

內容: 請依附件資料, 生產鋁板摺角.  
(用於 EI 7453 & EI 7454)

完成上列要求日期:

國內

<input type="checkbox"/> 生產技術總監	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 技術部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 生產部	<input type="checkbox"/> 連附件
<input type="checkbox"/> 採購部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input checked="" type="checkbox"/> 生產統籌部	<input checked="" type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 報關組	<input type="checkbox"/> 連附件
<input type="checkbox"/> 質檢部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 會計部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 機械設計部	<input type="checkbox"/> 連附件
<input type="checkbox"/> 香港辦	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 其他:			

香港

<input type="checkbox"/> 行政部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 會計部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 統籌部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 工程部	<input type="checkbox"/> 連附件
<input type="checkbox"/> 採購部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> QS部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 地盤管理	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 維修部	<input type="checkbox"/> 連附件

*發件人簽署:		*組別成員批核簽署:	
傳遞編號:	HK0443/24	項目經理簽署:	



<b>美特鋁質有限公司</b>		<b>工程號: J-853</b>		<b>計算: J.L.</b>		<b>日期: 11/3/2024</b>		<b>送呈: Joe</b>	
<b>MIDI Aluminium Fabricator Ltd.</b>		<b>地盤名稱: 香港延坪道(第二期別墅)</b>		<b>核對:</b>		<b>日期:</b>		<b>副本:</b>	
<b>工厂用鋁板B.M.表</b>		<b>項目類別: J853-Curtain Wall(HD橫企料組裝)</b>		<b>總重量(Kg): 45.11</b>		<b>日期:</b>		<b>版本:</b>	
<b>BM編號:</b>		<b>A/C Code:</b>		<b>總V.F.面積(m<sup>2</sup>): 0.00</b>					

序號	修改標示	加工圖号	鋁板編號	鋁板名稱	顏色	數量(塊)		總重量	展开面積(m <sup>2</sup> )		V.F.面積(m <sup>2</sup> )		備註
						實用	後備		總數	單件	總面積	單件	
1		J853-CW-AC-031	J853-CW-AC-031A	3mm 厚鋁板 (3003 H14)	鉻化	24		12.66	0.06	1.56	0.00	0.00	
2		J853-CW-AC-031	J853-CW-AC-031B	3mm 厚鋁板 (3003 H14)	鉻化	24		5.59	0.04	1.03	0.00	0.00	
3		J853-CW-AC-031	J853-CW-AC-031C	3mm 厚鋁板 (3003 H14)	鉻化	12		3.59	0.06	0.66	0.00	0.00	
4		J853-CW-AC-031	J853-CW-AC-031D	3mm 厚鋁板 (3003 H14)	鉻化	32		7.76	0.04	1.43	0.00	0.00	
5		J853-CW-AC-031	J853-CW-AC-031E	3mm 厚鋁板 (3003 H14)	鉻化	32		6.63	0.04	1.22	0.00	0.00	
6		J853-CW-AC-031	J853-CW-AC-031F	3mm 厚鋁板 (3003 H14)	鉻化	16		4.53	0.05	0.84	0.00	0.00	
7		J853-CW-AC-031	J853-CW-AC-031G	3mm 厚鋁板 (3003 H14)	鉻化	16		4.34	0.05	0.80	0.00	0.00	
總計:							156	45.11		7.54		0.00	

Row D 橫在料廠用鋁摺角.





美特铝质有限公司  
MIDI Aluminium Fabricator Ltd.

工程号	J853	制图	J.L.	06/3/24	物料号	J853-CW-AC-031
地盘	香港延坪路	复核	-	-	图号	J853-CW-AC-031
名称	铝板加工图	批准	-	-	数量	-
材料	3mm 厚铝板 (3003 H14)	单件重量(kg)	-	-	长度	-
宽度	-					

版本		采用	工厂	√	地盘	
日期		颜色	铬化			

物料编号	DIM.A	DIM.B	DIM.C	DIM.D	DIM.E	数量	单件重量(kg)	数量(HC)	数量(HD)
J853-CW-AC-031A	1297.5	4	300			-	-	20	24
J853-CW-AC-031B	860	2	300			-	-	20	24
J853-CW-AC-031C	1105	3	300			-	-	10	12
J853-CW-AC-031D	895	2	300			-	-	24	32
J853-CW-AC-031E	765	2	300			-	-	24	32
J853-CW-AC-031F	1045	3	300			-	-	8	16
J853-CW-AC-031G	1000	3	300			-	-	8	16
J853-CW-AC-031H	735	2	300			-	-	10	-
J853-CW-AC-031J	1035	3	300			-	-	8	-
J853-CW-AC-031K	755	2	300			-	-	10	-

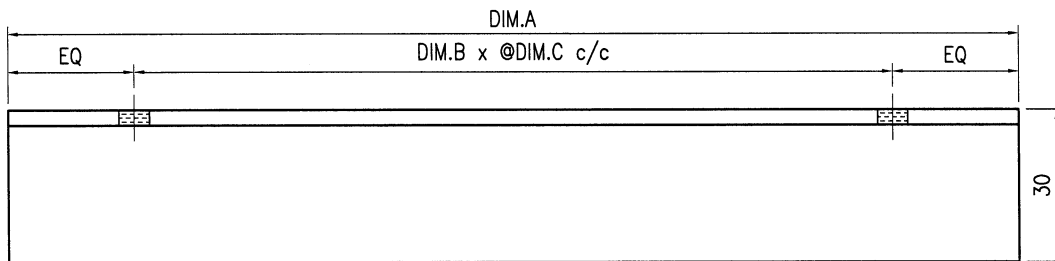

技术说明:

1. 板材折弯之前应进行压平调整, 不应有加工变形, 并应去除毛刺;
2. 外形尺寸允许偏差为±0.5mm, 折弯角度的允许偏差为±0.5°; 孔位的允许偏差为±0.3mm, 孔距的允许偏差为±0.3mm, 累计偏差为±0.5mm;
3. 槽口、豁口的长宽边允许偏差为+0.5mm, 中心线允许偏差都为±0.5mm;
4. " " 为外露喷涂装饰面, 应贴保护膜, 加工过程中不得破坏装饰面, 加工完毕须标示代号。
