

工程指示 / 要求簡箋 ENGINEER INSTRUCTIONS(E.I.)

工程指示編號:	EI- 8060	修改版本:	-
	HK- /		
工程編號:	J 853	工程名稱:	延坪道
收件人:	Maggie Lot	發件人:	Joe Chan
工程項目:	Row B (HBS-HBS) 屋仔 欄河 (2F) 補玻璃 (黃色)	日期:	16/7/2024

<input type="checkbox"/> 原合約工程包	<input type="checkbox"/> 原合約工程加 / 減賬 QT-	<input type="checkbox"/> 新工程報價 QT-
---------------------------------	--	------------------------------------

信件批核號碼/圖紙參考編號:	批核模具圖紙編號:
客戶指示附件:	管理內部批簽署:

<input type="checkbox"/> 初步鋁料 B.M.	<input type="checkbox"/> 加工拆圖, 然後生產	<input type="checkbox"/> 尺寸表
<input type="checkbox"/> 正式鋁料 B.M.	<input type="checkbox"/> 技術上資料/指示	<input type="checkbox"/> 報價
<input type="checkbox"/> 配件 B.M.	<input type="checkbox"/> 樣辦或貨品說明書	<input type="checkbox"/> 分判合約
<input type="checkbox"/> 其他:		

內容: 請依附件資料, 生產玻璃. 送地盤.  
- 按 BS EN 14179-1:2016 標準製造.  
- 請一批過出貨.

完成上列要求日期: 30/7/2024

國內

<input type="checkbox"/> 生產技術總監	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 技術部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 生產部	<input type="checkbox"/> 連附件
<input type="checkbox"/> 採購部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 生產統籌部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 報關組	<input type="checkbox"/> 連附件
<input type="checkbox"/> 質檢部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 會計部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 機械設計部	<input type="checkbox"/> 連附件
<input type="checkbox"/> 香港辦	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 其他:			

香港

<input type="checkbox"/> 行政部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 會計部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 統籌部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 工程部	<input type="checkbox"/> 連附件
<input type="checkbox"/> 採購部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> QS部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input checked="" type="checkbox"/> 地盤管理	<input checked="" type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 維修部	<input type="checkbox"/> 連附件

*發件人簽署:		*組別成員批核簽署:	
傳遞編號:		項目經理簽署:	

地盤用玻璃B.M.表

項目類別: Glass Balustrade-HB3~HB8

A/C Code:

批准:

日期:

總數量: 10

總面積 (m<sup>2</sup>): 4.78

備註

序號	修改標示	加工圖号	玻璃编号	玻璃名稱	厚度 (mm)	玻璃尺寸		數量 (塊)	面積 (m <sup>2</sup> )		備註
						高度W (mm)	闊度H (mm)		單件	總面積	
1		J853-GB-GL3-001	J853-GB-GL3-001-30	GL3:15mm THK. CLEAR TEMPERED + 1.52mm THK. (PVB) + 15mm THK. CLEAR TEMPERED LAMINATED GLASS SAMPLE NO.: R20230105032	1086	440	10	0.48	4.78	玻璃底部塗DC791黑膠	
2											
3											
4											
5											
						總合計:	10		4.78		

加工注意事項:

- 1). 本表中所有玻璃對角線尺寸偏差要求不超過正負2mm.
- 2). 本表中所有玻璃要求粗磨邊處理並倒棱角.
- 3). 本表中玻璃要求粗磨邊處理並倒棱角, 攔河玻璃頂底要精磨邊, 而所有玻璃之入爐方向需保持一致.
- 4). 本表中不同種類玻璃參照玻璃加工圖加工.
- 5). 本表中所有強化玻璃均需HEAT SOAK TEST.
- 6). 本表中所有玻璃均需注明室內外面及其玻璃編號, 以便識別.


# J853-香港延坪道(第二期别墅)-Glass Balustrade-HB3-8 補玻璃地盘玻璃分栋数量统计表

工程: J853-香港延坪道(第二期别墅)

日期: 16-Jul-24




Rev: \_\_\_\_\_

序号	部件图编号	玻璃类型						总数量	备注
		HB3	HB5	HB6	HB7	HB8			
1	J853-GB-GL3-001-30	2	2	2	2	2	10		
2									
3									
4									
5									
6									
		2	2	2	2	2	10		



美特铝质有限公司  
MIDI Aluminium Fabricator Ltd.

版本号 A				采用工厂				地盘				√	工程号 J853	制图 J.L.	20/11/23	物料号	详见玻璃BM表		
日期 14/12				颜色 -									地盘 香港延坪路	复核 -	-	图号	J853-GB-GL3-001		
													名称 玻璃加工图	批准 -	-	数量	-		
													材料 GL3:15 T+1.52PBV+15 T	单件面积(m²)	-	长度	-	宽度	-

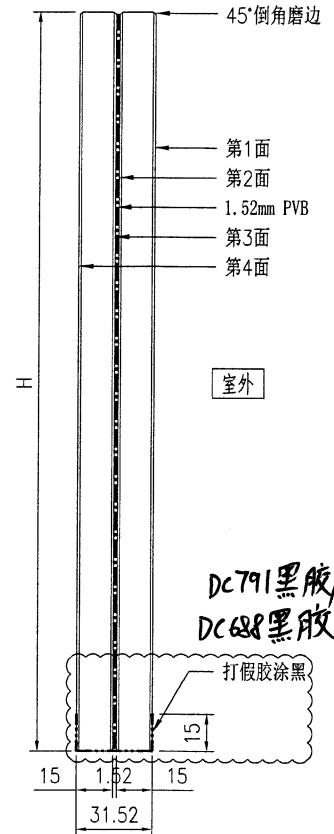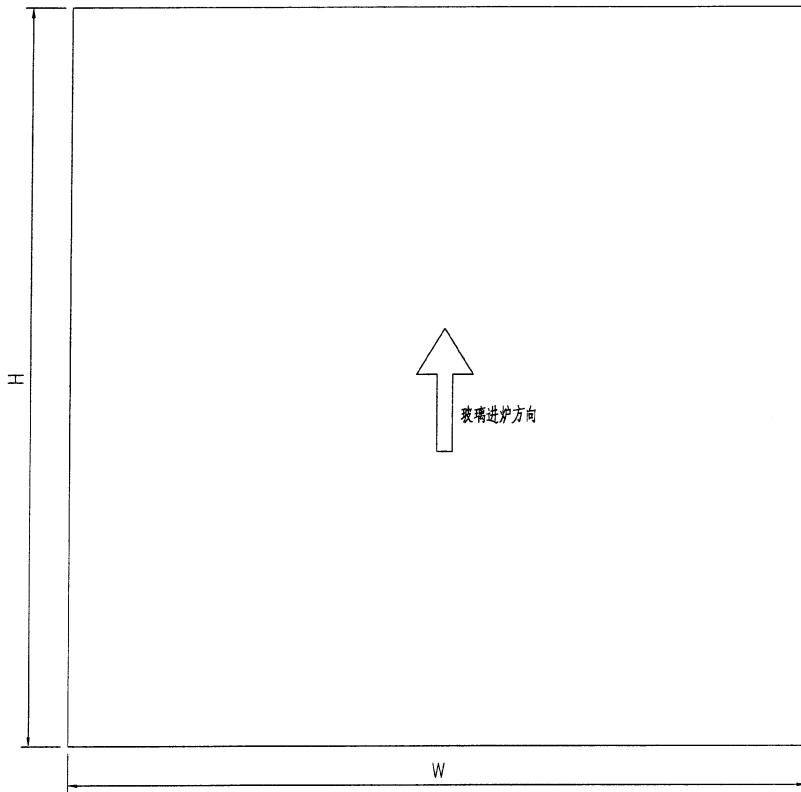

室外

技术说明:

- 1.玻璃为: GL3:15mm THK. CLEAR TEMPERED + 1.52mm THK. (PVB) + 15mm THK. CLEAR TEMPERED LAMINATED GLASS
- 2.色号为: -, Low-e膜在第 面;
- 3.中空铝隔条, 两面涂丁基胶涂抹均匀, 内层为铝框本色, 玻璃四周1x45°机磨边;
- 4.玻璃密封胶采用: , 胶深符合相应规范要求;
- 5.中空玻璃应符合《中空玻璃》GB1194-2002国家标准, 并按《玻璃幕墙工程质量检验标准》JGJ/T139-2001进行质量检验;
- 6.玻璃出厂前必须粘好相应编号及内外标签, 玻璃单边长度超过2m, 所有全钢化玻璃需要热浸处理;
- 7.玻璃钢化波纹方向平行分布; 图中标注尺寸单位为mm, 进炉方向与滚轮垂直。

