

工程指示 / 要求簡箋(E.I.)

工程指示編號：EI/ 4283 /22

修改版次：

工程編號：J853

工程名稱：延坪道住宅項目

工程項目：

佛沙窗廠用保護膠蓋

收件人：

生統

發件人：

Joe Chan

日期：

13/1/2022

要求提供 /  確認 事項：

( ) 初步鋁料 B.M.

( ) 加工拆圖，然後生產

( ) 尺寸表

( ) 正式鋁料 B.M.

( ) 技術上資料 / 指示

( ) 報價

( ) 配件 B.M.

( ) 樣辦或貨品說明書

( ) 分判合約

( ) 其他：\_\_\_\_\_

內容：

附上保護膠蓋數量資料，請依附件資料開料做佛沙窗保護。

請在 ASAP 前完成上列要求。

附有關圖紙 / 文件：

1+2頁

以上項目為：

原合約工程包

原合約工程加 / 減賬

新工程報價

原因：-

分發東莞各部門：

( ) 生產技術總監  連附件 ( ) 技術部  連附件 ( ) 生產部  連附件 ( ) 機械設計部  連附件

( ) 採購部  連附件 ( ) 生產統籌部  連附件

梅 TRACY

( ) 質檢部  連附件 ( ) 會計部  連附件 ( ) 報關組  連附件 ( ) 其他 \_\_\_\_\_  連附件

分發香港各部門：

( ) 行政部  連附件 ( ) 會計部  連附件 ( ) 統籌部  連附件 ( ) 工程部地盤科文  連附件

( ) 採購部  連附件 ( ) QS 部  連附件 ( ) 維修部  連附件 ( ) 其他 \_\_\_\_\_  連附件

傳遞編號：

AK0100/22

發件人簽署：

項目經理簽署：

PP


J853工程佛沙窗保護膠蓋用量表

序號	座次	涉及窗玉長度 (mm)	膠蓋長度 (mm)	膠蓋數量 (支)	備註
1	T2	800	725	1	梗位
2	T2	481	365	146	
3	T2	507	391	68	
4	T2	581	465	96	
5	T2	582	466	76	
6	T2	594.5	478.5	4	
7	T2	699.5	583.5	76	
8	T2		200	934	企向
9	T3	1480	1405	2	梗位
10	T3	481	365	96	
11	T3	542	426	4	
12	T3	581	465	152	
13	T3	699.5	583.5	216	
14	T3		200	940	企向
15	T5	850	747.5	1	梗位
16	T5	380	272.5	11	梗位
17	T5	1280	1140	9	梗位
18	T5	583.5	473	4	梗位
19	T5	431	315	30	
20	T5	481	365	94	
21	T5	507	391	36	
22	T5	554.5	439.5	2	
23	T5	557	441	72	
24	T5	563	447	8	
25	T5	581	465	66	
26	T5	619.5	503.5	36	
27	T5	654.5	538.5	22	
28	T5	699.5	583.5	28	
29	T5	740	624	8	
30	T5		200	854	企向
31	T6	1555	1447.5	19	梗位
32	T6	867	724	14	梗位
33	T6	431	315	38	
34	T6	481	365	28	
35	T6	526.5	410.5	28	
36	T6	581	465	28	
37	T6	629.5	513.5	38	

### J853工程佛沙窗保護膠蓋用量表

序號	座次	涉及窗玉長度 (mm)	膠蓋長度 (mm)	膠蓋數量 (支)	備註
38	T6	699.5	583.5	76	
39	T6		200	538	企向
40	T7	600	492.5	17	梗位
41	T7	355	427.5	17	梗位
42	T7	605	465	17	梗位
43	T7	331	215	66	
44	T7	445.5	329.5	2	
45	T7	481	365	6	
46	T7	507	391	68	
47	T7	529.5	413.5	34	
48	T7	544.5	428.5	64	
49	T7	581	465	36	
50	T7	584.5	468.5	34	
51	T7	731	615	34	
52	T7		200	790	企向
			合計：	6084	

# 硬膠蓋保護示意圖

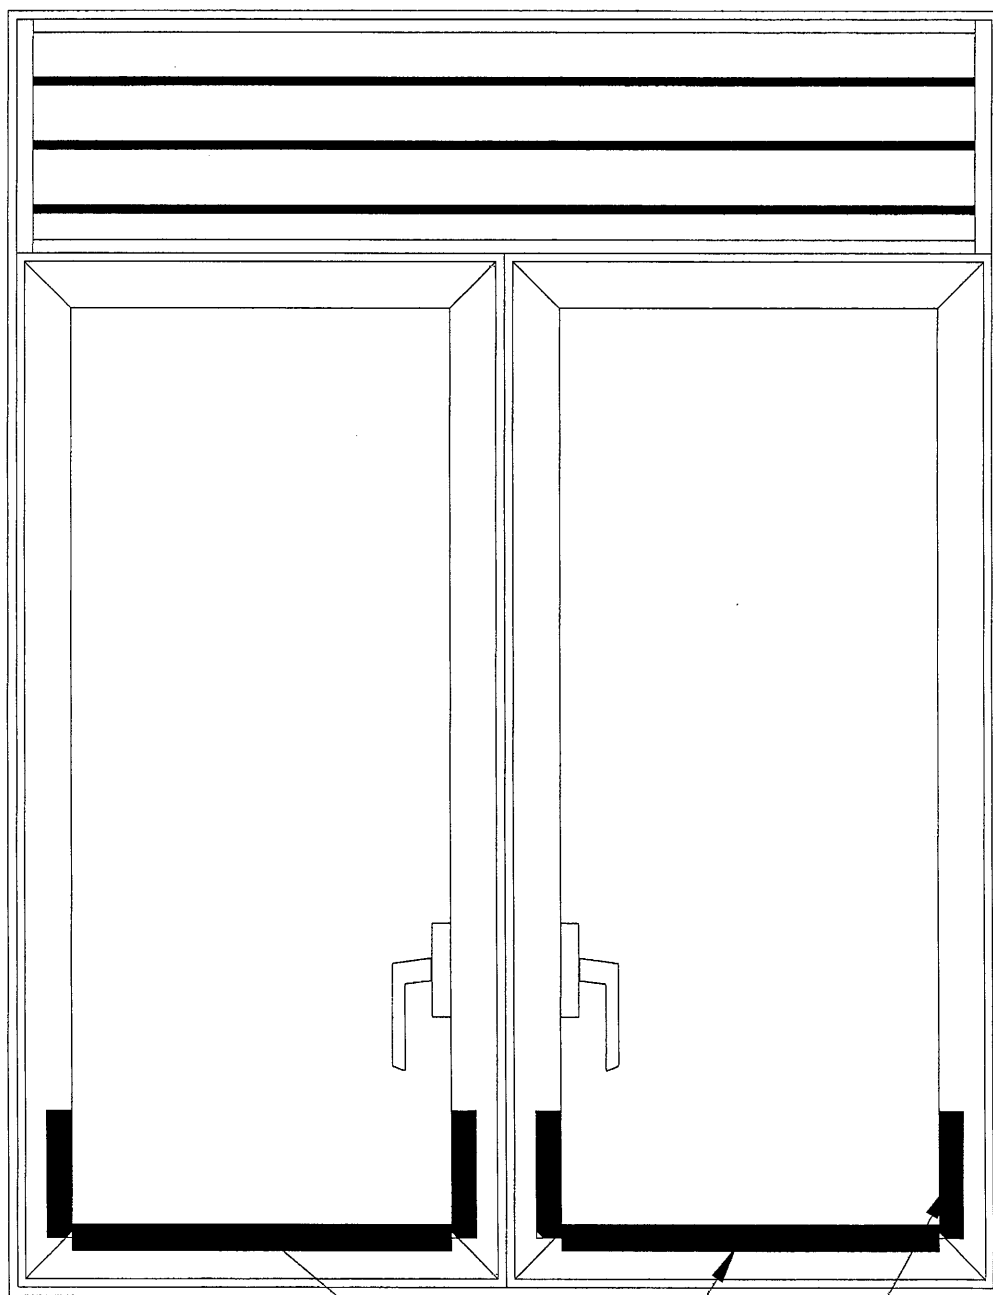

窗底全保障

企身蓋上200
