

工程指示 / 要求簡箋 ENGINEER INSTRUCTIONS (E.I.)

工程指示編號:	EI- 5364A	修改版本:	A
	HK- 2326		
工程編號:	J 856	工程名稱:	天榮站
收件人:	Maggie Lor	發件人:	Lai Sik Hung
工程項目:	天榮幕牆玻璃大貨 廠用 (修訂A:新增玻璃BM及分為3個MO出貨)	日期:	20/12/2022

<input type="checkbox"/> 原合約工程包	<input type="checkbox"/> 原合約工程加 / 減賬 QT-	<input type="checkbox"/> 新工程報價 QT-
---------------------------------	--	------------------------------------

信件批核號碼/圖紙參考編號:	批核模具圖紙編號:
客戶指示附件:	管理內部批簽署:

<input type="checkbox"/> 初步鋁料 B.M.	<input type="checkbox"/> 加工拆圖, 然後生產	<input type="checkbox"/> 尺寸表
<input type="checkbox"/> 正式鋁料 B.M.	<input type="checkbox"/> 技術上資料 / 指示	<input type="checkbox"/> 報價
<input type="checkbox"/> 配件 B.M.	<input type="checkbox"/> 樣辦或貨品說明書	<input type="checkbox"/> 分判合約
<input type="checkbox"/> 其他:		

內容: 修訂A: 新增玻璃BM及分為3個MO出貨 天榮幕牆玻璃大貨 廠用
T1玻璃到加工廠日期 - MO1 : 10/02/2023, MO2 : 01/05/2023, MO3 : 01/07/2023 T2&T3玻璃到加工廠日期 - MO1 : 10/01/2023, MO2 : 15/03/2023, MO3 : 15/05/2023
完成上列要求日期: 10/01/2023

國內

<input type="checkbox"/> 生產技術總監	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 技術部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 生產部	<input type="checkbox"/> 連附件
<input type="checkbox"/> 採購部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input checked="" type="checkbox"/> 生產統籌部	<input checked="" type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 報關組	<input type="checkbox"/> 連附件
<input type="checkbox"/> 質檢部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 會計部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 機械設計部	<input type="checkbox"/> 連附件
<input checked="" type="checkbox"/> 香港辦	<input checked="" type="checkbox"/> 連附件	<input checked="" type="checkbox"/> 其他: 林仁安			


<input type="checkbox"/> 行政部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 會計部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 統籌部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 工程部	<input type="checkbox"/> 連附件
<input checked="" type="checkbox"/> 採購部	<input checked="" type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> QS部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 地盤管理	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 維修部	<input type="checkbox"/> 連附件

*發件人簽署:		*組別成員批核簽署:	22/12/2022
傳遞編號:		項目經理簽署:	

	工程號:	J-856	計算:	劉傑	日期:	2022.11.15	送呈:	威哥
	地盤名稱:	天榮站	核對:	徐詳坤	日期:	2022.11.15	副本:	鴻仔
	項目類別:	T1座(塔樓/屋頂)	批准:	林仁安	日期:	2022.11.15		
	A/C Code:-	A 2022.12.19	數量:	1782	總計玻璃面積 (平方米)		1756.417	

序號	修改標示	顏色與名稱	厚度(mm)	玻璃尺寸		數量 (塊)	面積(平方米)		備註			
				寬度(mm)	高度(mm)		單件	總面積	M01	M02	M03	
1		GL1: 8mm Heat Strengthen + 12AIR+10mm Tempered Glass(Vision) <i>Low-e:SDCE55A(#2)</i>	30.00	614	840	269	0.516	138.739	見GL1-F01	70	91	108
2				1321.5	2005	74	2.650	196.071	見GL1-F01	20	26	28
3				1686.5	2005	74	3.381	250.226	見GL1-F01	20	26	28
4				1204	2005	37	2.414	89.319	見GL1-F01	10	13	14
5				1864	2005	2	3.737	7.475	見GL1-F01			2
6				1551.5	2005	4	3.111	12.443	見GL1-F01			4
7				1089	840	4	0.915	3.659	見GL1-F01			4
8				1401.5	2005	4	2.810	11.240	見GL1-F01			4
9				614	1105	269	0.678	182.508	見GL1-F01	70	91	108
10				1089	1105	4	1.203	4.813	見GL1-F01			4
11				886	2005	37	1.776	65.728	見GL1-F02	10	13	14
12				1811	2005	37	3.631	134.349	見GL1-F03	10	13	14
13				642.8	2005	74	1.289	95.372	見GL3-F01	20	26	28
14				642.8	915	72	0.588	42.348	見GL3-F01	20	26	26
15				642.8	570	2	0.366	0.733	見GL3-F01			2
16		GL1a: 8mm Heat Strengthen + 12AIR+12mm Tempered Glass(Vision) <i>Low-e:SDCE-55A(#2)</i>	32.00	2164	2005	2	4.339	8.678	見GL1A-F01			2
17		GL4-A01		614	915	252	0.562	141.576	見GL4-F01	70	91	91
18		GL4-A02		1321.5	915	72	1.209	87.060	見GL4-F01	20	26	26
19		GL4-A03		1686.5	915	72	1.543	111.107	見GL4-F01	20	26	26
20		GL4-A04		1204	915	36	1.102	39.660	見GL4-F01	10	13	13
21		GL4-A08A		1864	565	2	1.053	2.106	見GL4-F01			2
22		GL4-A08		614	565	10	0.347	3.469	見GL4-F01			10
23		GL4-A09		1551.5	565	4	0.877	3.506	見GL4-F01			4
24		GL4-A10		1089	565	4	0.615	2.461	見GL4-F01			4
25		GL4-A11		2164	565	2	1.223	2.445	見GL4-F01			2
26		GL4-A12	12.00	1401.5	565	4	0.792	3.167	見GL4-F01			4
27		GL4-AA01		614	570	7	0.350	2.450	見GL4-F01			7
28		GL4-AA02		1321.5	570	2	0.753	1.507	見GL4-F01			2
29		GL4-AA03		1686.5	570	2	0.961	1.923	見GL4-F01			2
30		GL4-AA04		1204	570	1	0.686	0.686	見GL4-F01			1
31		GL4-C01		886	915	36	0.811	29.185	見GL4-F01	10	13	13

T1
M01:10/02/2023
M02:01/05/2023
M03:01/07/2023

		工程號:	J-856	計算:	劉傑	日期:	2022.11.15	送呈:	威哥			
		地盤名稱:	天榮站	核對:	徐詳坤	日期:	2022.11.15	副本:	鴻仔			
		項目類別:	T1座(塔樓/屋頂)	批准:	林仁安	日期:	2022.11.15					
BM編號:		A/C Code:-	A 2022.12.19	數量:	1782	總計玻璃面積 (平方米)		1756.417				
序號	修改標示	顏色與名稱	厚度(mm)	玻璃尺寸		數量 (塊)	面積(平方米)		備註			
				寬度(mm)	高度(mm)		單件	總面積	M01	M02	M03	
32		GL4-C02		1811	915	36	1.657	59.654	見GL4-F01	10	13	13
33		GL4-CC01		886	570	1	0.505	0.505	見GL4-F01			1
34		GL4-CC02		1811	570	1	1.032	1.032	見GL4-F01			1
35		GL5-A02	GL5: 12mm Tempered Glass(PROTECTIVE BARRIER)	1045	122	4	0.127	0.510	見GL5-F01			4
36		GL5-A01		570	122	269	0.070	18.706	見GL5-F01	70	91	108
				總合計:		1782	1756.42					
<p>1).本表中所有玻璃對角線尺寸偏差要求不超過正負2mm.</p> <p>2).本表中所有玻璃要求粗磨邊處理並倒棱角.</p> <p>3).本表中玻璃要求粗磨邊處理並倒棱角,攔河玻璃頂底要精磨邊,而所有玻璃之入爐方向需保持一致。</p> <p>4).本表中不同種類玻璃參照玻璃加工圖加工。</p> <p>5).本表中所有強化玻璃均需HEAT SOAK TEST。</p> <p>6).本表中所有玻璃均需注明室內外面及其玻璃編號,以便識別。</p>												
加工注意事項:												

廠用玻璃B.M.表		工程號:	J-856	計算:	劉察	日期:	2022.11.15	送呈:	威哥			
BM編號:		地盤名稱:	天榮站	核對:	徐詳坤	日期:	2022.11.15	副本:	鴻仔			
		項目類別:	T2座(塔樓/屋頂)	批准:	林仁安	日期:	2022.11.15					
		A/C Code:-	A 2022.12.19	數量:	1706	計玻璃面積 (平方米)	1686.014					
序號	修改標示	顏色與名稱	厚度(mm)	玻璃尺寸		數量 (塊)	面積(平方米)		備註			
				寬度(mm)	高度(mm)		單件	總面積	MO1	MO2	MO3	
1		GL1-A01	GL1: 8mm Heat Strengthen + 12AIR+10mm Tempered Glass(Vision) <i>Low-e: SDC6-55A(#2)</i>	614	840	231	0.516	119.141	見GL1-F01	60	78	93
2		GL1-A02		1321.5	2005	74	2.650	196.071	見GL1-F01	20	26	28
3		GL1-A03		1686.5	2005	74	3.381	250.226	見GL1-F01	20	26	28
4		GL1-B01A		614	1405	1	0.863	0.863	見GL1-F01			1
5		GL1-A08		1864	2005	2	3.737	7.475	見GL1-F01			2
6		GL1-A09		1551.5	2005	4	3.111	12.443	見GL1-F01			4
7		GL1-A10		1089	840	4	0.915	3.659	見GL1-F01			4
8		GL1-A12		1401.5	2005	2	2.810	5.620	見GL1-F01			2
9		GL1-B01		614	1105	230	0.678	156.048	見GL1-F01	60	78	92
10		GL1-B06		1089	1105	4	1.203	4.813	見GL1-F01			4
11		GL1-B02		661	1105	37	0.730	27.025	見GL1-F02	10	13	14
12		GL1-B03		661	1105	37	0.730	27.025	見GL1-F03	10	13	14
13		GL1-B03A	661	1405	1	0.929	0.929	見GL1-F03			1	
14		GL1-C03	661	840	37	0.555	20.544	見GL1-F02	10	13	14	
15		GL1-C04	1911	2005	37	3.832	141.768	見GL1-F03	10	13	14	
16		GL1-C05	1911	2005	37	3.832	141.768	見GL1-F02	10	13	14	
17		GL1-C06	661	840	38	0.555	21.099	見GL1-F03	10	13	15	
18		GL1A-C05A	1911	2305	1	4.405	4.405	見GL1A-F02			1	
19		GL1a-A11	2164	2005	2	4.339	8.678	見GL1A-F01			2	
20		GL4-A01	614	915	216	0.562	121.351	見GL4-F01	60	78	78	
21		GL4-A02	1321.5	915	72	1.209	87.060	見GL4-F01	20	26	26	
22		GL4-A03	1686.5	915	72	1.543	111.107	見GL4-F01	20	26	26	
23		GL4-A08A	1864	565	2	1.053	2.106	見GL4-F01			2	
24		GL4-A08	614	565	8	0.347	2.775	見GL4-F01			8	
25		GL4-A09	1551.5	565	4	0.877	3.506	見GL4-F01			4	
26		GL4-A10	1089	565	4	0.615	2.461	見GL4-F01			4	
27		GL4-A11	2164	565	2	1.223	2.445	見GL4-F01			2	
28		GL4-A12	1401.5	565	2	0.792	1.584	見GL4-F01			2	
29		GL4-AC01	614	945	1	0.580	0.580	見GL4-F01			1	
30		GL4-AA01	614	570	5	0.350	1.750	見GL4-F01			5	
31		GL4-AA02	1321.5	570	2	0.753	1.507	見GL4-F01			2	

T2及T3

MO1: 10/01/2023

MO2: 15/03/2023

MO3: 15/05/2023

GL1a: 8mm Heat Strengthen + 12AIR+12mm Tempered Glass(Vision)
Low-e: SDC6-55A(#2)

1706

GL4: 12mm Heat Strengthen Tempered

	工程號:	J-856	計算:	劉燦	日期:	2022.11.15	送呈:	威哥				
	地盤名稱:	天榮站	核對:	徐詳坤	日期:	2022.11.15	副本:	鴻仔				
廠用玻璃B.M.表	項目類別:	T2座(塔樓/屋頂)	批准:	林仁安	日期:	2022.11.15						
BM編號:	A/C Code:-	A 2022.12.19	數量:	1706	計玻璃面積 (平方米)		1686.014					
序號	修改標示	顏色與名稱	厚度(mm)	玻璃尺寸		數量 (塊)	面積(平方米)		備註			
				寬度(mm)	高度(mm)		單件	總面積				
32		Glass(SPANDREL)	12.00	1686.5	570	2	0.961	1.923	見GL4-F01	MO1	MO2	MO3
33				614	565	1	0.347	0.347	見GL4-F01			1
34				661	915	36	0.605	21.773	見GL4-F01	10	13	13
35				1911	915	36	1.749	62.948	見GL4-F01	10	13	13
36				1911	915	36	1.749	62.948	見GL4-F01	10	13	13
37				661	915	36	0.605	21.773	見GL4-F01	10	13	13
38				1911	565	1	1.080	1.080	見GL4-F01			1
39				661	565	1	0.373	0.373	見GL4-F01			1
40				661	570	1	0.377	0.377	見GL4-F01			1
41				1911	570	1	1.089	1.089	見GL4-F01			1
42				1911	945	1	1.806	1.806	見GL4-F01			1
43				661	945	1	0.625	0.625	見GL4-F01			1
44		GL5: 12mm Tempered		1045	122	4	0.127	0.510	見GL5-F01			4
45		Glass(PROTECTIVE BARRIER)	12.00	570	122	231	0.070	16.064	見GL5-F01	60	78	93
46				497	122	75	0.061	4.548	見GL5-F01	20	26	29
				總合計:		1706		1686.01				
<p>1).本表中所有玻璃對角線尺寸偏差要求不超過正負2mm.</p> <p>2).本表中所有玻璃要求粗磨邊處理並倒棱角.</p> <p>3).本表中玻璃要求粗磨邊處理並倒棱角,攔河玻璃頂底要精磨邊,而所有玻璃之入爐方向需保持一致。</p> <p>4).本表中不同種類玻璃參照玻璃加工圖加工。</p> <p>5).本表中所有強化玻璃均需HEAT SOAK TEST。</p> <p>6).本表中所有玻璃均需注明室內外面及其玻璃編號,以便識別。</p>												
加工注意事項:												



廠用玻璃B.M.表

BM編號:

工程號:	J-856	計算:	劉燦	日期:	2022.11.15	送呈:	威哥
地盤名稱:	天榮站	核對:	徐詳坤	日期:	2022.11.15	副本:	鴻仔
項目類別:	T3座(塔樓/屋頂)	批准:	林仁安	日期:	2022.11.15		
A/C Code:-	A 2022.12.19	數量:	1818	計玻璃面積 (平方米)			1573.938

序號	修改標示	顏色與名稱	厚度(mm)	玻璃尺寸		數量 (塊)	面積(平方米)		備註				
				寬度(mm)	高度(mm)		單件	總面積	MO1	MO2	MO3		
1		GL1-A01	30.00	614	840	225	0.516	116.046	見GL1-F01	60	78	87	
2		GL1-A05		921.5	2005	37	1.848	68.361	見GL1-F01	10	13	14	
3		GL1-A06		1569	2005	37	3.146	116.396	見GL1-F01	10	13	14	
4		GL1-A07		729	2005	37	1.462	54.081	見GL1-F01	10	13	14	
5		GL1-A09		1551.5	2005	1	3.111	3.111	見GL1-F01				1
6		GL1-A13		779	840	2	0.654	1.309	見GL1-F01				2
7		GL1-A14		1634	2005	1	3.276	3.276	見GL1-F01				1
8		GL1-A15		1284	2005	1	2.574	2.574	見GL1-F01				1
9		GL1-A16		784	840	2	0.659	1.317	見GL1-F01				2
10		GL1-A17		1361.5	2005	1	2.730	2.730	見GL1-F01				1
11		GL1-B01		614	1105	224	0.678	151.977	見GL1-F01	60	78	86	
12		GL1-B01A		614	1405	1	0.863	0.863	見GL1-F01				1
13		GL1-B02		661	1105	37	0.730	27.025	見GL1-F02	10	13	14	
14		GL1-B02A		661	1405	1	0.929	0.929	見GL1-F02				1
15		GL1-B04	761	1105	37	0.841	31.113	見GL1-F03	10	13	14		
16		GL1-B05	561	1105	37	0.620	22.936	見GL1-F02	10	13	14		
17		GL1-B07	779	1105	2	0.861	1.722	見GL1-F01				2	
18		GL1-B08	784	1105	2	0.866	1.733	見GL1-F01				2	
19		GL1-C03	661	840	38	0.555	21.099	見GL1-F02	10	13	15		
20		GL1-C07	1678.5	2005	37	3.365	124.520	見GL1-F02	10	13	14		
21		GL1-C08	761	840	37	0.639	23.652	見GL1-F03	10	13	14		
22		GL1-C09	561	840	37	0.471	17.436	見GL1-F02	10	13	14		
23		GL1-C10	1811	2005	74	3.631	268.698	見GL1-F03	20	26	28		
24		GL1A-C10A	1811	2305	1	4.174	4.174	見GL1A-F02				1	
25		GL4-A01	614	915	216	0.562	121.351	見GL4-F01	60	78	78		
26		GL4-A05	921.5	915	36	0.843	30.354	見GL4-F01	10	13	13		
27		GL4-A06	1569	915	36	1.436	51.683	見GL4-F01	10	13	13		
28		GL4-A07	729	915	36	0.667	24.013	見GL4-F01	10	13	13		
29		GL4-A08	614	565	2	0.347	0.694	見GL4-F01				2	
30		GL4-A09	1551.5	565	1	0.877	0.877	見GL4-F01				1	
31		GL4-A13	779	565	2	0.440	0.880	見GL4-F01				2	
32		GL4-A14	1634	565	1	0.923	0.923	見GL4-F01				1	


T2及T3
MO1: 10/01/2023
MO2: 15/03/2023
MO3: 15/05/2023

	工程號:	J-856	計算:	劉燦	日期:	2022.11.15	送呈:	威哥
	地盤名稱:	天榮站	核對:	徐詳坤	日期:	2022.11.15	副本:	鴻仔
	項目類別:	T3座(格樓/屋頂)	批准:	林仁安	日期:	2022.11.15		
廠用玻璃B.M.表	A/C Code:-	A 2022.12.19	數量:	1818	計玻璃面積 (平方米)		1573.938	
BM編號:								



序號	修改標示	顏色與名稱	厚度(mm)	玻璃尺寸		數量 (塊)	面積(平方米)		備註		
				寬度(mm)	高度(mm)		單件	總面積			
33		GL4-A15	12.00	1284	565	1	0.725	0.725	見GL4-F01	MO1	
34		GL4-A16		784	565	2	0.443	0.886	見GL4-F01		MO2
35		GL4-A17		1361.5	565	1	0.769	0.769	見GL4-F01		MO3
36		GL4-AA01		614	570	5	0.350	1.750	見GL4-F01		
37		GL4-AC01		615	945	1	0.581	0.581	見GL4-F01		
38		GL4-AA05		921.5	570	1	0.525	0.525	見GL4-F01		
39		GL4-AA06		1569	570	1	0.894	0.894	見GL4-F01		
40		GL4-AA07		729	570	1	0.416	0.416	見GL4-F01		
41		GL4-AB01		614	565	1	0.347	0.347	見GL4-F01		
42		GL4-C03		661	915	36	0.605	21.773	見GL4-F01	10	13
43		GL4-C07		1678.5	915	36	1.536	55.290	見GL4-F01	10	13
44		GL4-C08		761	915	36	0.696	25.067	見GL4-F01	10	13
45		GL4-C09		561	915	36	0.513	18.479	見GL4-F01	10	13
46		GL4-C10		1811	915	72	1.657	119.309	見GL4-F01	20	26
47		GL4-CB03		661	565	1	0.373	0.373	見GL4-F01		
48		GL4-CB10		1811	565	1	1.023	1.023	見GL4-F01		
49		GL4-CF03		661	945	1	0.625	0.625	見GL4-F01		
50		GL4-CC07		1678.5	570	1	0.957	0.957	見GL4-F01		
51		GL4-CC08		761	570	1	0.434	0.434	見GL4-F01		
52		GL4-CC09		561	570	1	0.320	0.320	見GL4-F01		
53		GL4-CC10		1811	570	1	1.032	1.032	見GL4-F01		
54		GL4-CC10A		1811	945	1	1.711	1.711	見GL4-F01		
55		GL5-A03		735	122	2	0.090	0.179	見GL5-F01		
56		GL5-A01		570	122	225	0.070	15.647	見GL5-F01	60	78
57		GL5-C01		497	122	38	0.061	2.304	見GL5-F01	10	13
58		GL5-C02		597	122	37	0.073	2.695	見GL5-F01	10	13
59		GL5-C03		397	122	37	0.048	1.792	見GL5-F01	10	13
60		GL5-A04		740	122	2	0.090	0.181	見GL5-F01		
						總合計:	1818	1573.94			

1).本表中所有玻璃對角線尺寸偏差要求不超過正負2mm.

2).本表中所有玻璃要求粗磨邊處理並倒棱角.


	工程號:	J-856	計算:	劉燦	日期:	2022.11.15	送呈:	威哥
	地盤名稱:	天榮站	核對:	徐詳坤	日期:	2022.11.15	副本:	鴻仔
廠用玻璃B.M.表	項目類別:	T3座(塔樓/屋頂)	批准:	林仁安	日期:	2022.11.15		
BM編號:	A/C Code:-	A 2022.12.19	數量:	1818	計玻璃面積 (平方米)			1573.938
序號	修改標示	顏色與名稱	厚度(mm)	玻璃尺寸	數量	面積(平方米)	備註	
				寬度(mm) 高度(mm)	(塊)	單件 總面積	MO1 MO2 MO3	
<p>3).本表中玻璃要求粗磨邊處理並倒棱角，攔河玻璃頂底要精磨邊，而所有玻璃之入爐方向需保持一致。</p> <p>4).本表中不同種類玻璃參照玻璃加工圖加工。</p> <p>5).本表中所有強化玻璃均需HEAT SOAK TEST。</p> <p>6).本表中所有玻璃均需注明室內外面及其玻璃編號，以便識別。</p>								
加工注意事項：								



 美特鋁質有限公司 MIDI Aluminium Fabricator Ltd.				工程號 J856	類別 	物料號 -		
地盤 天榮站				制圖 劉燦	2022-10-18	圖號 GL1-F01		
修改 日期	-	-	採用工廠 <input checked="" type="checkbox"/>	地盤 	图纸名称 玻璃加工图	復核 徐詳坤	2022-19-19	數量 -
材料颜色 				材料 GLASS	批准 林仁安	2022-10-19	單件重量 -	(KG)

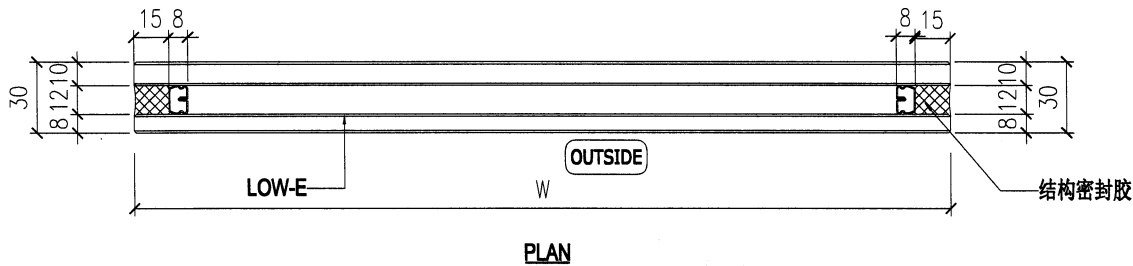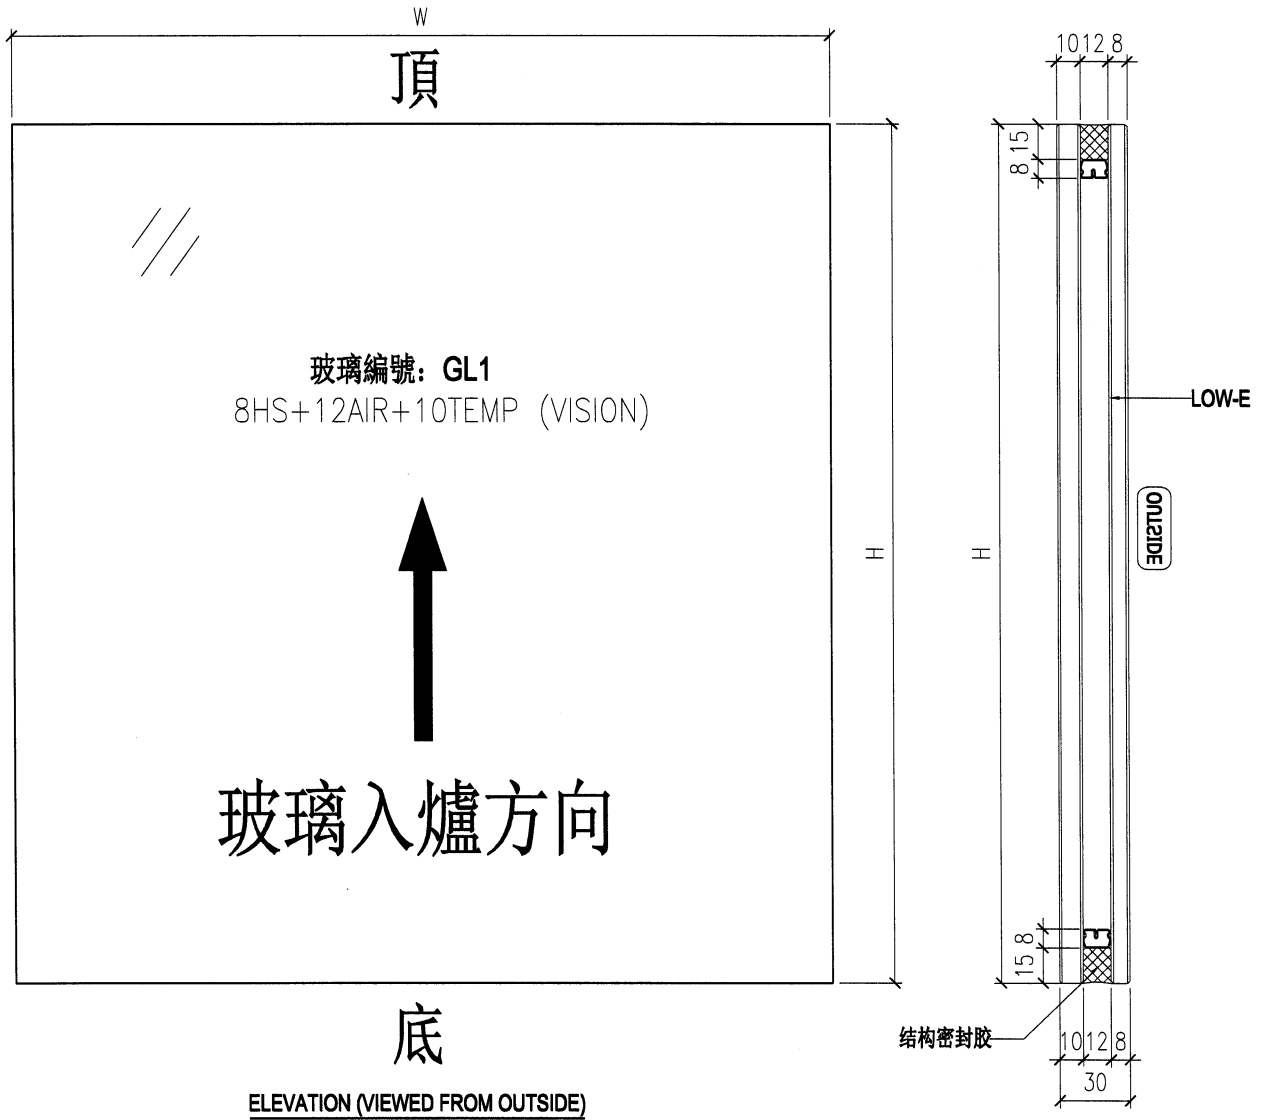


NOTES



1. ALL DIMENSION IN mm
2. ALL EDGE CHAMFER 1x1x45

 美特鋁質有限公司 MIDI Aluminium Fabricator Ltd.				工程號 J856	類別	物料號 -		
				地盘 天榮站	制圖 劉燦	2022-10-18	圖號 GL1-F02	
修改 -	-	-	採用工廠 ✓	地盘	图纸名称 玻璃加工图	復核 徐詳坤	2022-19-19	數量 -
日期 -	-	-	材料颜色		材料 GLASS	批准 林仁安	2022-10-19	單件重量 - (KG)

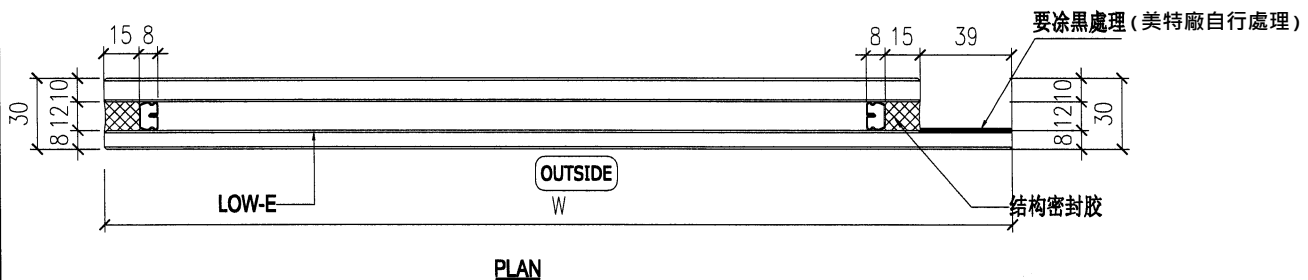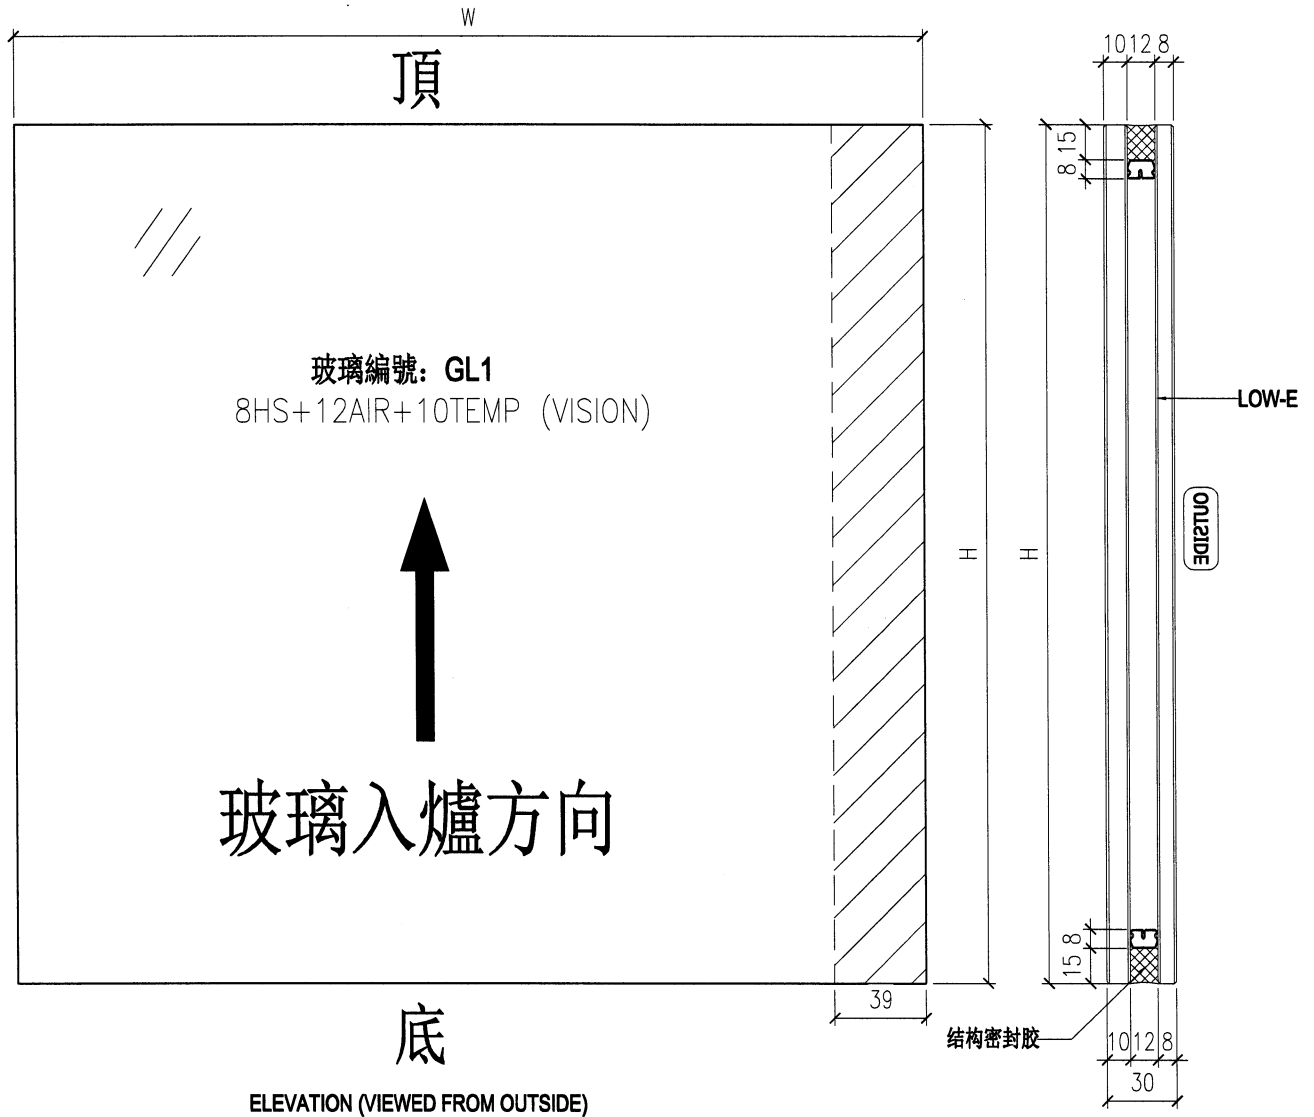

- NOTES
1. ALL DIMENSION IN mm
 2. ALL EDGE CHAMFER 1x1x45



 美特鋁質有限公司 MIDI Aluminium Fabricator Ltd.				工程號 J856	類別 	物料號 -			
				地盘 天榮站	制圖 劉燦	2022-10-18	圖號 GL1-F03		
修改 日期	-	-	-	採用工廠 <input checked="" type="checkbox"/>	地盤 	图纸名称 玻璃加工图	復核 徐詳坤	2022-19-19	數量 -
				材料颜色 	材料 GLASS	批准 林仁安	2022-10-19	單件重量 -	(KG)

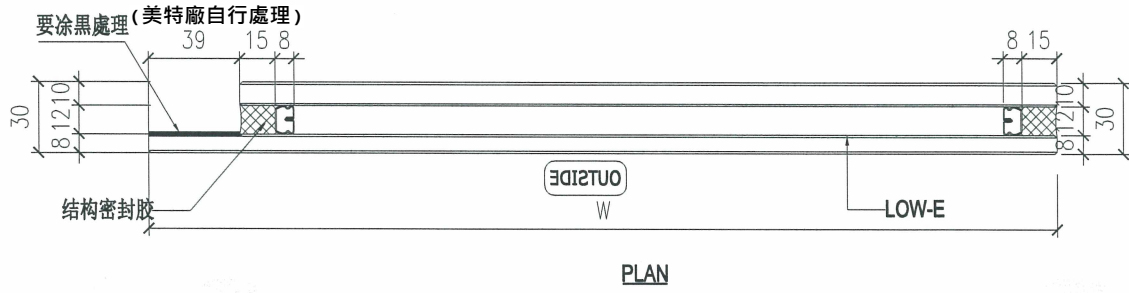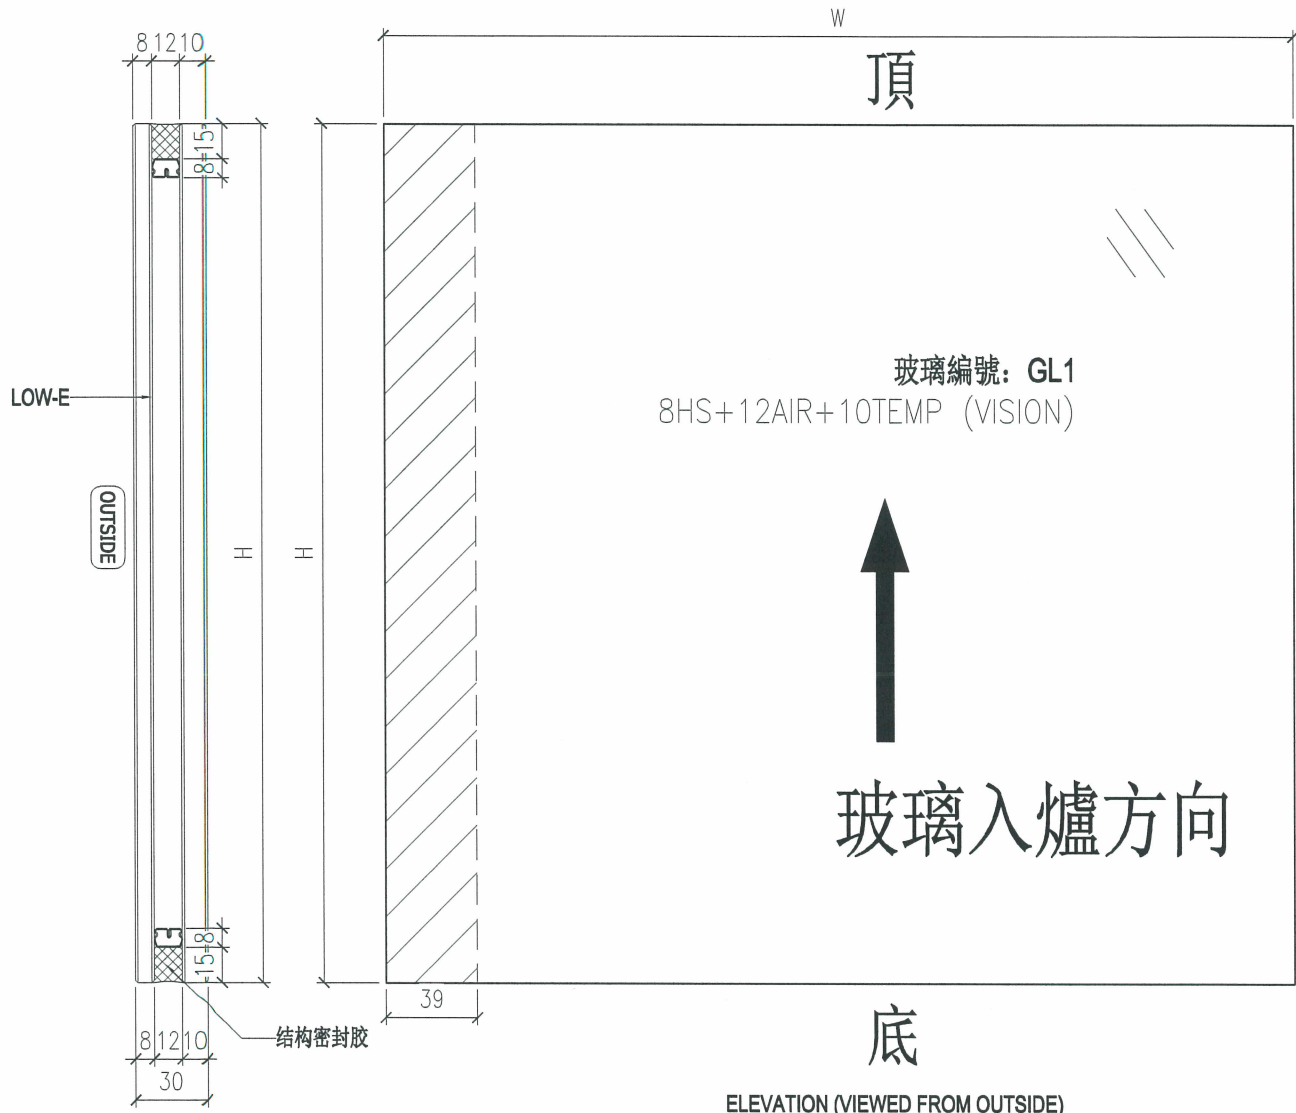

NOTES


- ALL DIMENSION IN mm
- ALL EDGE CHAMFER 1x1x45



 美特鋁質有限公司 MIDI Aluminium Fabricator Ltd.				工程號 J856	類別 	物料號 -		
地盤 天榮站				制圖 劉燦	2022-10-18	圖號 GL1A-F01		
修改 日期	-	-	採用工廠 <input checked="" type="checkbox"/>	地盤 	图纸名称 玻璃加工图	復核 徐詳坤	2022-19-19	數量 -
材料颜色 				材料 GLASS	批准 林仁安	2022-10-19	單件重量 -	(KG)

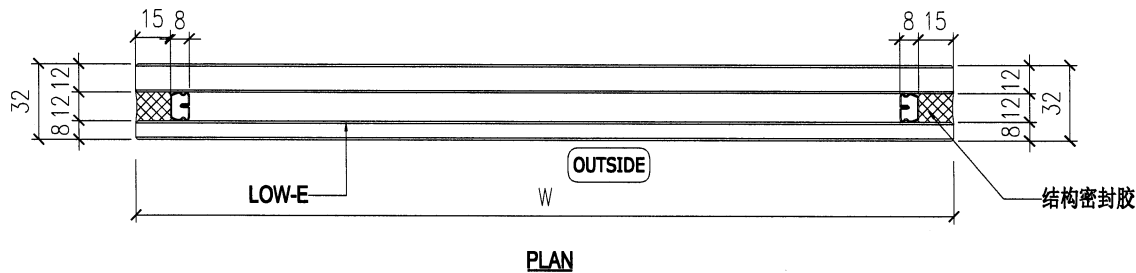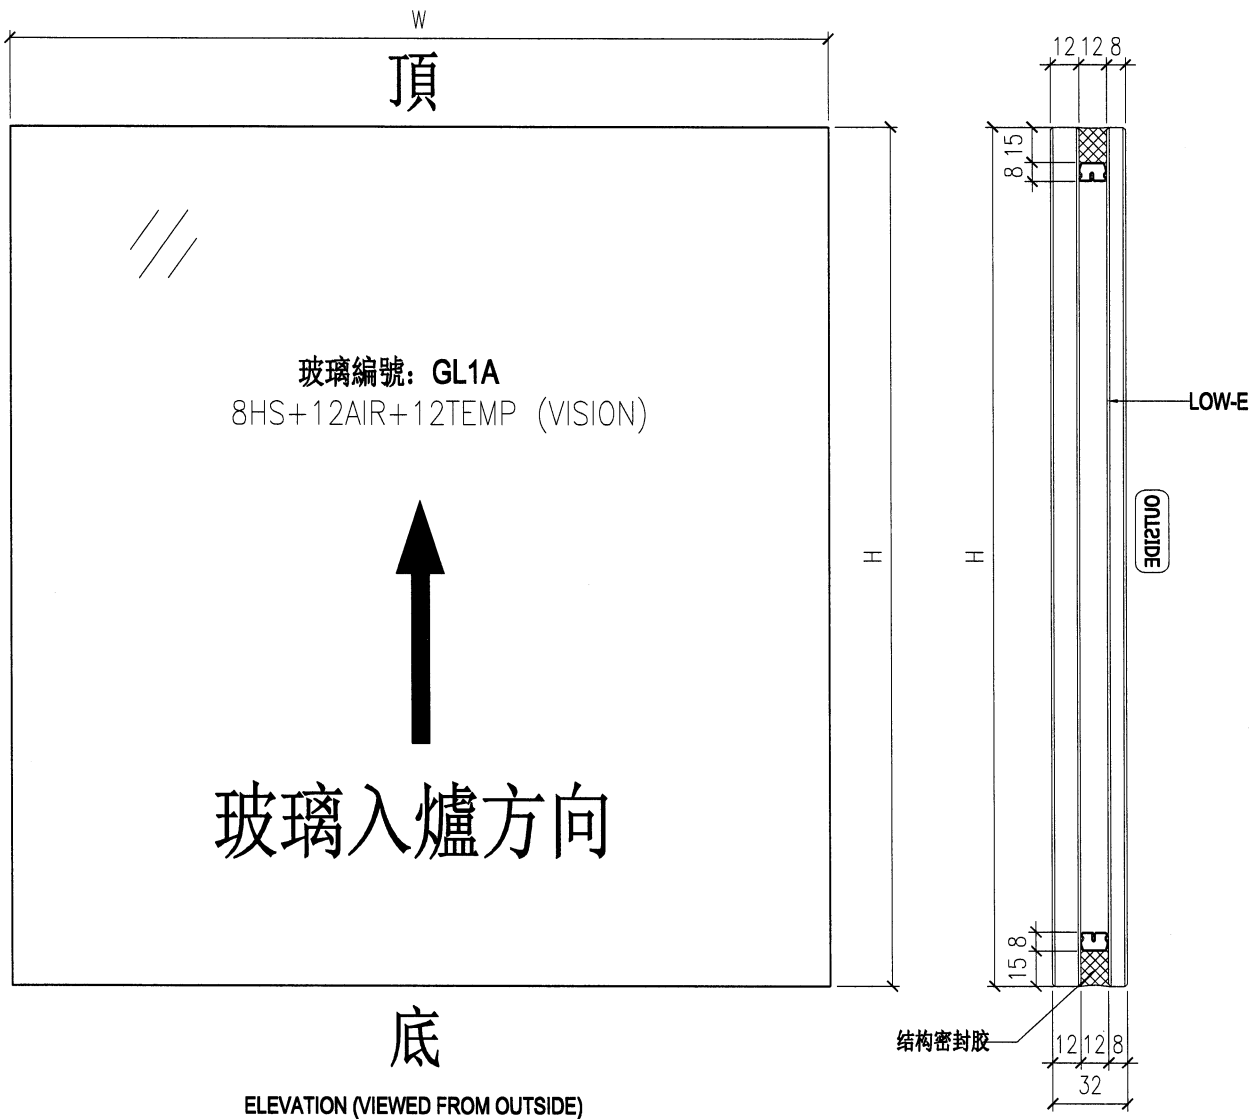

NOTES


1. ALL DIMENSION IN mm
2. ALL EDGE CHAMFER 1x1x45



 美特鋁質有限公司 MIDI Aluminium Fabricator Ltd.				工程號 J856	類別 -	物料號 -		
				地盘 天榮站	制圖 劉燦	2022-10-18	圖號 GL1A-F02	
修改 日期	-	-	-	採用工廠 <input checked="" type="checkbox"/>	图纸名称 玻璃加工图	復核 徐詳坤	2022-19-19	數量 -
				材料颜色 -	材料 GLASS	批准 林仁安	2022-10-19	單件重量 - (KG)

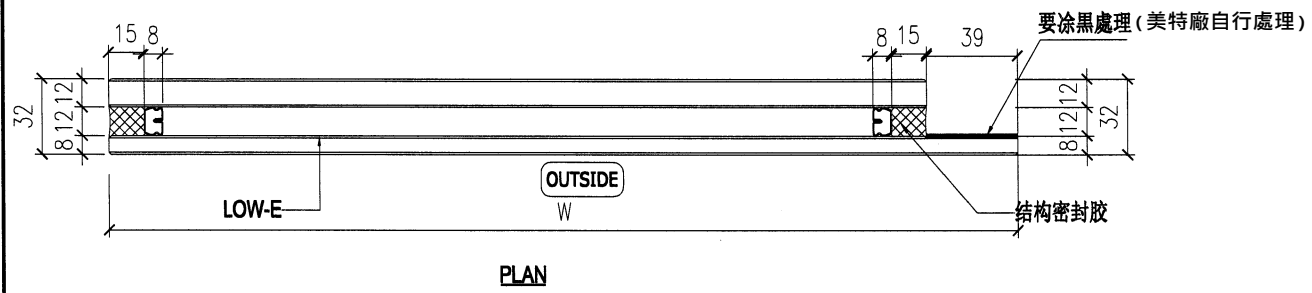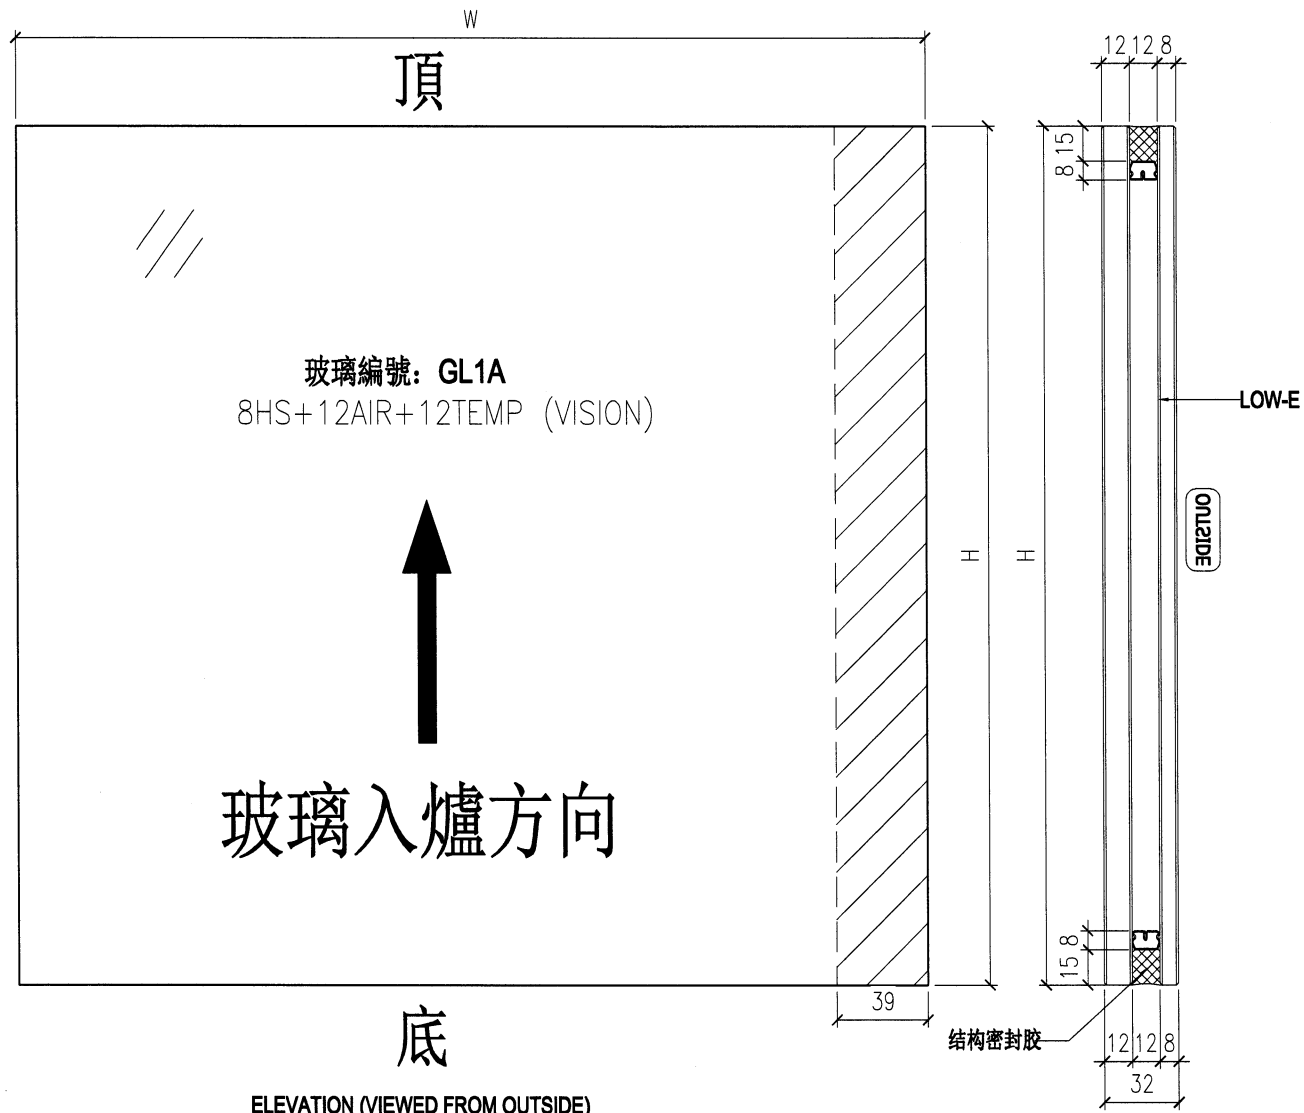

NOTES



1. ALL DIMENSION IN mm
2. ALL EDGE CHAMFER 1x1x45

 美特鋁質有限公司 MIDI Aluminium Fabricator Ltd.				工程號 J856	類別 -	物料號 -		
				地盘 天榮站	制圖 劉燦	2022-10-18	圖號 GL4-F01	
修改 日期	-	-	-	採用工廠 <input checked="" type="checkbox"/> 地盘	图纸名称 玻璃加工图	復核 徐詳坤	2022-10-19	數量 -
				材料颜色 -	材料 GLASS	批准 林仁安	2022-10-19	單件重量 - (KG)

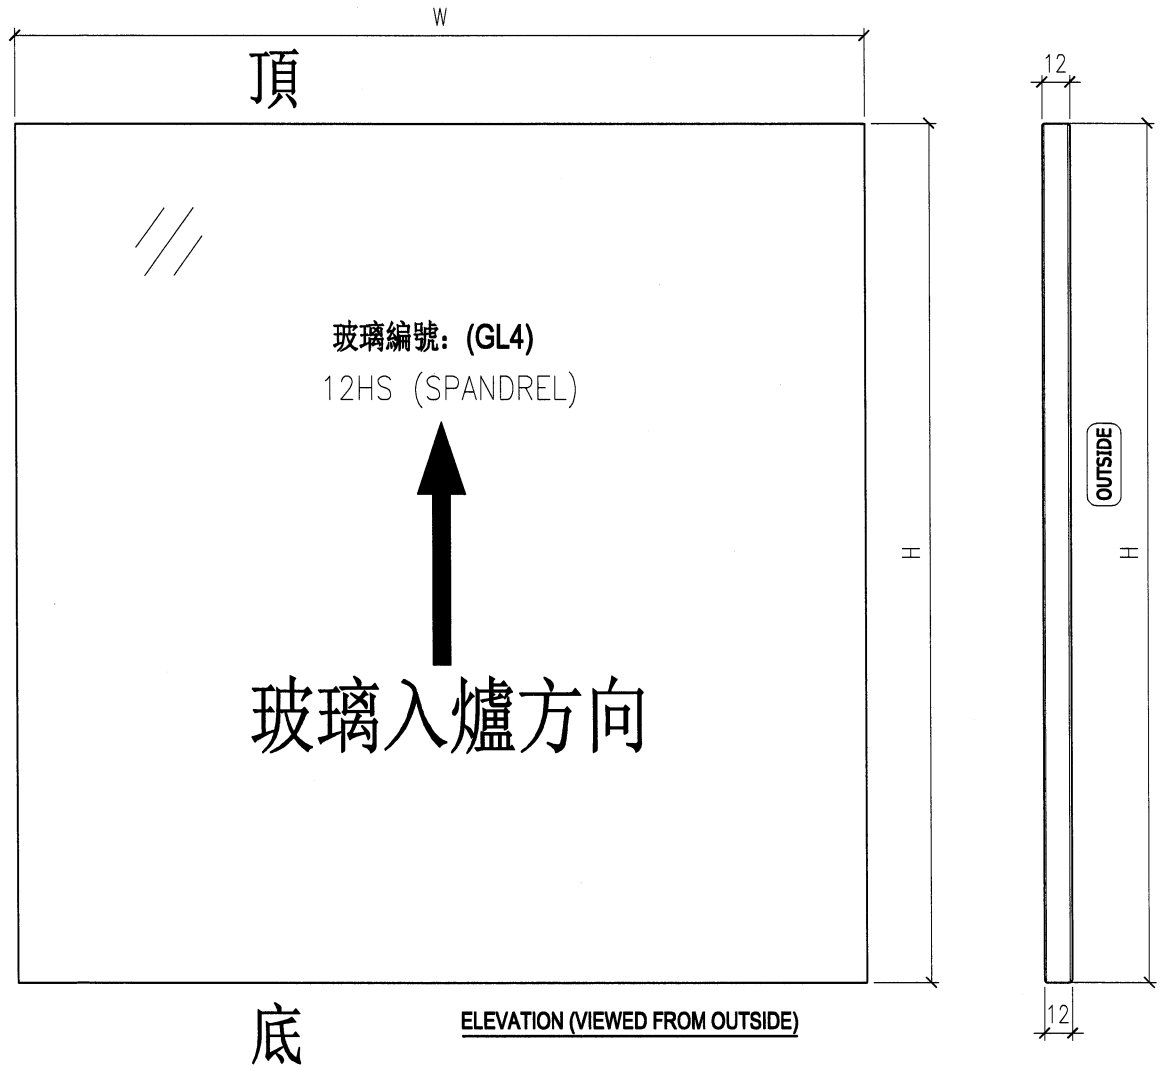


NOTES
 1. ALL DIMENSION IN mm
 2. ALL EDGE CHAMFER 1x1x45

 美特鋁質有限公司 MIDI Aluminium Fabricator Ltd.				工程號 J856	類別 	物料號 -			
				地盘 天榮站	制圖 劉燦	2022-10-18	圖號 GL5-F01		
修改 日期	-	-	-	採用工廠 <input checked="" type="checkbox"/>	图纸名称 玻璃加工图	復核 徐詳坤	2022-10-19	數量 -	
				材料颜色 	材料 GLASS	批准 林仁安	2022-10-19	單件重量 -	(KG)

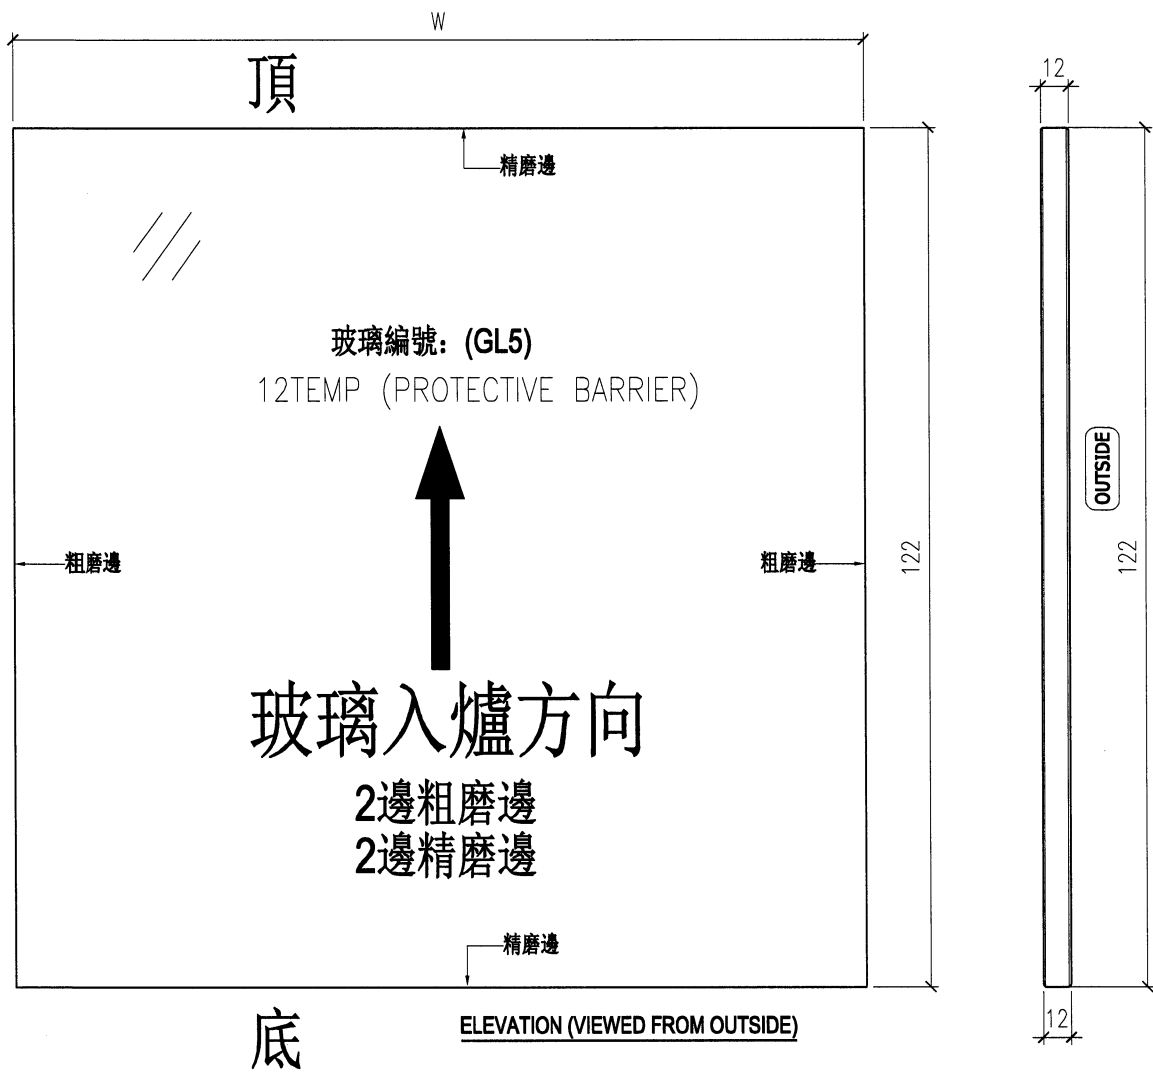

NOTES
 1. ALL DIMENSION IN mm
 2. ALL EDGE CHAMFER 1x1x4.5



工程號: J-856
天榮站

項目類別: T1座(塔樓/屋頂)

計算: 劉傑
日期: 2022.11.15

核對: 徐詳坤
日期: 2022.11.15

批准: 林仁安
日期: 2022.11.15

送呈: 威哥
副本: 鴻仔

廠用玻璃B.M.表

A/C Code:-

A 2022.12.19

數量: 1782

計玻璃面積 (平方米)

1756.417

序號	修改標示	顏色與名稱	厚度(mm)	玻璃尺寸		數量(塊)	面積(平方米)		備註			
				寬度(mm)	高度(mm)		單件	總面積	M01	M02	M03	
1		GL1-A01	30.00	614	840	269	0.516	138.739	見GL1-F01	70	91	108
2		GL1-A02		1321.5	2005	74	2.650	196.071	見GL1-F01	20	26	28
3		GL1-A03		1686.5	2005	74	3.381	250.226	見GL1-F01	20	26	28
4		GL1-A04	GL1: 8mm Heat Strengthen + 12AIR+10mm Tempered Glass (Vision)	1204	2005	37	2.414	89.319	見GL1-F01	10	13	14
5		GL1-A08		1864	2005	2	3.737	7.475	見GL1-F01			2
6		GL1-A09		1551.5	2005	4	3.111	12.443	見GL1-F01			4
7		GL1-A10		1089	840	4	0.915	3.659	見GL1-F01			4
8		GL1-A12		1401.5	2005	4	2.810	11.240	見GL1-F01			4
9		GL1-B01		614	1105	269	0.678	182.508	見GL1-F01	70	91	108
10		GL1-B06	GL3: 10mm Heat Strengthen (GLASS CLADDING)	1089	1105	4	1.203	4.813	見GL1-F01			4
11		GL1-C01		886	2005	37	1.776	65.728	見GL1-F02	10	13	14
12		GL1-C02		1811	2005	37	3.631	134.349	見GL1-F03	10	13	14
13		GL3-A01		642.8	2005	74	1.289	95.372	見GL3-F01	20	26	28
14		GL3-A02		642.8	915	72	0.588	42.348	見GL3-F01	20	26	26
15		GL3-A03	642.8	570	2	0.366	0.733	見GL3-F01			2	
16		GL1a-A11	GL1a: 8mm Heat Strengthen + 12AIR+12mm Tempered Glass (Vision)	2164	2005	2	4.339	8.678	見GL1A-F01			2
17		GL4-A01		614	915	252	0.562	141.576	見GL4-F01	70	91	91
18		GL4-A02		1321.5	915	72	1.209	87.060	見GL4-F01	20	26	26
19		GL4-A03		1686.5	915	72	1.543	111.107	見GL4-F01	20	26	26
20		GL4-A04		1204	915	36	1.102	39.660	見GL4-F01	10	13	13
21		GL4-A08A		1864	565	2	1.053	2.106	見GL4-F01			2
22		GL4-A08		614	565	10	0.347	3.469	見GL4-F01			10
23		GL4-A09		1551.5	565	4	0.877	3.506	見GL4-F01			4
24		GL4-A10		1089	565	4	0.615	2.461	見GL4-F01			4
25		GL4-A11		2164	565	2	1.223	2.445	見GL4-F01			2
26		GL4-A12		1401.5	565	4	0.792	3.167	見GL4-F01			4
27		GL4-AA01	614	570	7	0.350	2.450	見GL4-F01			7	
28		GL4-AA02	1321.5	570	2	0.753	1.507	見GL4-F01			2	
29		GL4-AA03	1686.5	570	2	0.961	1.923	見GL4-F01			2	
30		GL4-AA04	1204	570	1	0.686	0.686	見GL4-F01			1	
31		GL4-C01	886	915	36	0.811	29.185	見GL4-F01	10	13	13	

核對用



工程號:	J-856	計算:	劉劍傑	日期:	2022.11.15	送呈:	威哥
地盤名稱:	天榮站	核對:	徐詳坤	日期:	2022.11.15	副本:	鴻仔
廠用玻璃B.M.表	項目類別:	T1座(管樓屋頂)	批准:	林仁安	日期:	2022.11.15	
BM編號:	A/C Code:-	A 2022.12.19	數量:	1782	計玻璃面積 (平方米)	1756.417	

序號	修改標示	顏色與名稱	厚度(mm)	玻璃尺寸			面積(平方米)		備註			
				寬度(mm)	高度(mm)	數量(塊)	單件	總面積	M01	M02	M03	
32		GL4-C02		1811	915	36	1.657	59.654	見GL4-F01	10	13	13
33		GL4-CC01		886	570	1	0.505	0.505	見GL4-F01			1
34		GL4-CC02		1811	570	1	1.032	1.032	見GL4-F01			1
35		GL5-A02		1045	122	4	0.127	0.510	見GL5-F01			4
36		GL5-A01		570	122	269	0.070	18.706	見GL5-F01	70	91	108
				總合計:			1782		1756.42			

加工注意事項:

- 1). 本表中所有玻璃對角線尺寸偏差要求不超過正負2mm.
- 2). 本表中所有玻璃要求粗磨邊處理並倒棱角.
- 3). 本表中玻璃要求粗磨邊處理並倒棱角, 欄河玻璃頂底要精磨邊, 而所有玻璃之入爐方向需保持一致。
- 4). 本表中不同種類玻璃參照玻璃加工圖加工。
- 5). 本表中所有強化玻璃均需HEAT SOAK TEST。
- 6). 本表中所有玻璃均需注明室內外面及其玻璃編號, 以便識別。

核對用

核對用

工程號:	J-856	計算:	劉察	日期:	2022.11.15	送呈:	威哥
地盤名稱:	天榮站	核對:	徐詳坤	日期:	2022.11.15	副本:	鴻仔

廠用玻璃B.M.表	項目類別:	T2座(啓樓屋頂)	批准:	林仁安	日期:	2022.11.15	
B.M.編號:	A/C Code:-	A 2022.12.19	數量:	1706	計玻璃面積 (平方米)	1686.014	

序號	修改標示	顏色與名稱	厚度(mm)	玻璃尺寸		數量(塊)	面積(平方米)		備註				
				寬度(mm)	高度(mm)		單件	總面積	M01	M02	M03		
1		GL1-A01	30.00	614	840	231	0.516	119.141	見GL1-F01	60	78	93	
2		GL1-A02		1321.5	2005	74	2.650	196.071	見GL1-F01	20	26	28	
3		GL1-A03		1686.5	2005	74	3.381	250.226	見GL1-F01	20	26	28	
4		GL1-B01A		614	1405	1	0.863	0.863	見GL1-F01			1	
5		GL1-A08		1864	2005	2	3.737	7.475	見GL1-F01			2	
6		GL1-A09		1551.5	2005	4	3.111	12.443	見GL1-F01			4	
7		GL1-A10		1089	840	4	0.915	3.659	見GL1-F01			4	
8		GL1-A12		1401.5	2005	2	2.810	5.620	見GL1-F01			2	
9		GL1-B01		614	1105	230	0.678	156.048	見GL1-F01	60	78	92	
10		GL1-B06		1089	1105	4	1.203	4.813	見GL1-F01			4	
11		GL1-B02	661	1105	37	0.730	27.025	見GL1-F02	10	13	14		
12		GL1-B03	661	1105	37	0.730	27.025	見GL1-F03	10	13	14		
13		GL1-B03A	661	1405	1	0.929	0.929	見GL1-F03			1		
14		GL1-C03	661	840	37	0.555	20.544	見GL1-F02	10	13	14		
15		GL1-C04	1911	2005	37	3.832	141.768	見GL1-F03	10	13	14		
16		GL1-C05	1911	2005	37	3.832	141.768	見GL1-F02	10	13	14		
17		GL1-C06	661	840	38	0.555	21.099	見GL1-F03	10	13	15		
18		GL1A-C05A	1911	2305	1	4.405	4.405	見GL1A-F02			1		
19		GL1a-A11	GL1a: 8mm Heat Strengthen + 12AIR+12mm Tempered Glass(Vision)		32.00	2164	2005	2	4.339	8.678	見GL1A-F01		2
20		GL4-A01	12mm	614	915	216	0.562	121.351	見GL4-F01	60	78	78	
21		GL4-A02		1321.5	915	72	1.209	87.060	見GL4-F01	20	26	26	
22		GL4-A03		1686.5	915	72	1.543	111.107	見GL4-F01	20	26	26	
23		GL4-A08A		1864	565	2	1.053	2.106	見GL4-F01			2	
24		GL4-A08		614	565	8	0.347	2.775	見GL4-F01			8	
25		GL4-A09		1551.5	565	4	0.877	3.506	見GL4-F01			4	
26		GL4-A10		1089	565	4	0.615	2.461	見GL4-F01			4	
27		GL4-A11		2164	565	2	1.223	2.445	見GL4-F01			2	
28		GL4-A12		1401.5	565	2	0.792	1.584	見GL4-F01			2	
29		GL4-AC01		614	945	1	0.580	0.580	見GL4-F01			1	
30		GL4-AA01		614	570	5	0.350	1.750	見GL4-F01			5	
31		GL4-AA02	GL4: 12mm Heat Strengthen Tempered		32.00	1321.5	570	2	0.753	1.507	見GL4-F01		2



工程號:	J-856	計算:	劉傑	日期:	2022.11.15	送呈:	威哥
地盤名稱:	天榮站	核對:	徐詳坤	日期:	2022.11.15	副本:	鴻仔
項目類別:	T2座(塔樓/屋頂)	批准:	林仁安	日期:	2022.11.15		
廠用玻璃B.M.表		數量:	1706	計玻璃面積 (平方米)	1686.014		
BM編號:	A/C Code:-						

序號	修改標示	顏色與名稱	厚度(mm)	玻璃尺寸		數量 (塊)	面積(平方米)		備註			
				寬度(mm)	高度(mm)		單件	總面積	M01	M02	M03	
32		GL4-AA03	12.00	1686.5	570	2	0.961	1.923	見GL4-F01			2
33		GL4-AB01		614	565	1	0.347	0.347	見GL4-F01			1
34		GL4-C03		661	915	36	0.605	21.773	見GL4-F01			13
35		GL4-C04		1911	915	36	1.749	62.948	見GL4-F01			13
36		GL4-C05		1911	915	36	1.749	62.948	見GL4-F01			13
37		GL4-C06		661	915	36	0.605	21.773	見GL4-F01			13
38		GL4-CB05		1911	565	1	1.080	1.080	見GL4-F01			1
39		GL4-CB06		661	565	1	0.373	0.373	見GL4-F01			1
40		GL4-CC03		661	570	1	0.377	0.377	見GL4-F01			1
41		GL4-CC04		1911	570	1	1.089	1.089	見GL4-F01			1
42		GL4-CC05		1911	945	1	1.806	1.806	見GL4-F01			1
43		GL4-CC06		661	945	1	0.625	0.625	見GL4-F01			1
44		GL5-AA02		1045	122	4	0.127	0.510	見GL5-F01			4
45		GL5-A01		570	122	231	0.070	16.064	見GL5-F01			93
46		GL5-C01		497	122	75	0.061	4.548	見GL5-F01			29
				總合計:		1706		1686.01				

1).本表中所有玻璃對角線尺寸偏差要求不超過正負2mm. 2).本表中所有玻璃要求粗磨邊處理並倒棱角. 3).本表中玻璃要求粗磨邊處理並倒棱角,攔河玻璃頂底要精磨邊,而所有玻璃之入爐方向需保持一致。 4).本表中不同種類玻璃參照玻璃加工圖加工。 5).本表中所有強化玻璃均需HEAT SOAK TEST。 6).本表中所有玻璃均需注明室內外面及其玻璃編號,以便識別。											
加工注意事項:											

核對用

	工程號:	J-856	計算:	劉燦	日期:	2022.11.15	送呈:	威哥
	地盤名稱:	天榮站	核對:	徐詳坤	日期:	2022.11.15	副本:	鴻仔

廠用玻璃B.M.表	項目類別:	T3座(塔樓屋頂)	批准:	林仁安	日期:	2022.11.15		
BM編號:	A/C Code:-	A 2022.12.19	數量:	1818	計玻璃面積 (平方米)		1573.938	

序號	修改標示	顏色與名稱	厚度(mm)	玻璃尺寸		數量(塊)	面積(平方米)		備註			
				寬度(mm)	高度(mm)		單件	總面積	M01	M02	M03	
1		GL1: 8mm Heat Strengthen + 12AIR+10mm Tempered Glass(Vision)	30.00	614	840	225	0.516	116.046	見GL1-F01	60	78	87
2				921.5	2005	37	1.848	68.361	見GL1-F01	10	13	14
3				1569	2005	37	3.146	116.396	見GL1-F01	10	13	14
4				729	2005	37	1.462	54.081	見GL1-F01	10	13	14
5				1551.5	2005	1	3.111	3.111	見GL1-F01			1
6				779	840	2	0.654	1.309	見GL1-F01			2
7				1634	2005	1	3.276	3.276	見GL1-F01			1
8				1284	2005	1	2.574	2.574	見GL1-F01			1
9				784	840	2	0.659	1.317	見GL1-F01			2
10				1361.5	2005	1	2.730	2.730	見GL1-F01			1
11		614	1105	224	0.678	151.977	見GL1-F01	60	78	86		
12		614	1405	1	0.863	0.863	見GL1-F01			1		
13		661	1105	37	0.730	27.025	見GL1-F02	10	13	14		
14		661	1405	1	0.929	0.929	見GL1-F02			1		
15		761	1105	37	0.841	31.113	見GL1-F03	10	13	14		
16		561	1105	37	0.620	22.936	見GL1-F02	10	13	14		
17		779	1105	2	0.861	1.722	見GL1-F01			2		
18		784	1105	2	0.866	1.733	見GL1-F01			2		
19		661	840	38	0.555	21.099	見GL1-F02	10	13	15		
20		1678.5	2005	37	3.365	124.520	見GL1-F02	10	13	14		
21		761	840	37	0.639	23.652	見GL1-F03	10	13	14		
22		561	840	37	0.471	17.436	見GL1-F02	10	13	14		
23		1811	2005	74	3.631	268.698	見GL1-F03	20	26	28		
24		GL1a: 8mm Heat Strengthen +	32.00	1811	2305	1	4.174	4.174	見GL1A-F02			1
25		GL4-A01		614	915	216	0.562	121.351	見GL4-F01	60	78	78
26		GL4-A05		921.5	915	36	0.843	30.354	見GL4-F01	10	13	13
27		GL4-A06		1569	915	36	1.436	51.683	見GL4-F01	10	13	13
28		GL4-A07		729	915	36	0.667	24.013	見GL4-F01	10	13	13
29		GL4-A08		614	565	2	0.347	0.694	見GL4-F01			2
30		GL4-A09		1551.5	565	1	0.877	0.877	見GL4-F01			1
31		GL4-A13		779	565	2	0.440	0.880	見GL4-F01			2
32		GL4-A14		1634	565	1	0.923	0.923	見GL4-F01			1

核對


工程號:	J-856	計算:	劉傑	日期:	2022.11.15	送呈:	威哥
地盤名稱:	天榮站	核對:	徐詳坤	日期:	2022.11.15	副本:	鴻仔

廠用玻璃B.M.表	項目類別:	T3座(塔樓屋頂)	批准:	林仁安	日期:	2022.11.15
BM編號:	A/C Code:-	A 2022.12.19	數量:	1818	計玻璃面積 (平方米)	1573.938

序號	修改標示	顏色與名稱	厚度(mm)	玻璃尺寸		數量(塊)	面積(平方米)		備註			
				寬度(mm)	高度(mm)		單件	總面積	MO1	MO2	MO3	
33		GL4-A15	12.00	1284	565	1	0.725	0.725	見GL4-F01			1
34		GL4-A16		784	565	2	0.443	0.886	見GL4-F01			2
35		GL4-A17		1361.5	565	1	0.769	0.769	見GL4-F01			1
36		GL4-AA01		614	570	5	0.350	1.750	見GL4-F01			5
37		GL4-AC01		615	945	1	0.581	0.581	見GL4-F01			1
38		GL4-AA05		921.5	570	1	0.525	0.525	見GL4-F01			1
39		GL4-AA06		1569	570	1	0.894	0.894	見GL4-F01			1
40		GL4-AA07		729	570	1	0.416	0.416	見GL4-F01			1
41		GL4-AB01		614	565	1	0.347	0.347	見GL4-F01			1
42		GL4-C03		661	915	36	0.605	21.773	見GL4-F01	10	13	13
43		GL4-C07	1678.5	915	36	1.536	55.290	見GL4-F01	10	13	13	
44		GL4-C08	761	915	36	0.696	25.067	見GL4-F01	10	13	13	
45		GL4-C09	561	915	36	0.513	18.479	見GL4-F01	10	13	13	
46		GL4-C10	1811	915	72	1.657	119.309	見GL4-F01	20	26	26	
47		GL4-CB03	661	565	1	0.373	0.373	見GL4-F01			1	
48		GL4-CB10	1811	565	1	1.023	1.023	見GL4-F01			1	
49		GL4-CF03	661	945	1	0.625	0.625	見GL4-F01			1	
50		GL4-CC07	1678.5	570	1	0.957	0.957	見GL4-F01			1	
51		GL4-CC08	761	570	1	0.434	0.434	見GL4-F01			1	
52		GL4-CC09	561	570	1	0.320	0.320	見GL4-F01			1	
53		GL4-CC10	1811	570	1	1.032	1.032	見GL4-F01			1	
54		GL4-CC10A	1811	945	1	1.711	1.711	見GL4-F01			1	
55		GL5-A03	735	122	2	0.090	0.179	見GL5-F01			2	
56		GL5-A01	570	122	225	0.070	15.647	見GL5-F01	60	78	87	
57		GL5-C01	497	122	38	0.061	2.304	見GL5-F01	10	13	15	
58		GL5-C02	597	122	37	0.073	2.695	見GL5-F01	10	13	14	
59		GL5-C03	397	122	37	0.048	1.792	見GL5-F01	10	13	14	
60		GL5-A04	740	122	2	0.090	0.181	見GL5-F01			2	
				總合計:		1818		1573.94				

- 1) 本表中所有玻璃對角線尺寸偏差要求不超過正負2mm.
- 2) 本表中所有玻璃要求粗磨邊處理並倒棱角.

核對用

		工程號:	J-856	計算:	劉) 黎	日期:	2022.11.15	送呈:	威哥
廠用玻璃 B.M.表		地盤名稱:	天榮站	核對:	徐詳坤	日期:	2022.11.15	副本:	鴻仔
BM 編號:		項目類別:	T3座(塔樓/屋頂)	批准:	林仁安	日期:	2022.11.15		
		A/C Code:-	A 2022.12.19	數量:	1818	計玻璃面積 (平方米)	1573.938		
序號	修改標示	顏色與名稱	厚度 (mm)	玻璃尺寸 寬度 (mm) 高度 (mm)	數量 (塊)	面積 (平方米) 單件 總面積	備註 MO1 MO2 MO3		

加工注意事項:

3. 本表中玻璃要求粗磨磨邊處理並倒稜角，攔河玻璃訂頁底要精磨邊，而所有玻璃之入爐方向需保持一致。
4. 本表中不同種類玻璃參照玻璃加工圖加工。
5. 本表中所有強化玻璃均需 HEAT SOAK TEST。
6. 本表中所有玻璃均需注明室內外面及其玻璃編號，以便識別。

核對 (用)
