



工程指示 / 要求簡箋 ENGINEER INSTRUCTIONS(E.I.)

工程指示編號:	EI- 6367	修改版本:	-
	HK-		
工程編號:	J 856	工程名稱:	天榮站
收件人:	林仁安 / Maggie	發件人:	Jingo
工程項目:	售樓處玻璃BM(新做) 加急	日期:	19/06/2023

<input checked="" type="checkbox"/> 原合約工程包	<input type="checkbox"/> 原合約工程加 / 減賬 QT-	<input type="checkbox"/> 新工程報價 QT-
--	--	------------------------------------

信件批核號碼/圖紙參考編號:	批核模具圖紙編號:
客戶指示附件:	管理內部批簽署:

<input type="checkbox"/> 初步鋁料 B.M.	<input type="checkbox"/> 加工拆圖, 然後生產	<input type="checkbox"/> 尺寸表
<input type="checkbox"/> 正式鋁料 B.M.	<input type="checkbox"/> 技術上資料/指示	<input type="checkbox"/> 報價
<input type="checkbox"/> 配件 B.M.	<input type="checkbox"/> 樣辦或貨品說明書	<input type="checkbox"/> 分判合約
<input type="checkbox"/> 其他:		

內容: 售樓處玻璃BM 玻璃要做強化, 不用熱浸 拆圖問題, 加急, 玻璃廠答應可以跟EI6240未出的玻璃於6月底一同出貨 Midi只供應玻璃, 東南安裝, 收貨人: 冼生9786 9202 或Markus 9661 4002, Mat 9436 0283 地: 南昌站 V Walk, 停車場限高4.5m 完成上列要求日期: 29/06/2023
--

國內



<input type="checkbox"/> 生產技術總監	<input type="checkbox"/> 連附件	<input checked="" type="checkbox"/> 技術部	<input checked="" type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 生產部	<input type="checkbox"/> 連附件
<input type="checkbox"/> 採購部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 生產統籌部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 報關組	<input type="checkbox"/> 連附件
<input type="checkbox"/> 質檢部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 會計部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 機械設計部	<input type="checkbox"/> 連附件
<input type="checkbox"/> 香港辦	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 其他:			

香港

<input type="checkbox"/> 行政部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 會計部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 統籌部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 工程部	<input type="checkbox"/> 連附件
<input checked="" type="checkbox"/> 採購部	<input checked="" type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> QS部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 地盤管理	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 維修部	<input type="checkbox"/> 連附件

*發件人簽署: Jingo	*組別成員批核簽署: 
傳遞編號:	項目經理簽署:

 美特鋁質有限公司 MIDI Aluminium Fabricator Ltd.				工程號	J856	類別		物料號	-	
修改	-	-	-	地盘	天榮站	制圖	劉燦	2022-10-18	圖號	GL1-F01
日期	-	-	-	採用工廠	✓ 地盘	图纸名称	玻璃加工图	復核	徐詳坤	2022-19-19
				材料颜色		材料	GLASS	批准	林仁安	2022-10-19
								數量	-	
								單件重量	-	(KG)

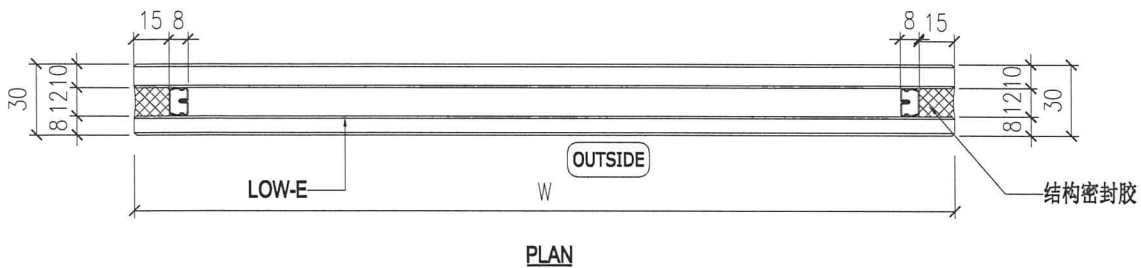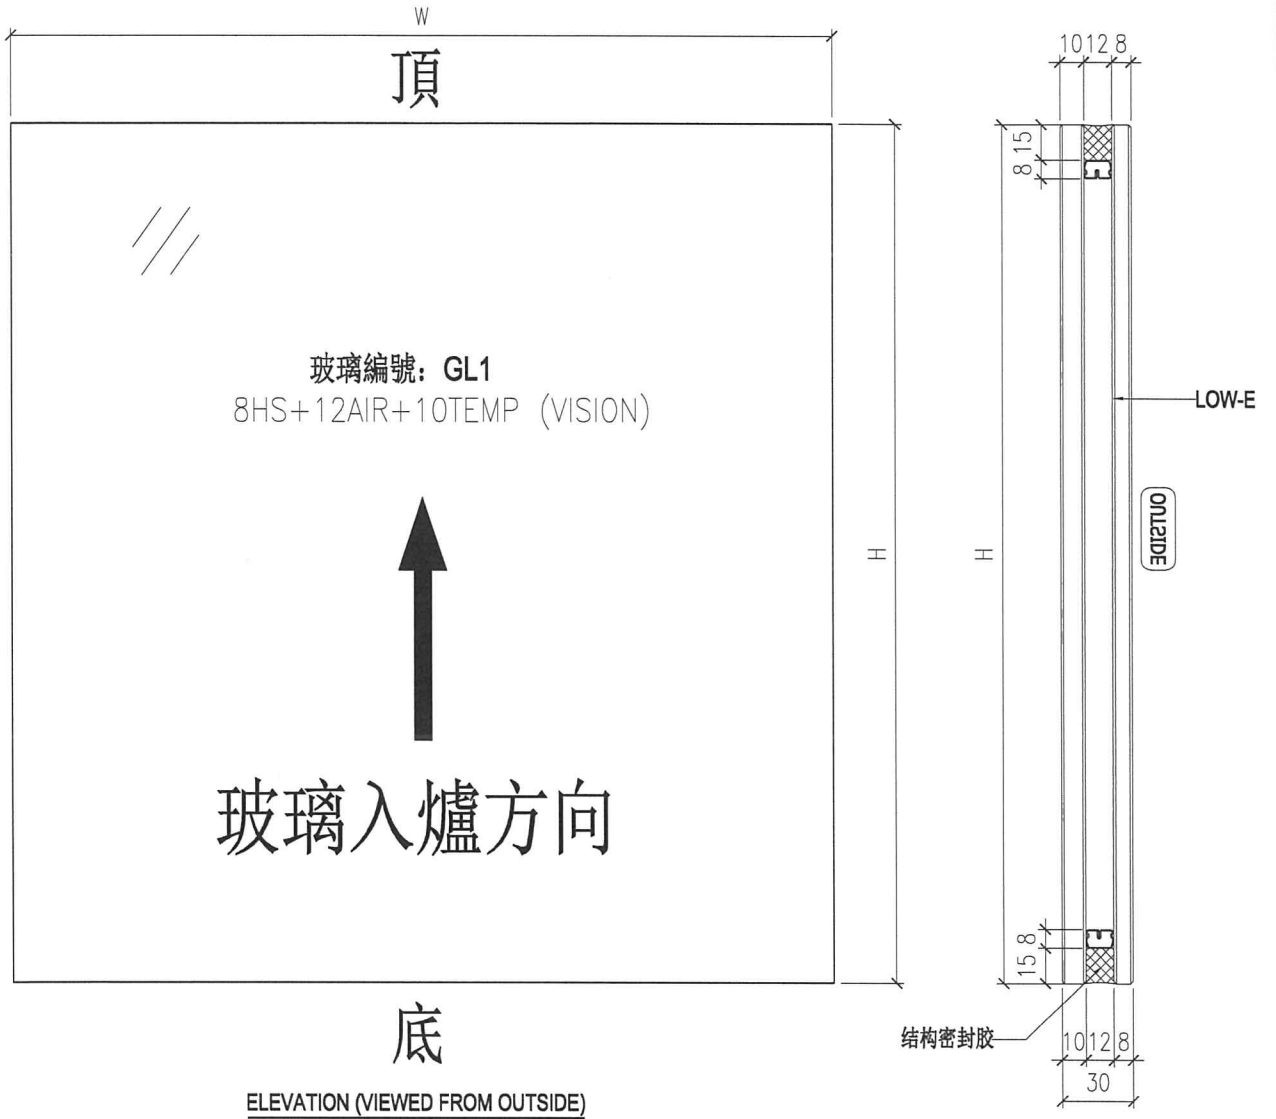

NOTES

1. ALL DIMENSION IN mm
2. ALL EDGE CHAMFER 1x1x45

	工程號:	J-856	計算:	劉燦	日期:	2023.06.19	送呈:	胡哥
	地盤名稱:	天榮站	核對:	徐詳坤	日期:	2023.05.23	副本:	
廠用玻璃B.M.表		項目類別:	售楼处	批准:	林仁安	日期:	2023.05.23	
BM編號:	A/C Code:		數量:	2	計玻璃面積(平方米)		5.299	

序號	修改標示	顏色與名稱	厚度(mm)	玻璃尺寸		數量 (塊)	面積(平方米)		備註	
				寬度(mm)	高度(mm)		單件	總面積		
1		GL1: 8mm Heat Strengthen + 12AIR+10mm Tempered Glass(Vision)LOW-E SDCE55AC#2	30.00							
2										
3										
4										
5										
6										
7	PT-GL1-P07					1321.5	2005	2	2.650	5.299
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
總合計:						2		5.299		

加工注意事項:	1). 本表中所有玻璃對角線尺寸偏差要求不超過正負2mm.
	2). 本表中所有玻璃要求粗磨邊處理並倒棱角.
	3). 本表中玻璃要求粗磨邊處理並倒棱角, 攔河玻璃頂底要精磨邊, 而所有玻璃之入爐方向需保持一致.
	4). 本表中不同種類玻璃參照玻璃加工圖加工.
	5). 本表中所有強化玻璃均需HEAT SOAK TEST.
	6). 本表中所有玻璃均需注明室內外面及其玻璃編號, 以便識別.
