



工程指示 / 要求簡箋 ENGINEER INSTRUCTIONS(E.I.)

工程指示編號:	EI- 6537	修改版本:	K
	HK- 0713/25		
工程編號:	J 856	工程名稱:	天榮站
收件人:	生統	發件人:	Charmant
工程項目:	隔音吊趟門配件BM (修改K) -修改廠用配件BM (包裝用伸拉膜)	日期:	09/09/2025

<input checked="" type="checkbox"/> 原合約工程包	<input type="checkbox"/> 原合約工程加 / 減賬 QT-	<input type="checkbox"/> 新工程報價 QT-
--	--	------------------------------------

信件批核號碼/圖紙參考編號:	批核模具圖紙編號:
客戶指示附件:	管理內部批簽署:

<input type="checkbox"/> 初步鋁料 B.M.	<input type="checkbox"/> 加工拆圖, 然後生產	<input type="checkbox"/> 尺寸表
<input type="checkbox"/> 正式鋁料 B.M.	<input type="checkbox"/> 技術上資料 / 指示	<input type="checkbox"/> 報價
<input checked="" type="checkbox"/> 配件 B.M.	<input type="checkbox"/> 樣辦或貨品說明書	<input type="checkbox"/> 分判合約
<input type="checkbox"/> 其他:		


內容: T1隔音吊趟門: -跟據廠實際包裝需求, 修改廠用配件BM : 新增: " 序號31: 透明伸拉膜 ", 補購 300M/米 x 50圈
完成上列要求日期: 05/08/2025

國內

<input type="checkbox"/> 生產技術總監	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 技術部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 生產部	<input type="checkbox"/> 連附件
<input type="checkbox"/> 採購部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input checked="" type="checkbox"/> 生產統籌部	<input checked="" type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 報關組	<input type="checkbox"/> 連附件
<input type="checkbox"/> 質檢部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 會計部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 機械設計部	<input type="checkbox"/> 連附件
<input type="checkbox"/> 香港辦	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 其他:			

香港

<input type="checkbox"/> 行政部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 會計部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 統籌部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 工程部	<input type="checkbox"/> 連附件
<input type="checkbox"/> 採購部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> QS部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 地盤管理	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 維修部	<input type="checkbox"/> 連附件

*發件人簽署 : Charmant Fok	*組別成員批核簽署 :
傳遞編號 :	項目經理簽署 : 




美特鋁質有限公司
MTD Aluminum Fabricator Ltd.

工程號:	J-856	計算:	Charmant	日期:	9日9月2025年	送呈:	胡哥
地盤名稱:	天樂站	核對:	Charmant	日期:	9日9月2025年	副本:	
項目類別:	隔音門窗-吊趟門	批准:		日期:			

A/C Code: K版09.09.25

此BM依據 EI6962A 第8版施工圖 計算

序號	修改標示	配件圖號	物料編號	配件名稱	顏色	實用	後備	總數	單位	備注
1				M4*10平頭機絲	A4-70	15155	445	15600	粒	內外框組裝用
2				M4*10平頭機絲	A4-70	4320	180	4500	粒	修L角碼
3				M5x16平頭機絲	A4-70	4320	180	4500	粒	修吊輪(收框片)
4				M8彈弓		4320	180	4500	粒	修斷橋碼
5				斷橋碼		2160	90	2250	組	組框用
6				M6x15平頭機絲	A4-70	4775	325	5100	粒	導軌于頂蓋固定
7				M5x15平頭機絲	A4-70	15700	800	16500	粒	外框橫扣料于內外框橫料固定
8				#10x16°平頭鋼牙	A4-70	4046	254	4300	粒	修企鋁折件用
9				雙面貼3.5X10粘面	黑色	3486	314	3800	米	室外面貼內框粘玻璃用
10	D取消			單面貼3.5X6粘面	黑色	3486	314	3800	米	室內面貼玻璃用
11	E修改	按現場客戶要求		雙面貼1.5X20粘面	黑色	3486	314	3800	米	貼MP535-3mm板使用
12	E修改	按現場客戶要求	底用量改用單面貼	單面貼1.5X20粘面	黑色	4358	312	4670	米	貼MP535-3mm板使用(增加底用量)
13	G修改			企身毛條7X6mm帶自粘		2650	280	2930	米	外框企打料用
14				底毛條(帶夾片)7x12mm		3122	328	3450	米	外框橫打料用(底部)
15				頂毛條(帶夾片)7x6mm		3122	328	3450	米	導軌頂蓋用J837-T08,用舊模
16			J852-G-1	頂外膠條長29.8mm		1561	139	1700	米	外框橫扣料用(頂部)室外
17				D.C.791防水膠		581	19	600	支	玻璃四周膠縫打膠(300ml)
18	J修改	材質: EPDM	硬度85±5	8x5mm厚墊塊(L=150mm)	黑色	3174	76	3250	塊	用於玻璃左/右/底部四分之一處
19				靜電膠紙	透明	9	1	10	卷	1.25Mx200M一卷



美特鋁質有限公司
MIND Aluminum Fabricator Ltd.

工程號:	J-856	計算:	Charmant	日期:	9日9月2025年	送呈:	胡哥
地盘名稱:	天榮站	核對:	Charmant	日期:	9日9月2025年	副本:	
項目類別:	隔音門窗-吊趟門	批准:		日期:			

廠用配件B.M.表

A/C Code: K版09. 09. 25


此BM依據 EI6962A 第8版施工圖 計算

序號	修改標示	配件圖號	物料編號	配件名稱	顏色	實用	後備	總數	單位	備注
20	I修改	按廠實際包裝要求		珍珠棉	白色	2100	150	2250	m ²	整幅面包裝，1圈包7副門玉
21				中空膠板	白色	475	15	490	張	趟門保護用（膠板及玻璃用）1.5m x 3m一張
22				2寸保護膠紙	白色	213	17	230	卷	20m一卷（中空膠板用）
23		建築聲學提供		20mm厚玻璃棉(寬35mm)	(套膠帶) 黃色	3456	244	3700	米	門/窗扇企橫料內框料用
24		建築聲學提供		35mm厚玻璃棉(寬80mm)	(套膠帶) 黃色	2658	242	2900	米	橫企折件隔音件用
25				M6x9平頭機絲	A4-70	4775	225	5000	粒	導軌盒子鐵件固定
26				M4x7平頭機絲	A4-70	4775	225	5000	粒	軌道盒側收20x15x3鋁角用
27		按現場客戶要求		M4x15平頭機絲	A4-70	15700	800	16500	粒	外框橫扣料于內外框橫料固定(底部)
28				M5x8圓頭機絲	A4-70	150	50	200	粒	節點DT4軌道盒側收鋁折件
29				單面貼3.5X10粘面	黑色	3486	314	3800	米	室內面貼玻璃用
30	D修改	材質: EPDM	硬度85±5	10x5mm厚墊塊 (L=150mm)	黑色	1080	40	1120	塊	用於MP535-3mm板底部四分之一处
31	*K修改	按廠實際包裝要求		透明伸拉膜300米/圈	透明	14000	1000	15000	米	300(米/圈) x 50(圈/529件=28.4米/件)

修改說明: K修改: 按廠實際包裝要求, 新增“字號31: 透明伸拉膜 300米/圈”: 補訂50圈



夏天梅花开

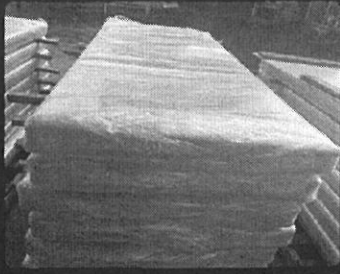

昨天 16:29



夏天梅花开

@daniel woo @畫圖仔 包装用拉伸膜没有订货，早期辉哥说有库存，到目前为止用完了，要出Bm加订！

早，梅姐叫我早上找找你，有關'伸拉膜'，請問我們要加訂多少，才夠完成隔音趟的包裝？



08:14



伸拉膜加訂 50 卷

1 卷多長？



大約 300M 長



前面还用了人家江河的，要补回给人家



很难讲的，整个吊趟都要裹住，还有胶板验好吹干净后，也要用这个膜覆盖，以免落灰！

$50 \times 300 \div 529$

28.355387523629

