



工程指示 / 要求簡箋 ENGINEER INSTRUCTIONS(E.I.)

工程指示編號:	EI- 6549	修改版本:	-
	HK- 1675,		
工程編號:	J 856	工程名稱:	TSWTL23 天榮
收件人:	生統 / Maggie / 峰少	發件人:	Thomas Wong
工程項目:	T1-T3 趙門玻璃BM表 地盤用.	日期:	26/7/2023

<input checked="" type="checkbox"/> 原合約工程包	<input type="checkbox"/> 原合約工程加 / 減賬 QT-	<input type="checkbox"/> 新工程報價 QT-
--	--	------------------------------------

信件批核號碼/圖紙參考編號:	批核模具圖紙編號:
客戶指示附件:	管理內部批簽署:

<input type="checkbox"/> 初步鋁料 B.M.	<input type="checkbox"/> 加工拆圖, 然後生產	<input type="checkbox"/> 尺寸表
<input type="checkbox"/> 正式鋁料 B.M.	<input type="checkbox"/> 技術上資料/指示	<input type="checkbox"/> 報價
<input type="checkbox"/> 配件 B.M.	<input type="checkbox"/> 樣辦或貨品說明書	<input type="checkbox"/> 分判合約
<input type="checkbox"/> 其他:		

內容: 需要做熱浸 分座分層包裝, 實際按地盤指示出貨)

T1-T3 趙門玻璃BM表

T2, T3 M01 - 大約 20/9/2023 到地盤

M02 - " 13/11/2023 "

M03 - " 27/12/2023 "

T1 M01 - 待指令才可生產

M02 - "

M03 - "

完成上列要求日期: 如上


國內

<input type="checkbox"/> 生產技術總監	<input type="checkbox"/> 連附件	<input checked="" type="checkbox"/> 技術部	<input checked="" type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 生產部	<input type="checkbox"/> 連附件
<input type="checkbox"/> 採購部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input checked="" type="checkbox"/> 生產統籌部	<input checked="" type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 報關組	<input type="checkbox"/> 連附件
<input type="checkbox"/> 質檢部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 會計部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 機械設計部	<input type="checkbox"/> 連附件
<input checked="" type="checkbox"/> 香港辦	<input checked="" type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 其他:			


香港


<input type="checkbox"/> 行政部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 會計部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 統籌部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 工程部	<input type="checkbox"/> 連附件
<input type="checkbox"/> 採購部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> QS部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 地盤管理	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 維修部	<input type="checkbox"/> 連附件


*發件人簽署:	峰	*組別成員批核簽署:	J T
傳遞編號:		項目經理簽署:	

 美特鋁質有限公司 MIDI Aluminium Fabricator Ltd.		工程號: J-856 地盤名稱: 天榮站 項目類別: T1座 趟門玻璃 總計玻璃面積 (平方米): 1630.40	計算: 陳日強 核對: 劉庚軍/叶俊峰 批准: 日期:	日期: 26/7/2023 日期: 26/7/2023 日期:	送呈: 副本: 此BM依據 施工圖資料計算初步BM A/C Code:							
地盘用玻璃B.M.表		楼层数量分布										
序號	修改標示	厚度(mm)	顏色與名稱(類別)	玻璃尺寸		數量 (塊)	總面積 (平方米)	玻璃編號	備註	MO1	MO2	MO3
				寬度(mm)	高度(mm)					1-17/F	18-30/F	31-45/F
1				738.5	2131	600	944.25		用在AW-01 趟門	200	192	208
2				696	2131	74	109.76			24	24	26
3		28	8mm THK. CLEAR HS GLASS+12AIR GAP+8mm THK. CLEAR TP GLASS	781	2131	74	123.16	EGL-1A	用在AW-05 趟門	24	24	26
4				775.5	2131	144	237.97			44	48	52
5				701.5	2131	144	215.27		用在AW-05a 趟門	44	48	52
6												
7												
8												
9												
10												
11												
12												
13												
14												
15												
16						小計:	1036	1630.40				
17	加工說明:											
18	1).本表中所有玻璃對角線尺寸偏差要求不超過正負2mm											
19	2).本表中所有玻璃除特別注明需倒角精磨邊處理外,其余均要求料											
20	3).本表中所有強化玻璃均需做HEAT STAK TEST,但不需強化標誌											
21	4).本表中所有玻璃成品均需注明其玻璃種類、玻璃編號及其尺寸											
22	5).本表中所有玻璃之入爐方向均需以寬度方向進入											


美特鋁質有限公司 MIDI Aluminium Fabricator Ltd.		工程號: J-856	計算: 陳日強	日期: 26/7/2023	送呈:	樓層數量分布					
地盤名稱: 天榮站 <td>核對: 劉天軍\叶俊峰 <td>日期: 26/7/2023 <td>副本: <td colspan="4"></td> </td></td></td>		核對: 劉天軍\叶俊峰 <td>日期: 26/7/2023 <td>副本: <td colspan="4"></td> </td></td>	日期: 26/7/2023 <td>副本: <td colspan="4"></td> </td>	副本: <td colspan="4"></td>							
地盤用玻璃B.M.表 <td>項目類別: T2座 趟門玻璃 <td>批准: <td colspan="5">此BM依據 施工圖資料計算初步BM</td> </td></td>		項目類別: T2座 趟門玻璃 <td>批准: <td colspan="5">此BM依據 施工圖資料計算初步BM</td> </td>	批准: <td colspan="5">此BM依據 施工圖資料計算初步BM</td>	此BM依據 施工圖資料計算初步BM							
BM編號: <td>總計玻璃面積 (平方米): 1611.51 <td>C Code: <td colspan="5"></td> </td></td>		總計玻璃面積 (平方米): 1611.51 <td>C Code: <td colspan="5"></td> </td>	C Code: <td colspan="5"></td>								
序號	修改標示	厚度(mm)	玻璃尺寸		數量 (塊)	總面積 (平方米)	玻璃編號	備註	MO1	MO2	MO3
			寬度(mm)	高度(mm)							
1			738.5	2131	878	1381.75		用在AW-01 趟門	1-17/F	18-30/F	31-45/F
2		28	696	2131	73	108.27	EGL-1A	用在AW-05 趟門	278	288	312
3			781	2131	73	121.49			23	24	26
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
16			小計:		1024	1611.51					
17	加工說明:										
18	1). 本表中所有玻璃對角線尺寸偏差要求不超過正負2mm										
19	所有玻璃除特別注明需倒檢角精磨邊處理外, 其余均要求粗磨邊處理										
20	3). 本表中所有強化玻璃均需做HEAT SIAK TEST, 但不需強化標誌										
21	4). 本表中所有玻璃成品均需注明其玻璃種類、玻璃編號及其尺寸										
22	5). 本表中所有玻璃之入爐方向均需以寬度方向進入										

		美特鋁質有限公司 MIDI Aluminium Fabricator Ltd.		工程號: J-856	計算: 陳日強	日期: 26/7/2023	送呈:	樓層數量分布					
地盤名稱: 天榮站		項目類別: T3座 趟門玻璃		核對: 劉庚翠, 叶俊峰	日期: 26/7/2023	副本:							
地盤用玻璃B.M.表		總計玻璃面積 (平方米): 2662.77		批准:	日期:	此BM依據 施工圖資料計算初步BM							
BM編號:		顏色與名稱(類別)		玻璃尺寸		玻璃編號					備註		
序號	修改標示	厚度(mm)	顏色與名稱(類別)	寬度(mm)	高度(mm)	數量 (塊)	總面積 (平方米)	MO1	MO2	MO3			
1		28	8mm THK. CLEAR HS	738.5	2131	1328	2089.93	1-17/F	18-30/F	31-45/F			
2			GLASS+12AIR GAP+8mm	696	2131	182	269.94	428	432	468			
3			THK. CLEAR TP GLASS	781	2131	182	302.90	57	60	65			
4								57	60	65			
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16				小計:		1692	2662.77						
17	加工說明:												
18	1).本表中所有玻璃對角線尺寸偏差要求不超過正負2mm												
19	2).本表中所有玻璃除特別注明需倒角精磨邊處理外,其餘均要求精												
20	3).本表中所有強化玻璃均需做HEAT STAK TEST,但不需強化標誌												
21	4).本表中所有玻璃成品均需注明其玻璃種類、玻璃編號及其尺寸												
22	5).本表中所有玻璃之入爐方向均需以寬度方向進入												

 美特鋁質 有限公司 MIDI Aluminium Fabricator Ltd.				類別		物料號	
修改				制圖	黃瓊玉	2023.02.24	圖號 ECL-1A
日期				復核	謝永林	2023.02.25	數量 見BOM表
				批准			位置 見BOM表

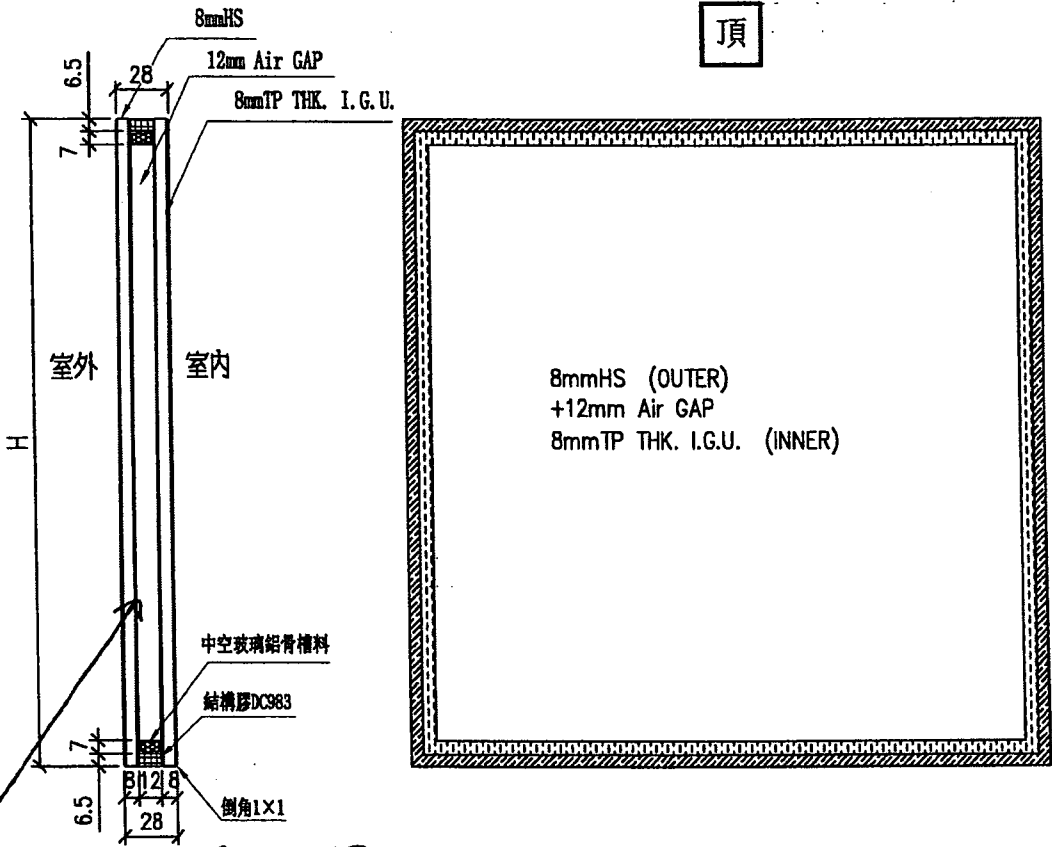

Low-e at #2:SDCE-55T



工程號	J-856	地盤	天水圍天樂站	附 件
名稱	玻璃加工	起門玻璃		
材料		地盤	√	
顏色	8mmHS+12mm AIR GAP+8mmTP THK. I.G.U.	工廠		
