



工程指示 / 要求簡箋 ENGINEER INSTRUCTIONS(E.I.)

工程指示編號:	EI-6690	修改版本:	-
	HK-1950		
工程編號:	J 856	工程名稱:	TSWTL23 天榮
收件人:	生統/ Maggie	發件人:	Jingo
工程項目:	後裝窗膠條 (確認大手生產波膠) 地盤更換波膠	日期:	30/08/2023

<input checked="" type="checkbox"/> 原合約工程包	<input type="checkbox"/> 原合約工程加 / 減脹 QT-	<input type="checkbox"/> 新工程報價 QT-
--	--	------------------------------------

信件批核號碼/圖紙參考編號:	批核模具圖紙編號:
客戶指示附件:	管理內部批簽署:

<input type="checkbox"/> 初步鋁料 B.M.	<input type="checkbox"/> 加工拆圖, 然後生產	<input type="checkbox"/> 尺寸表
<input type="checkbox"/> 正式鋁料 B.M.	<input type="checkbox"/> 技術上資料/指示	<input type="checkbox"/> 報價
<input type="checkbox"/> 配件 B.M.	<input type="checkbox"/> 樣辦或貨品說明書	<input type="checkbox"/> 分判合約
<input type="checkbox"/> 其他:		

內容: 按新鴻基29/8/2023同意使用EI6488 新款波膠, 可以大手生產供地盤更換用, 請按以下資料安排採購、生產 榮基圖號 2091-856-WiH-S61 A版 T2, T3合共需16,000米 第一批: 即時採購4000米 第二批: 30/9/2023 採購餘數12,000米 附件供參考
完成上列要求日期: 06/09/2023

國內

<input type="checkbox"/> 生產技術總監	<input type="checkbox"/> 連附件	<input checked="" type="checkbox"/> 技術部	<input checked="" type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 生產部	<input type="checkbox"/> 連附件
<input type="checkbox"/> 採購部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input checked="" type="checkbox"/> 生產統籌部	<input checked="" type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 報關組	<input type="checkbox"/> 連附件
<input type="checkbox"/> 質檢部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 會計部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 機械設計部	<input type="checkbox"/> 連附件
<input type="checkbox"/> 香港辦	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 其他:			


香港

<input type="checkbox"/> 行政部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 會計部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input checked="" type="checkbox"/> 統籌部	<input checked="" type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 工程部	<input type="checkbox"/> 連附件
<input checked="" type="checkbox"/> 採購部	<input checked="" type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> QS部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input checked="" type="checkbox"/> 地盤管理	<input checked="" type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 維修部	<input type="checkbox"/> 連附件

*發件人簽署: Jingo	*組別成員批核簽署:
傳遞編號:	項目經理簽署:

LINEAR DENSITY 0.032 ±5%Kg/m AREA 25.58 mm² WEIGHT ±5%Kg/pcs VOLUME cm³ VERSION A

铝材槽口较小，此胶条较难压进铝材，请客户下单试装。

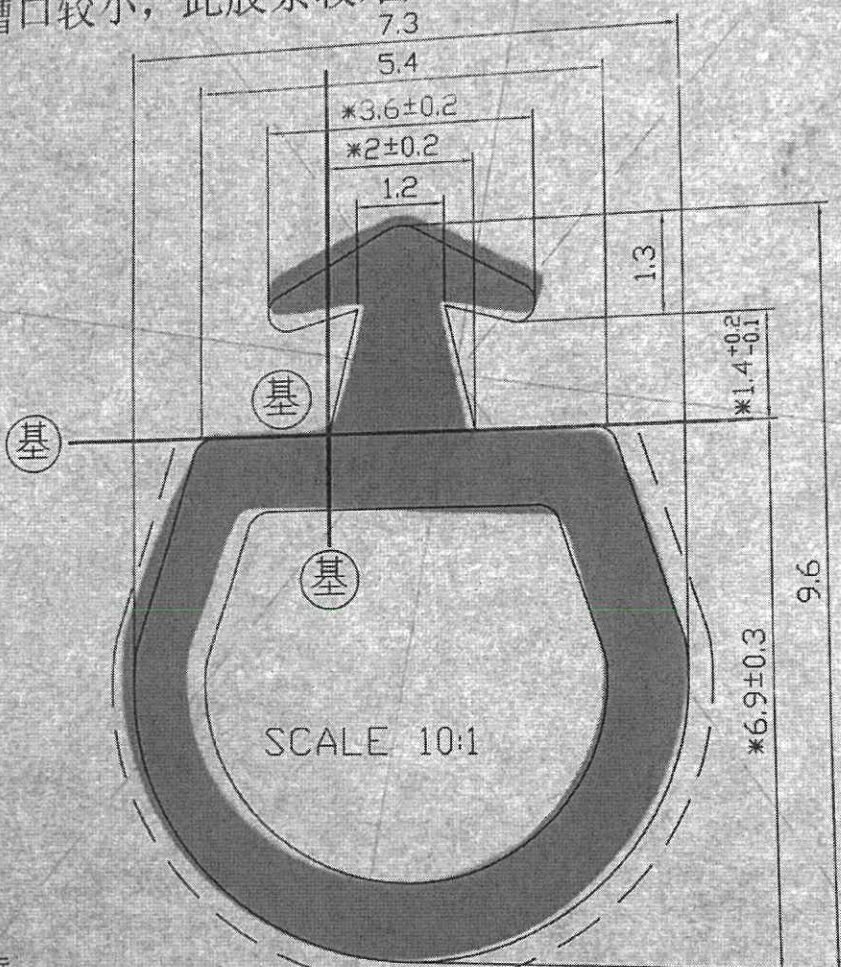

杂质颗粒及气泡等缺陷：
表面光洁度Ra=0.1，
密封胶条激光打码技术规范》执行。

RECORD		SIZE TOLERANCE		USER NO.	APPROVED & DATE
DESIGN	DATE	RANGE	TOLERANCE	2091-856-WIH-S61	
		0-1.5	±0.15	KIND NO.	PROOFREADING & DATE
		1.5-2.5	±0.20	MOULD&RACK NO.	CHECKED & DATE
		2.5-4.0	±0.25	192G01	梁弘业 2023/07/18
		4.0-6.3	±0.35	MATERIAL	DESIGN&DRAWN & DATE
		6.3-10	±0.40	MVQ(Silicone)	000
		10-16	±0.50	HARDNESS	Tracking & DATE
		16-25	±0.70	65'±5'	苏志君 2023/07/14
		25-40	±0.80		
		40-63	±1.00		
		63-100	±1.30		
		ABOVE 100	±1.50		

PROJECT

PRC. TEL +
HK TEL +
Http://www

參考用

天榮站- 膠條更換生窗

	日期	20230830	
生窗尺寸: 590 * 1180			
膠條約數 570 x 1160 x 窗玉及窗框	6.92 每窗玉連框		
	7M		
	T2	T3	數量
需更換窗數	888	1396	2284
	T2	T3	
後裝窗 (數量)	6	9	
需更換層數 27F下 (層數)	20	20	
需使用膠條 (7M/雙窗)	840	1260	
	T2	T3	
佛沙窗(數量)	24	38	
需更換層數 39F下 (層數)	32	32	
需使用膠條 (7M/雙窗)	5376	8512	
	T2 及 T3 需用	6216	9772
	合共需訂購	15988	
