



工程指示 / 要求簡箋 ENGINEER INSTRUCTIONS(E.I.)

工程指示編號:	EI- 6913 .	修改版本:	-
	HK- 2479		
工程編號:	J 856	工程名稱:	TSWTL23 天榮
收件人:	生統/林仁安/Maggie姐	發件人:	Thomas Wong
工程項目:	T3 SU層補玻璃BM表 廠用	日期:	27/10/2023

<input checked="" type="checkbox"/> 原合約工程包	<input type="checkbox"/> 原合約工程加 / 減賬 QT-	<input type="checkbox"/> 新工程報價 QT-
--	--	------------------------------------

信件批核號碼/圖紙參考編號:	批核模具圖紙編號:
客戶指示附件:	管理內部批簽署:

<input type="checkbox"/> 初步鋁料 B.M.	<input type="checkbox"/> 加工拆圖, 然後生產	<input type="checkbox"/> 尺寸表
<input type="checkbox"/> 正式鋁料 B.M.	<input type="checkbox"/> 技術上資料/指示	<input type="checkbox"/> 報價
<input type="checkbox"/> 配件 B.M.	<input type="checkbox"/> 樣辦或貨品說明書	<input type="checkbox"/> 分判合約
<input type="checkbox"/> 其他:		

內容: T3 SU層補玻璃BM表 拆圖漏單 請即安排生產及熱浸
完成上列要求日期: 01/11/2023

國內



<input type="checkbox"/> 生產技術總監	<input type="checkbox"/> 連附件	<input checked="" type="checkbox"/> 技術部	<input checked="" type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 生產部	<input type="checkbox"/> 連附件
<input type="checkbox"/> 採購部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input checked="" type="checkbox"/> 生產統籌部	<input checked="" type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 報關組	<input type="checkbox"/> 連附件
<input type="checkbox"/> 質檢部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 會計部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 機械設計部	<input type="checkbox"/> 連附件
<input type="checkbox"/> 香港辦	<input type="checkbox"/> 連附件	<input checked="" type="checkbox"/> 其他: 林仁安			

香港

<input type="checkbox"/> 行政部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 會計部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 統籌部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 工程部	<input type="checkbox"/> 連附件
<input checked="" type="checkbox"/> 採購部	<input checked="" type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> QS部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 地盤管理	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 維修部	<input type="checkbox"/> 連附件

*發件人簽署: 瑋	*組別成員批核簽署: J
傳遞編號:	項目經理簽署:

 美特鋁質有限公司 MIDI Aluminium Fabricator Ltd.				工程號	J856	類別		物料號	-		
修改	-	-	採用工廠	✓	地盤	制圖	劉燦	2022-10-18	圖號	GL1A-F01	
日期	-	-	材料颜色			復核	徐詳坤	2022-19-19	數量	-	
					图纸名称	玻璃加工图	批准	林仁安	2022-10-19	單件重量	- (KG)
					材料	GLASS					

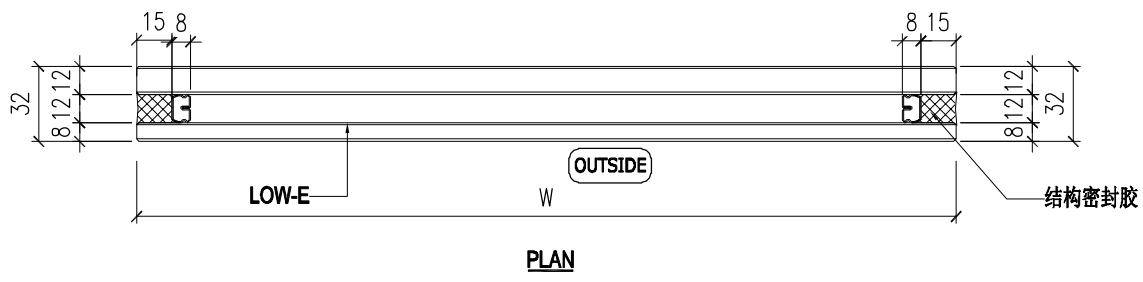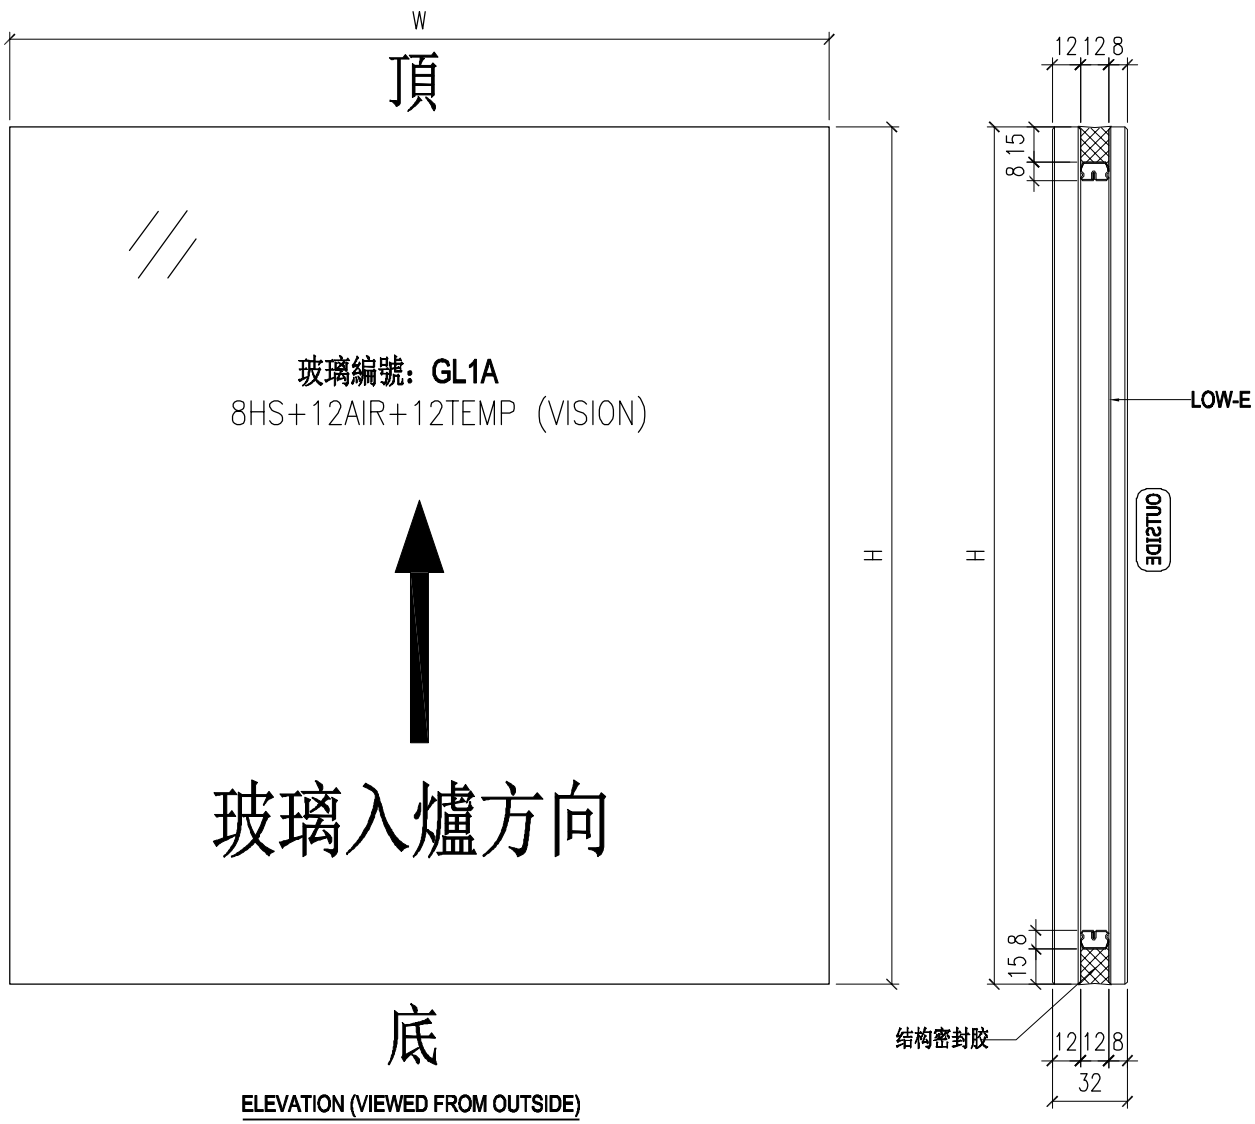

NOTES

1. ALL DIMENSION IN mm
2. ALL EDGE CHAMFER 1x1x45

	工程號:	J-856	計算:	劉燦	日期:	2023.10.27	送呈:	胡哥
	地盤名稱:	天榮站	核對:	徐詳坤	日期:	2023.10.27	副本:	
廠用玻璃B.M表		項目類別:	T3座(屋頂SU)	批准:	林仁安	日期:	2023.10.27	
BM編號:	A/C Code: -		數量:	1	計玻璃面積(平方米)	4.339		

序號	修改標示	顏色與名稱	厚度(mm)	玻璃尺寸		數量(塊)	面積(平方米)		備註			
				寬度(mm)	高度(mm)		單件	總面積	M01	M02	M03	
1		GL1a-A11	32.00	2164	2005	1	4.339	4.339	見GL1A-F01			1
2												
3												
4												
5												
6												
7												
8												
9												
24												
51												
52												
53												
54												
55												
56												
57												
58												
59												
60												
61												
						總合計:	1		4.34			

加工注意事項:	1). 本表中所有玻璃對角線尺寸偏差要求不超過正負2mm.
	2). 本表中所有玻璃要求粗磨邊處理並倒棱角.
	3). 本表中玻璃要求粗磨邊處理並倒棱角, 攔河玻璃頂底要精磨邊, 而所有玻璃之入爐方向需保持一致.
	4). 本表中不同種類玻璃參照玻璃加工圖加工.
	5). 本表中所有強化玻璃均需HEAT SOAK TEST.
	6). 本表中所有玻璃均需注明室內外面及其玻璃編號, 以便識別.
