

以此份數量為準



工程指示 / 要求簡箋 ENGINEER INSTRUCTIONS(E.I.)

工程指示編號:	EI- 6976	修改版本:	-
	HK- 2796		
工程編號:	J 856	工程名稱:	天榮站
收件人:	生統/ Maggie	發件人:	Jingo
工程項目:	隔音門窗-T3, T1吊趟門(大貨)玻璃拆圖 (窗和近帶牆部份齊了)	日期:	30/11/2023

<input checked="" type="checkbox"/> 原合約工程包	<input type="checkbox"/> 原合約工程加 / 減賬 QT-	<input type="checkbox"/> 新工程報價 QT-
--	--	------------------------------------

信件批核號碼/圖紙參考編號:	批核模具圖紙編號:
客戶指示附件:	管理內部批簽署:

<input type="checkbox"/> 初步鋁料 B.M.	<input type="checkbox"/> 加工拆圖, 然後生產	<input type="checkbox"/> 尺寸表
<input type="checkbox"/> 正式鋁料 B.M.	<input type="checkbox"/> 技術上資料/指示	<input type="checkbox"/> 報價
<input type="checkbox"/> 配件 B.M.	<input type="checkbox"/> 樣辦或貨品說明書	<input type="checkbox"/> 分判合約
<input type="checkbox"/> 其他:		

內容: T3 優先, 2023年12月中 T1 2024年4後 需要看熱浸, 新鴻基COW, T1 (100%) 分座包裝 (標準層要分層包裝, 看附件) 貨到地盤實際時間需與地盤打理確認 Alan 92767955 以此份數量為準
完成上列要求日期: 15/12/2023

國內

<input type="checkbox"/> 生產技術總監	<input type="checkbox"/> 連附件	<input checked="" type="checkbox"/> 技術部	<input checked="" type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 生產部	<input type="checkbox"/> 連附件
<input type="checkbox"/> 採購部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input checked="" type="checkbox"/> 生產統籌部	<input checked="" type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 報關組	<input type="checkbox"/> 連附件
<input type="checkbox"/> 質檢部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 會計部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 機械設計部	<input type="checkbox"/> 連附件
<input type="checkbox"/> 香港辦	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 其他:			

香港

<input type="checkbox"/> 行政部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 會計部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 統籌部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 工程部	<input type="checkbox"/> 連附件
<input checked="" type="checkbox"/> 採購部	<input checked="" type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> QS部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input checked="" type="checkbox"/> 地盤管理	<input checked="" type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 維修部	<input type="checkbox"/> 連附件

*發件人簽署: Jingo	*組別成員批核簽署: fip
傳遞編號:	項目經理簽署:


窗仔

美特鋁質 MIDI Aluminium Fabricator Ltd.		工程號: J-856	計算: 劉龍浩	日期: 2023.11.09	送呈: 胡哥	註明: 計算參考數值/ 所屬位置分格							
廠用玻璃B.M.表		地盤名稱: 天水圍天榮站	核對: 謝永林	日期: 2023.11.11	副本:								
修改版次:		項目類別: 隔音門窗(大貨)	批准:	A/C Code: 正式版									
		總計玻璃面積(平方米): 993.809			此BIM依據EI6962第八版計算								
序號	玻璃編號	顏色與類型/加工圖參考	厚度 (mm)	玻璃尺寸		數量 (塊)	總面積 (平方米)	使用樓層	使用位置	分座	分格寬度	分格高度	使用窗號
				寬度(W mm)	高度(H mm)								
1	L-GY05a	8mm全鋼化清片(L-GY)	8	1254	2211.5	37	102.576	3/F-45/F	A8-LJV	T1座	1298	2263.5	AW-A-05a
2	L-GY05a(1)	8mm全鋼化清片(L-GY)	8	1303	2211.5	38	109.534	3/F-46/F	A5-LJV	T1座	1347	2263.5	AW-A-05a
3	L-GY05a(1)	8mm全鋼化清片(L-GY)	8	1303	2211.5	37	106.651	3/F-45/F	A7-LJV	T1座	1347	2263.5	AW-A-05a
4	L-GY05a(1)	8mm全鋼化清片(L-GY)	8	1303	2211.5	38	109.534	3/F-46/F	B6-LJV	T1座	1347	2263.5	AW-A-05a
5	L-GY02bR	8mm全鋼化清片(L-GY)	8	671	1646.5	7	7.734	6/F-12/F	A8-BR3	T1座	715	1698.5	AW-A-02bR
6	L-GY02bR	8mm全鋼化清片(L-GY)	8	671	1646.5	20	22.096	3/F-26/F	A8-BR2	T1座	715	1698.5	AW-A-02bR
7	L-GY02b	8mm全鋼化清片(L-GY)	8	671	1646.5	38	41.982	3/F-46/F	A5-BR2	T1座	715	1698.5	AW-A-02b
8	L-GY02b	8mm全鋼化清片(L-GY)	8	671	1646.5	37	40.878	3/F-45/F	A7-BR2	T1座	715	1698.5	AW-A-02b
9	L-GY02b	8mm全鋼化清片(L-GY)	8	671	1646.5	38	41.982	3/F-46/F	B6-BR2	T1座	715	1698.5	AW-A-02b
10	L-GY4ai	8mm全鋼化清片(L-GY)	8	786	1661.5	38	49.626	3/F-46/F	B5-MBR	T1座	830	1713.5	AW-A-04ai
11	L-GY4c	8mm全鋼化清片(L-GY)	8	771	1646.5	38	48.239	3/F-46/F	A5-MBR	T1座	815	1698.5	AW-A-04c
12	L-GY4c	8mm全鋼化清片(L-GY)	8	771	1646.5	37	46.970	3/F-45/F	A6-MBR	T1座	815	1698.5	AW-A-04c
13	L-GY4c	8mm全鋼化清片(L-GY)	8	771	1646.5	37	46.970	3/F-45/F	A7-MBR	T1座	815	1698.5	AW-A-04c
14	L-GY05	8mm全鋼化清片(L-GY)	8	1176	2211.5	37	96.227	3/F-45/F	A6-LJV	T1座	1220	2263.5	AW-A-05
15	L-GY05	8mm全鋼化清片(L-GY)	8	1176	2211.5	38	98.828	3/F-46/F	B5-LJV	T1座	1220	2263.5	AW-A-05
				合計:		515	969.826						
以下為 T3座													
1	L-GY02a	8mm全鋼化清片(L-GY)	8	671	1646.5	9	9.942	5/F-15/F	B10-BR2	T3座	715	1698.5	AW-A-02a
2	L-GY02a	8mm全鋼化清片(L-GY)	8	671	1646.5	8	8.837	5/F-12/F	B1-BR2	T3座	715	1698.5	AW-A-02aR
3	L-GY05(1)	8mm全鋼化清片(L-GY)	8	1177	2211.5	2	5.204	7/F-8/F	B11-LJV	T3座	1221	2263.5	AW-A-05
				合計:		19	23.982						
加工注意													
事項/玻璃													
類型/描													
述:													
1).本表中玻璃採用8mm全鋼化清片													
2).本表中所有玻璃對角線尺寸偏差要求不超過負2mm。													
3).本表中玻璃要求粗磨邊處理並倒棱角,欄河玻璃頂底要精磨邊,而所有玻璃之入爐方向需保持一致。													
4).本表中所有玻璃成品均需做雙面保護,(室內做靜電膠紙-離邊25mm)。													
5).本表中所有玻璃成品均需注明室內外及其玻璃編號/使用位置/樓層,以便識別。													



美特鋁質有限公司
MIDI Aluminium Fabricator Ltd.

類別		物料號	
制圖	劉龍浩	2023.11.09	圖號 L-GY
修改			
日期			
復核	謝永林	2023.11.11	數量 見BOM表
批准			位置 見BOM表

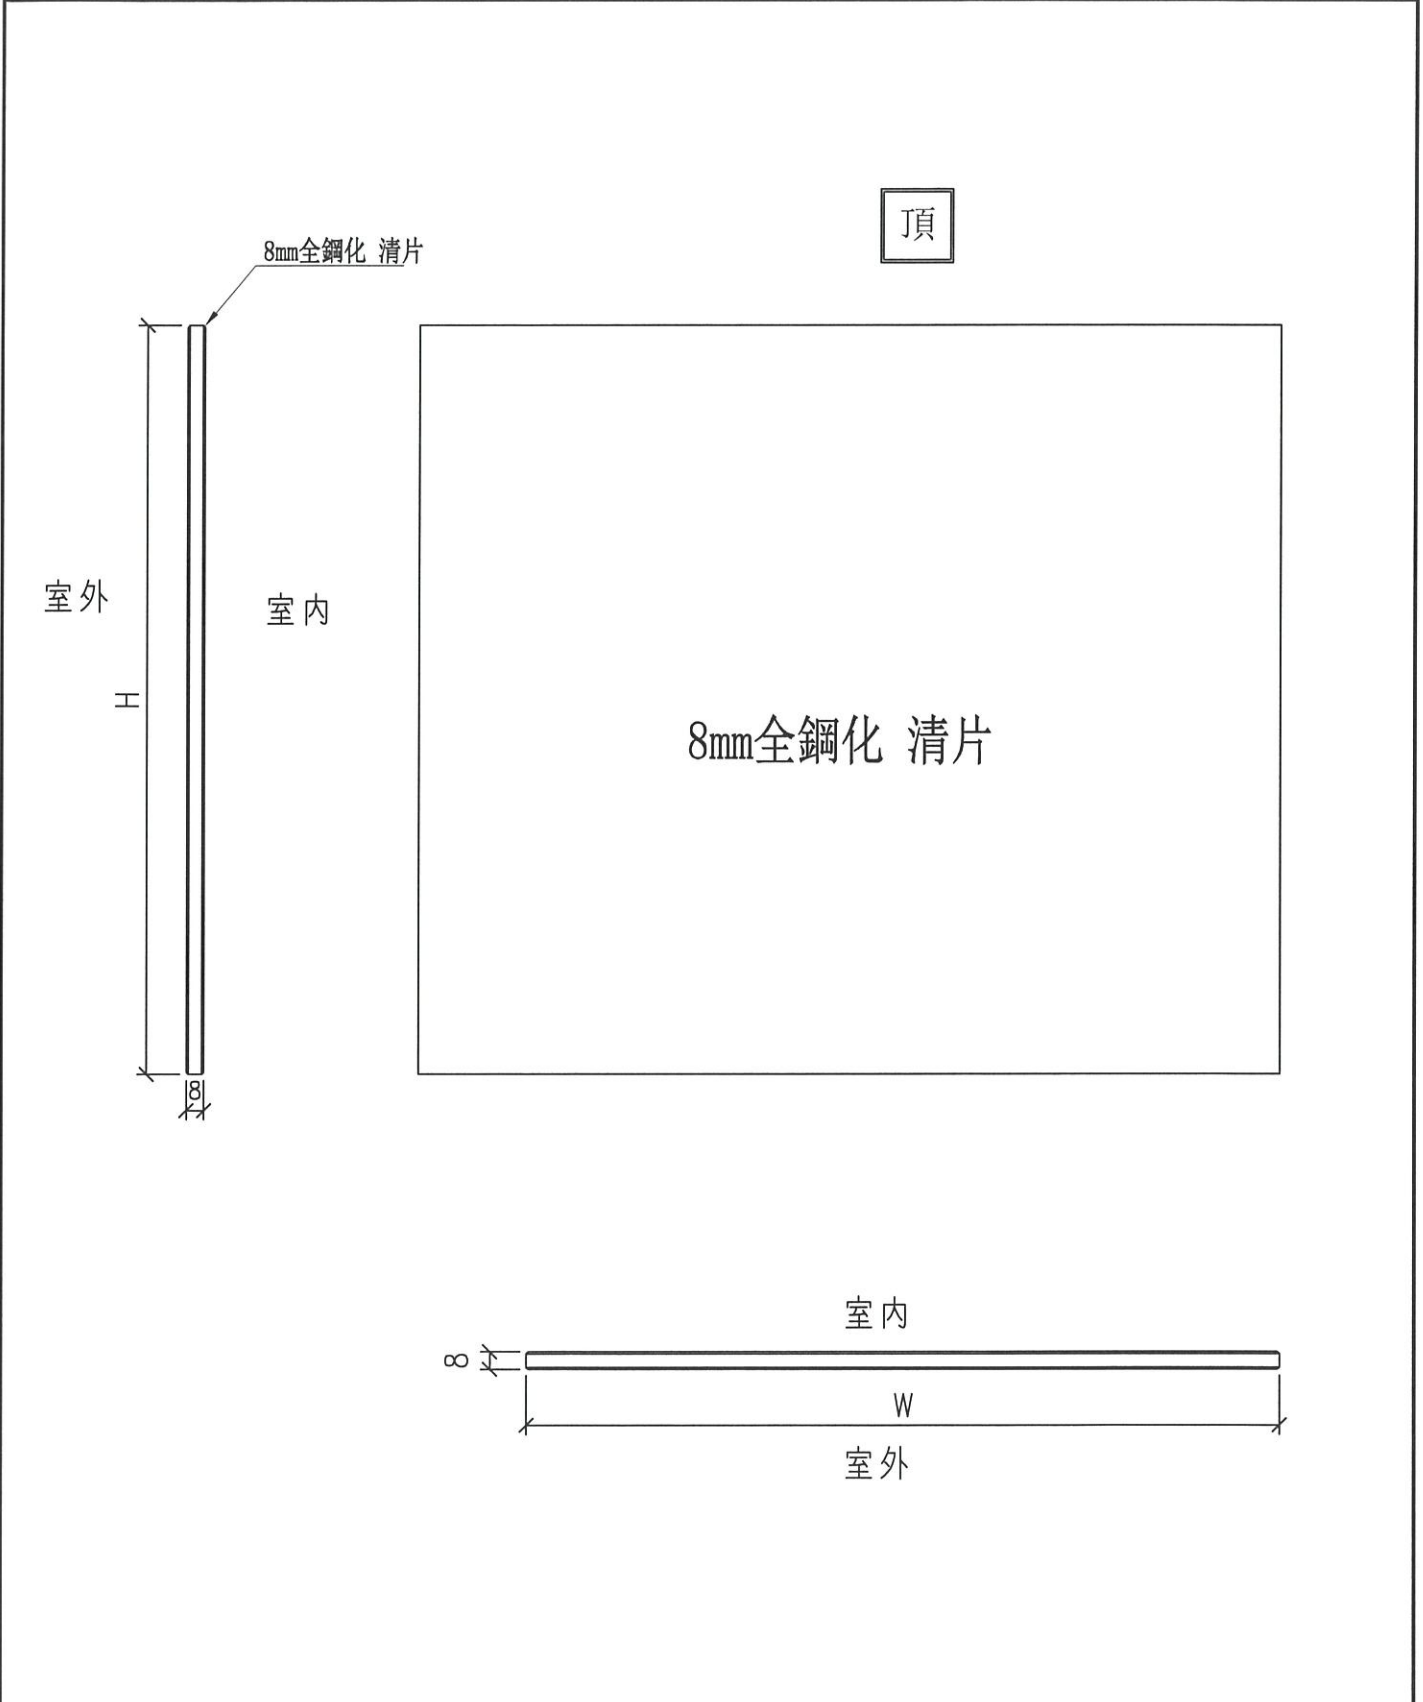


工程號	J-856	地盤	天水圍天榮站	附件
名稱	玻璃加工圖 (8mm全鋼化 清片)		採用	
材料		地盤	√	
顏色	8mm全鋼化 清片	工廠		



美特鋁質 MIDI Aluminium Fabricator Ltd.		工程號: J-856	計算: 方強	日期: 2023.11.13	送呈: 胡哥	註明: 計算參考數值/ 所屬位置分格							
廠用玻璃B.M.表		地盤名稱: 天水圍天榮站	核對: 謝永林	日期: 2023.11.13	副本:								
修改版次:		項目類別: 隔音門窗(大貨)	批准:	A/C Code: 參考數									
		總計玻璃面積(平方米): 993.809			此BM依據E16962第八版計算								
序號	玻璃編號	顏色與類型/加工圖參考	厚度 (mm)	玻璃尺寸		數量 (塊)	總面積 (平方米)	使用樓層	使用位置	分座	分格寬度	分格高度	使用窗號
				寬度 (W mm)	高度 (H mm)								
1	L-GY05a	8mm全鋼化清片(L-GY)	8	1254	2211.5	37	102.576	3/F-45/F	A8-L1V	T1座	1298	2263.5	AW-A-05a
2	L-GY05a(1)	8mm全鋼化清片(L-GY)	8	1303	2211.5	38	109.534	3/F-46/F	A5-L1V	T1座	1347	2263.5	AW-A-05a
3	L-GY02bR	8mm全鋼化清片(L-GY)	8	671	1646.5	7	7.734	6/F-12/F	A8-BR3	T1座	715	1698.5	AW-A-02bR
						20	22.096	3/F-26/F	A8-BR2				
4	L-GY02b	8mm全鋼化清片(L-GY)	8	671	1646.5	38	41.982	3/F-46/F	A5-BR2	T1座	715	1698.5	AW-A-02b
						37	40.878	3/F-45/F	A7-BR2				
5	L-GY4ai	8mm全鋼化清片(L-GY)	8	786	1661.5	38	41.982	3/F-46/F	B6-BR2	T1座	830	1713.5	AW-A-04ai
						38	48.239	3/F-46/F	A5-MBR				
6	L-GY4c	8mm全鋼化清片(L-GY)	8	771	1646.5	37	46.970	3/F-45/F	A6-MBR	T1座	815	1698.5	AW-A-04c
						37	46.970	3/F-45/F	A7-MBR				
7	L-GY05	8mm全鋼化清片(L-GY)	8	1176	2211.5	37	96.227	3/F-45/F	A6-L1V	T1座	1220	2263.5	AW-A-05
						38	98.828	3/F-46/F	B5-L1V				
				合計:		515	969.826						
以下為 T3座													
1	L-GY02a	8mm全鋼化清片(L-GY)	8	671	1646.5	9	9.942	5/F-15/F	B10-BR2	T3座	715	1698.5	AW-A-02a
						8	8.837	5/F-12/F	B1-BR2				AW-A-02aR
2	L-GY05(1)	8mm全鋼化清片(L-GY)	8	1177	2211.5	2	5.204	7/F-8/F	B11-L1V	T3座	1221	2263.5	AW-A-05
						合計:	23.982						
加工注意													
1).本表中玻璃采用8mm全鋼化清片													
2).本表中所有玻璃對角線尺寸偏差要求不超過負2mm。													
3).本表中玻璃要求粗磨邊處理並倒稜角，欄河玻璃頂底要精磨邊，而所有玻璃之入爐方向需保持一致。													
4).本表中所有玻璃成品均需做雙面保護，(室內做靜電膠紙-離邊25mm)。													
5).本表中所有玻璃成品均需注明室內外及其玻璃編號/使用位置/樓層，以便識別。													
類型描述:													

5/7

近幕牆部份

 美特鋁質 MIDI Aluminium Fabricator Ltd. 廠用玻璃B.M.表		工程號: I-856 地盤名稱: 天水圍天榮站 項目類別: CW-隔音屏 修改版次:	計算: 林仁安 核對: 批准:	日期: 2023.09.06 日期: 2023.09.06 總計玻璃面積 (平方米): 48.135	送呈: 胡哥 副本: A/C Code:	註明: 計算正式數值/ 所屬位置分格							
序號	修改內容	玻璃編號	顏色與類型/加工圖參考	厚度 (mm)	玻璃尺寸		數量 (塊)	總面積 (平方米)	使用樓層	使用位置	分屬類型	分格寬度	分格高度
					寬度 (W mm)	高度 (H mm)							
1		CW-GY01	8mm鋼化單片(L-GY) 全清片	8	966	1916.5	26	48.135	5~20F/3~17F	CW-T1/T3	隔音門	1010	2005.0
2										T1/14件 (T3/12件)			
3													
					合計:		26	48.135					
加工注意事項 / 玻璃類型描述: 1). 本表中玻璃採用8mm鋼化單片 2). 本表中所有玻璃對角線尺寸偏差要求不超過負2mm。 3). 本表中玻璃要求粗磨邊處理並倒棱角, 攔河玻璃頂底要精磨邊, 而所有玻璃之入爐方向需保持一致。 4). 本表中所有玻璃成品均需做雙面保護, (室內做靜電膠紙-離邊25mm)。 5). 本表中所有玻璃成品均需注明室內外及其玻璃編號/使用位置/樓層, 以便識別。													

 美特鋁質有限公司 MIDI Aluminium Fabricator Ltd.				工程號 J856 地盘 天榮站	類別 制圖 劉燦	物料號 - 2022-10-18	圖號 CW-GY1
修改 - 日期 -	採用工廠 <input checked="" type="checkbox"/>	地盤	图纸名称 玻璃加工图	復核 徐詳坤	2022-10-19	數量 -	單件重量 - (KG)
材料颜色	材料 GLASS	批准 林仁安	2023-09-06				

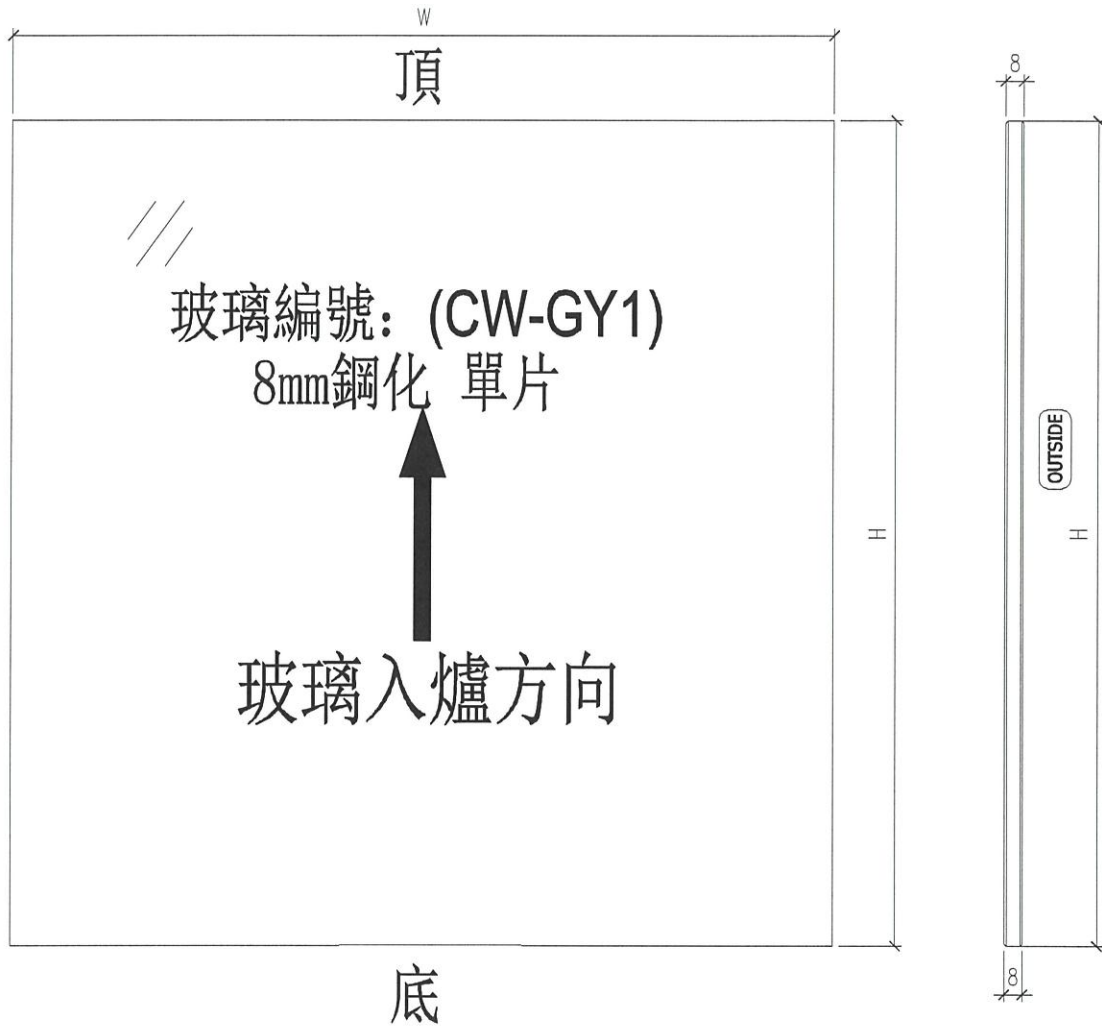

NOTES

1. ALL DIMENSION IN mm
2. ALL EDGE CHAMFER 1x1x45
