



工程指示 / 要求簡箋 ENGINEER INSTRUCTIONS(E.I.)

工程指示編號:	EI- 895	修改版本:	-
	HK- 1369		
工程編號:	J 856	工程名稱:	天榮站
收件人:	生統/Maggie/林仁安	發件人:	Iris
工程項目:	T1幕牆玻璃補單	日期:	24/07/2024

<input checked="" type="checkbox"/> 原合約工程包	<input type="checkbox"/> 原合約工程加 / 減脹 QT-	<input type="checkbox"/> 新工程報價 QT-
--	--	------------------------------------

信件批核號碼/圖紙參考編號:	批核模具圖紙編號:
客戶指示附件:	管理內部批簽署:

<input type="checkbox"/> 初步鋁料 B.M.	<input type="checkbox"/> 加工拆圖, 然後生產	<input type="checkbox"/> 尺寸表
<input type="checkbox"/> 正式鋁料 B.M.	<input type="checkbox"/> 技術上資料 / 指示	<input type="checkbox"/> 報價
<input type="checkbox"/> 配件 B.M.	<input type="checkbox"/> 樣辦或貨品說明書	<input type="checkbox"/> 分判合約
<input type="checkbox"/> 其他:		

內容: T1幕牆玻璃補單
由於2023年12月已經送貨到工廠, 現發現起彩虹點, 需重訂 (急) (原EI5364)
半強化 29/7/2024 前送廠
完成上列要求日期: 29/7/2024

國內

<input type="checkbox"/> 生產技術總監	<input type="checkbox"/> 連附件	<input checked="" type="checkbox"/> 技術部	<input checked="" type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 生產部	<input type="checkbox"/> 連附件
<input type="checkbox"/> 採購部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input checked="" type="checkbox"/> 生產統籌部	<input checked="" type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 報關組	<input type="checkbox"/> 連附件
<input type="checkbox"/> 質檢部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 會計部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 機械設計部	<input type="checkbox"/> 連附件
<input type="checkbox"/> 香港辦	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 其他:			

香港

<input type="checkbox"/> 行政部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 會計部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 統籌部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 工程部	<input type="checkbox"/> 連附件
<input checked="" type="checkbox"/> 採購部	<input checked="" type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> QS部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input checked="" type="checkbox"/> 地盤管理	<input checked="" type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 維修部	<input type="checkbox"/> 連附件



*發件人簽署: Iris	*組別成員批核簽署:
傳遞編號:	項目經理簽署:

原 E15364

GL4-F01

序號	修改標示	玻璃编号	顏色與名稱	厚度(mm)	玻璃尺寸		數量 (塊)	座 數	优先 数量
					寬度(mm)	高度(mm)			
18		GL4-A01	GL4: 12mm Heat Strengthen Tempered Glass(SPANDREL)	12.00	614	915	252	T1	16
19		GL4-A02			1321.5	915	72	T1	8
20		GL4-A03			1686.5	915	72	T1	8
21	B改尺寸	GL4-AA04			1454	915	36	T1	
5364H	原寬1834	GL4-A08A			1772	565	2	T1	
23	H增加數量	GL4-A08			614	565	11	T1	
24	B加數量	GL4-A09			1551.5	565	5	T1	
5364H	原寬849	GL4-A10			818	565	4	T1	
26		GL4-A11			2164	565	2	T1	
27	B改尺寸	GL4-A12			1371.5	565	3	T1	
5364H	原寬1934	GL4-A13			1284	565	1	T1	
28		GL4-AA01			614	570	7	T1	
29		GL4-AA02			1321.5	570	2	T1	
30		GL4-AA03			1686.5	570	2	T1	
31	E修改尺寸	GL4-AA04			1454	570	1	T1	
32	F修改塗膠	GL4-C01			886	915	36	T1	
33	F修改塗膠	GL4-C02	1811	915	36	T1			
34	F修改塗膠	GL4-CC01	886	570	1	T1			
35	F修改塗膠	GL4-CC02	1811	570	1	T1			
36	B新增	GL4-A100	1934	565	1	T1			
加工注意事項：			1).本表中所有玻璃對角線尺寸偏差要求不超過正負2mm. 2).本表中所有玻璃要求粗磨邊處理並倒棱角。 3).本表中玻璃要求粗磨邊處理並倒棱角，攔河玻璃頂底要精磨邊，而所有玻璃之入爐方向需保持一致。 4).本表中不同種類玻璃參照玻璃加工圖加工。 5).本表中所有強化玻璃均需HEAT SOAK TEST。 6).本表中所有玻璃均需注明室內外面及其玻璃編號，以便識別。						

 美特鋁質有限公司 MIDI Aluminium Fabricator Ltd.				工程號 J856 地盘 天榮站	類別 制圖 劉燦	物料號 - 2022-10-18	圖號 GLA-F01
修改 - 日期 -	採用工廠 <input checked="" type="checkbox"/>	地盤 <input type="checkbox"/>	图纸名称 玻璃加工图	復核 徐詳坤	2022-10-19	數量 -	單件重量 - (KG)
材料颜色			材料 GLASS	批准 林仁安	2022-10-19		

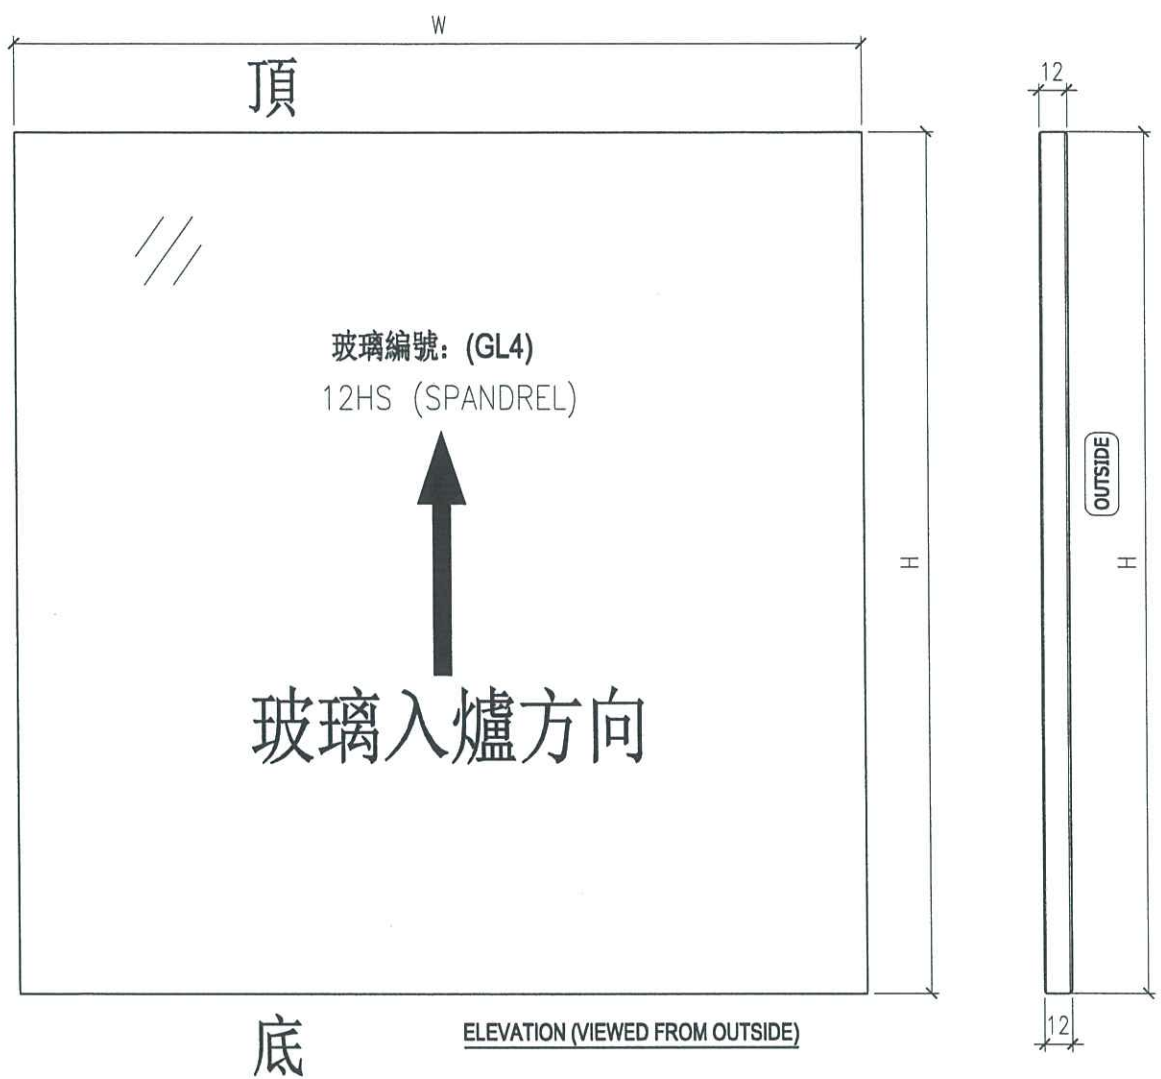

NOTES
 1. ALL DIMENSION IN mm
 2. ALL EDGE CHAMFER 1x1x45
