

工程指示 / 要求簡箋 ENGINEER INSTRUCTIONS(E.I.)

工程指示編號:	EI- 8523A	修改版本:	A
	HK- 2020		
工程編號:	J 856	工程名稱:	天榮站
收件人:	生統/Maggie	發件人:	Iris
工程項目:	T1幕牆玻璃補單(45F,SU層) 增加數量 (A版本)	日期:	08/11/2024

<input checked="" type="checkbox"/> 原合約工程包	<input type="checkbox"/> 原合約工程加 / 減賬 QT-	<input type="checkbox"/> 新工程報價 QT-
--	--	------------------------------------

信件批核號碼/圖紙參考編號:	批核模具圖紙編號:
客戶指示附件:	管理內部批簽署:

<input type="checkbox"/> 初步鋁料 B.M.	<input type="checkbox"/> 加工拆圖, 然後生產	<input type="checkbox"/> 尺寸表
<input type="checkbox"/> 正式鋁料 B.M.	<input type="checkbox"/> 技術上資料/指示	<input type="checkbox"/> 報價
<input type="checkbox"/> 配件 B.M.	<input type="checkbox"/> 樣辦或貨品說明書	<input type="checkbox"/> 分判合約
<input type="checkbox"/> 其他:		

內容:
原EI5364於2022年12月做好,2023年12月送到工廠,2024年7月開始細裝時發現玻璃表面出現大面積彩虹印,固玻璃需重訂,現訂45/F,SU層數量,Total:43件

(半強化玻璃)

A版本: GL4-A08 增加1件

完成上列要求日期: 15/11/2024

國內

<input type="checkbox"/> 生產技術總監	<input type="checkbox"/> 連附件	<input checked="" type="checkbox"/> 技術部	<input checked="" type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 生產部	<input type="checkbox"/> 連附件
<input type="checkbox"/> 採購部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input checked="" type="checkbox"/> 生產統籌部	<input checked="" type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 報關組	<input type="checkbox"/> 連附件
<input type="checkbox"/> 質檢部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 會計部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 機械設計部	<input type="checkbox"/> 連附件
<input type="checkbox"/> 香港辦	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 其他:			

香港

<input type="checkbox"/> 行政部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 會計部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 統籌部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 工程部	<input type="checkbox"/> 連附件
<input checked="" type="checkbox"/> 採購部	<input checked="" type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> QS部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input checked="" type="checkbox"/> 地盤管理	<input checked="" type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 維修部	<input type="checkbox"/> 連附件



*發件人簽署: Iris	*組別成員批核簽署:
傳遞編號:	項目經理簽署:  8/11/24

廠用玻璃B.M.表		工程號:	J-856	計算:	劉傑	日期:	2022.11.15	送呈:	威哥			
BM編號:		地盤名稱:	天榮站	核對:	徐詳坤	日期:	2022.11.15	副本: 鴻仔				
		項目類別:	T1座(塔樓/屋頂)	批准:	林仁安	日期:	2022.11.15					
		A/C Code:-	I 2023.08.09	數量:	1787	總計玻璃面積 (平方米)		1788.787				
序號	修改標示	顏色與名稱	厚度(mm)	玻璃尺寸		數量 (塊)	面積(平方米)		備註			
				寬度(mm)	高度(mm)		單件	總面積	M01	M02	M03	
1		GL1-A01		614	840	269	0.516	138.739	見GL1-F01	70	91	108
2		GL1-A02		1321.5	2005	74	2.650	196.071	見GL1-F01	20	26	28
3		GL1-A03		1686.5	2005	74	3.381	250.226	見GL1-F01	20	26	28
4	B改尺寸	GL1-A04		1454	2005	37	2.915	107.865	見GL1-F01	10	13	14
5	E改尺寸	GL1-A08		1772	2005	2	3.553	7.106	見GL1-F01			2
6	B加數量	GL1-A09		1551.5	2005	5	3.111	15.584	見GL1-F01			4
7	E改尺寸	GL1-A10	30.00	818	840	4	0.687	2.748	見GL1-F01			4
8	B改尺寸	GL1-A12		1371.5	2005	3	2.750	8.250	見GL1-F01			4
9	E改尺寸	GL1-A13		1284	2005	1	2.574	2.574	見GL1-F01			1
10		GL1-B01		614	1105	269	0.678	182.508	見GL1-F01	70	91	108
11		GL1-B06		818	1105	4	0.904	3.616	見GL1-F01			4
12		GL1-C01		886	2005	37	1.776	65.728	見GL1-F02	10	13	14
13		GL1-C02		1811	2005	37	3.631	134.349	見GL1-F03	10	13	14
14	B新增	GL1-A100		1934	2005	1	3.878	3.878	見GL1-F01			1
15		GL3-A01		642.8	2005	74	1.289	95.372	見GL3-F01	20	26	28
16		GL3-A02	10.00	642.8	915	72	0.588	42.348	見GL3-F01	20	26	26
17		GL3-A03		642.8	570	2	0.366	0.733	見GL3-F01			2
18		GL1a-A11		2164	2005	2	4.339	8.678	見GL1A-F01			2
19		GL4-A01		614	915	252	0.562	141.576	見GL4-F01	70	91	91
20		GL4-A02		1321.5	915	72	1.209	87.060	見GL4-F01	20	26	26
21		GL4-A03		1686.5	915	72	1.543	111.107	見GL4-F01	20	26	26
22	B改尺寸	GL4-A04		1454	915	36	1.330	47.895	見GL4-F01	10	13	13
23		GL4-A08A		1772	565	2	1.001	2.002	見GL4-F01			2
24		GL4-A08		614	565	5	0.347	3.816	見GL4-F01			10
25	B加數量	GL4-A09		1551.5	565	5	0.877	4.383	見GL4-F01			4
26		GL4-A10		818	565	4	0.462	1.849	見GL4-F01			4
27		GL4-A11		2164	565	2	1.223	2.445	見GL4-F01			2
28	B改尺寸	GL4-A12	12.00	1371.5	565	3	0.775	2.325	見GL4-F01			4
29		GL4-A13		1284	565	1	0.725	0.725	見GL4-F01			1
30		GL4-AA01		614	570	7	0.350	2.450	見GL4-F01			7
31		GL4-AA02		1321.5	570	2	0.753	1.507	見GL4-F01			2

218523

		工程號: J-856	計算: 劉傑	日期: 2022.11.15	送呈: 威哥					
地盤名稱: 天榮站		核對: 徐詳坤	日期: 2022.11.15	副本: 鴻仔						
項目類別: T1座(塔樓/屋頂)		批准: 林仁安	日期: 2022.11.15							
A/C Code:- I 2023.08.09		數量: 1787	總計玻璃面積 (平方米)		1788.787					
BM編號:										
序號	修改標示	顏色與名稱	玻璃尺寸		面積(平方米)		備註			
			厚度(mm)	高度(mm)	單件	總面積	M01	M02	M03	
32		GL4: 12mm Heat Strengthen Tempered Glass (SPANDREL)	1686.5	570	2	0.961	1.923	見GL4-F01		2
33	E修改尺寸	GL4: 12mm Heat Strengthen Tempered Glass (SPANDREL)	1454	570	1	0.829	0.829	見GL4-F01		1
34	F修改塗膠	GL4-C01	886	915	36	0.811	29.185	見GL4-F01F	10	13
35	F修改塗膠	GL4-C02	1811	915	36	1.657	59.654	見GL4-F01F	10	13
36	F修改塗膠	GL4-CC01	886	570	1	0.505	0.505	見GL4-F01F		1
37	F修改塗膠	GL4-CC02	1811	570	1	1.032	1.032	見GL4-F01F		1
38	B新增	GL4-A100	1934	565	1	1.093	1.093	見GL4-F01		1
39		GL5-A02	774	122	4	0.094	0.378	見GL5-F01		4
40		GL5-A01	570	122	269	0.070	18.706	見GL5-F01	70	91
總計:					1787		1788.79			
<p>1. 本表中所有玻璃對角線尺寸偏差要求不超過正負2mm。</p> <p>2. 本表中所有玻璃要求粗磨邊處理並倒棱角。</p> <p>3. 本表中玻璃要求粗磨邊處理並倒棱角，欄河玻璃頂底要精磨邊，而所有玻璃之人爐方向需保持一致。</p> <p>4. 本表中不同種類玻璃參照玻璃加工圖加工。</p> <p>5. 本表中所有強化玻璃均需HEAT SOAK TEST。</p> <p>6. 本表中所有玻璃均需注明室內外面及其玻璃編號，以便識別。</p>										
<p>加工注意事項:</p>										



 美特鋁質有限公司 MIDI Aluminium Fabricator Ltd.				工程號 J856 地盘 天榮站	類別 制圖 劉煥 復核 徐詳坤 批准 林仁安	物料號 - 2022-10-18 2022-10-19 2022-10-19	圖號 GL4-F01 數量 - 單件重量 - (KG)
修改 - 日期 -	採用工廠 <input checked="" type="checkbox"/> 地盤 材料顏色	圖紙名稱 玻璃加工圖 材料 GLASS					

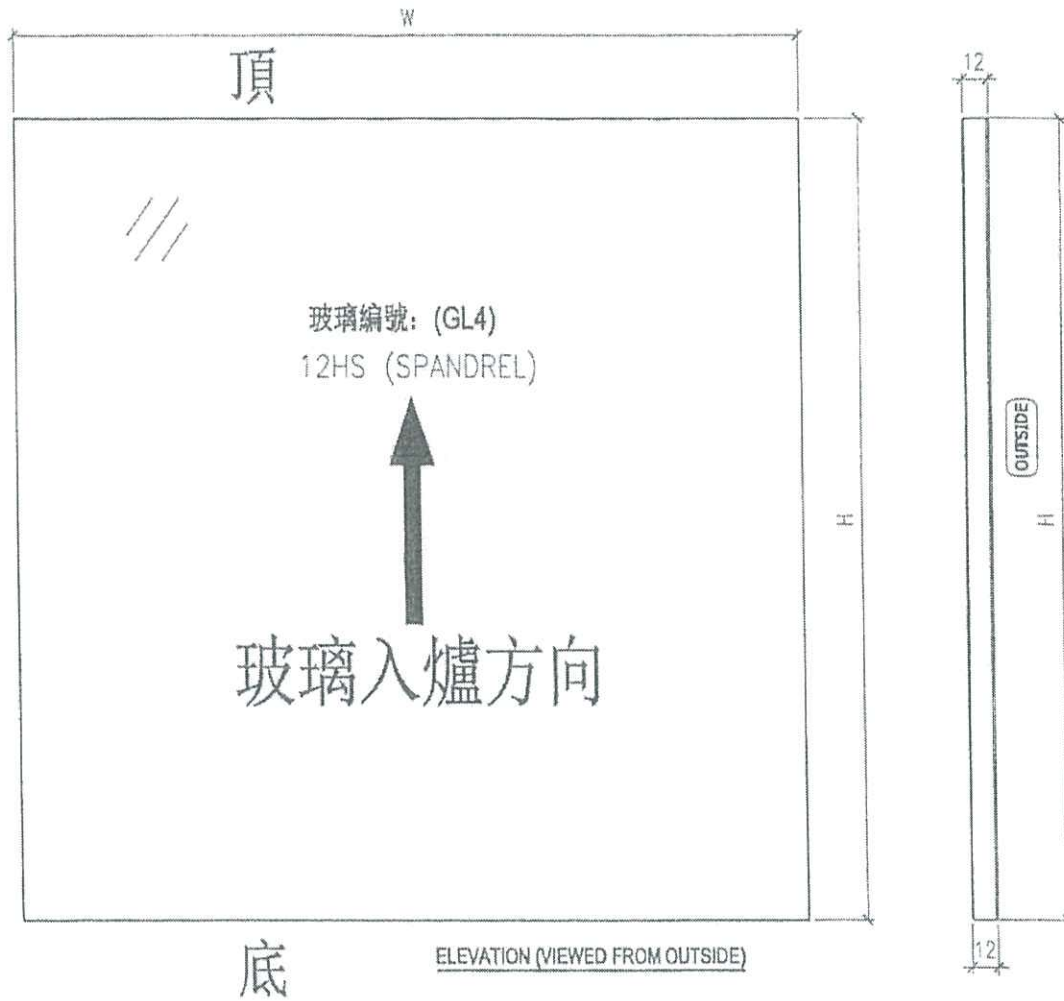

NOTES

1. ALL DIMENSION IN mm
2. ALL EDGE CHAMFER 1x1x45

 美特鋁質有限公司 MIDI Aluminium Fabricator Ltd.				工程號 J856	類別 制圖 劉燦	物料號 2022-10-18	-	
				地盘 天榮站	復核 徐詳坤	2022-10-19	圖號 GL4-F01F	數量 -
修改 日期	-	-	-	採用工廠 <input checked="" type="checkbox"/> 地盤	图纸名称 玻璃加工图	批准 林仁安	2022-10-19	單件重量 - (KG)
				材料 GLASS				

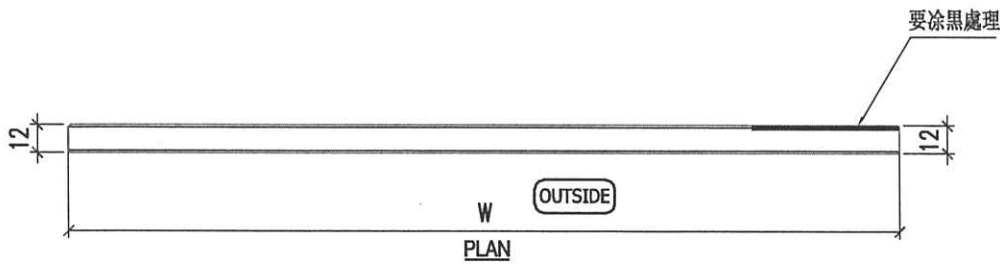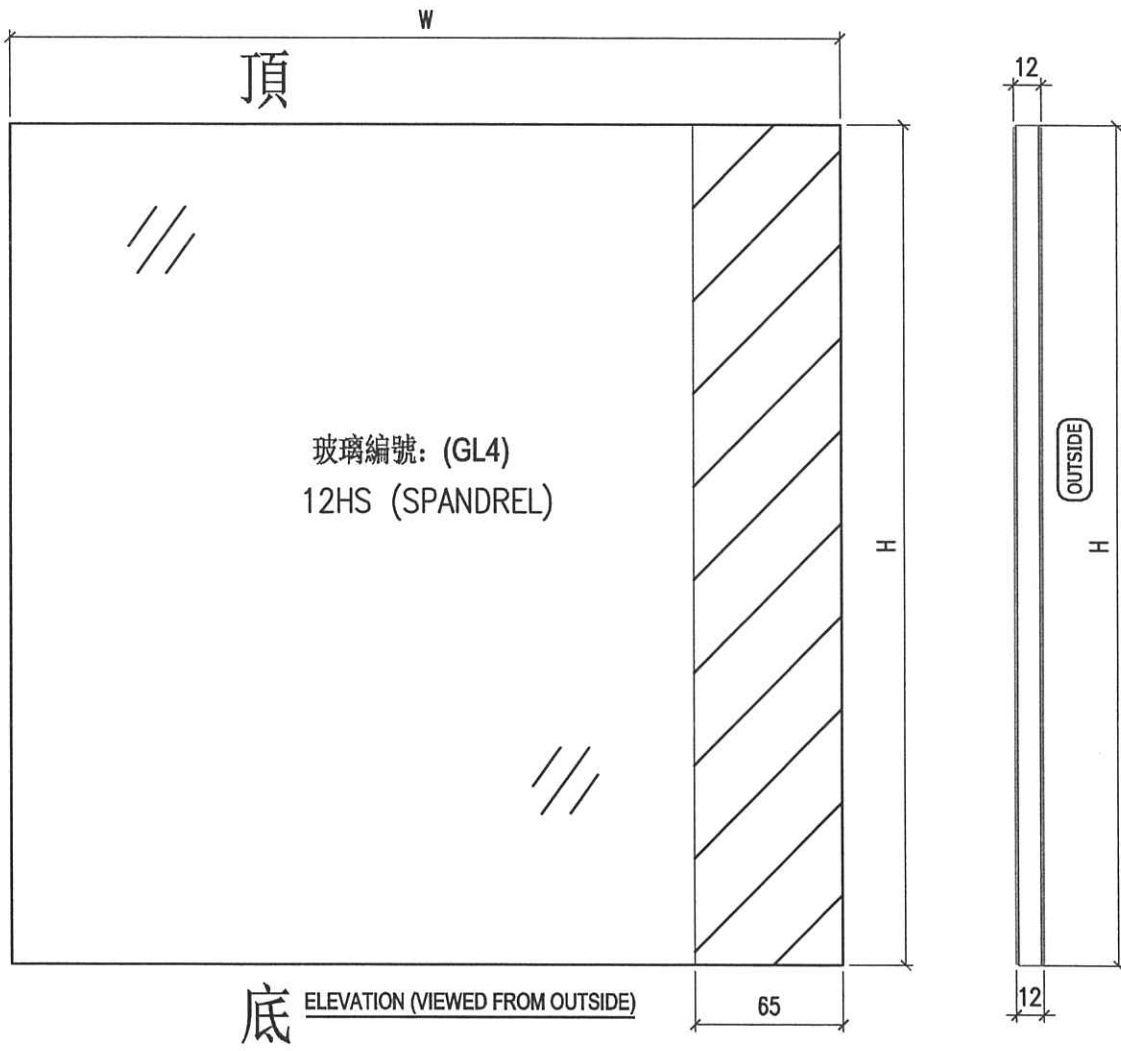

- NOTES
1. ALL DIMENSION IN mm
 2. ALL EDGE CHAMFER 1x1x45

