

工程指示 / 要求簡箋 ENGINEER INSTRUCTIONS(E.I.)

工程指示編號:	EI- 4813 / 22	修改版本:	-
	HK- 1209 / 22		
工程編號:	J 857	工程名稱:	啟德6552
收件人:	Maggie Lor	發件人:	Nero HO
工程項目:	後裝趟門 - 廠用大貨鐵件(SD26)	日期:	22/07/2022

<input type="checkbox"/> 原合約工程包	<input type="checkbox"/> 原合約工程加 / 減脹 QT-	<input type="checkbox"/> 新工程報價 QT-
---------------------------------	--	------------------------------------

信件批核號碼/圖紙參考編號:	批核模具圖紙編號:
客戶指示附件:	管理內部批簽署:

<input type="checkbox"/> 初步鋁料 B.M.	<input checked="" type="checkbox"/> 加工拆圖, 然後生產	<input type="checkbox"/> 尺寸表
<input type="checkbox"/> 正式鋁料 B.M.	<input type="checkbox"/> 技術上資料/指示	<input type="checkbox"/> 報價
<input type="checkbox"/> 配件 B.M.	<input type="checkbox"/> 樣辦或貨品說明書	<input type="checkbox"/> 分判合約
<input type="checkbox"/> 其他:		

內容:
請依附頁BM及加工圖, 生產GMS鐵件送廠。


完成上列要求日期: 22/09/2022

國內

<input type="checkbox"/> 生產技術總監	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 技術部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 生產部	<input type="checkbox"/> 連附件
<input type="checkbox"/> 採購部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input checked="" type="checkbox"/> 生產統籌部	<input checked="" type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 報關組	<input type="checkbox"/> 連附件
<input type="checkbox"/> 質檢部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 會計部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 機械設計部	<input type="checkbox"/> 連附件
<input type="checkbox"/> 香港辦	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 其他:			

<input type="checkbox"/> 行政部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 會計部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 統籌部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 工程部	<input type="checkbox"/> 連附件
<input checked="" type="checkbox"/> 採購部	<input checked="" type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> QS部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 地盤管理	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 維修部	<input type="checkbox"/> 連附件

*發件人簽署:	<i>ML</i>	*組別成員批核簽署:	<i>[Signature]</i>
傳遞編號:	HK 1209 / 22	項目經理簽署:	

 美特鋁質 有限公司 MIDI Aluminium Fabricator Ltd.		工程號:	J-857	計算:	HHQ	日期:	22/1/2022	送呈:施哥			
地盤名稱:		啟德6552		核對:		日期:		副本:			
項目類別:		後裝趨門項目 (新增)		批准:		日期:					
修改版次:				A/C Code:		鐵件總重量KG:		624.00			
BM編號:								此BM依據最新施工圖資料計算			
序號	修改內容	鐵件圖號	圖紙名稱	顏色	實用	後備	總數	單位	單件 (kg)	總重量 (kg)	備注
1		J857-WF-11	鐵巴加工圖	熱浸鍍鋅+噴瀝青油	4	0	4	件	78.000	312.000	
2		J857-WF-12	鐵巴加工圖	熱浸鍍鋅+噴瀝青油	4	0	4	件	78.000	312.000	
3											
4											
5											
6											
7											
8											KG
					合計:		8	件	合計:	624.000	KG
1.所有鐵件均需熱浸鍍鋅,材質為Grade S275(BS EN10025 & EN10210)											
2.加工成品交廠,到貨前需提前三至五天聯絡廠負責人以便安排申請入閘紙及告知來貨詳情											
加工說明											





美特鋁質 有限公司
MIDI Aluminium Fabricator Ltd.


工程號	J857	地盤	啓德6552
-----	------	----	--------

窗號	座數	單位	樓層	數量
SD-26	T1	FLAT A	33/F	1
SD-26	T3	FLAT A	33/F	1
SD-26	T6	FLAT A	33/F	1
SD-26	T8	FLAT A	31/F	1

合計： 4

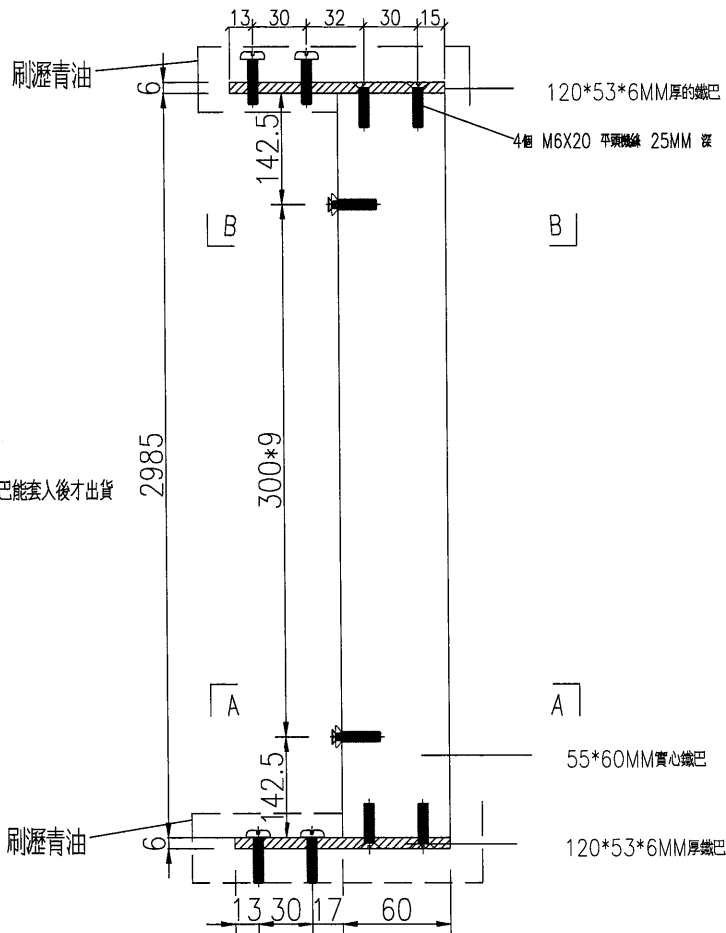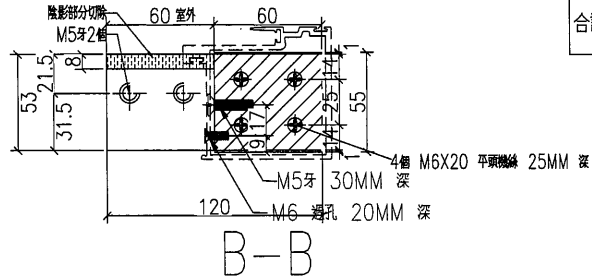


請留意鐵廠一定要用一條相應的這款X86129鋁型材試全部鐵巴能套入後才出貨



4周都要刷瀝青油

單件重量：78KG

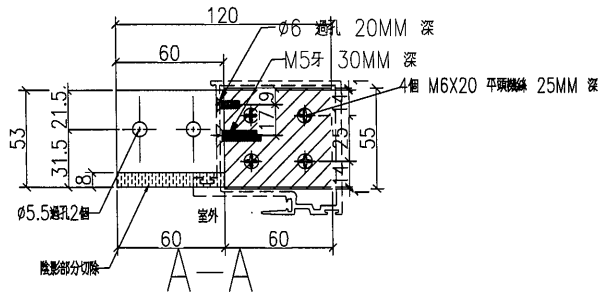

名稱	鐵巴加工圖	制圖	HHQ	2022-7-22	修改		
材料	見圖標示	復核			日期		
顏色	熱浸鍍鋅	批准			圖號	J857-WF-11	

