

工程指示 / 要求簡箋 ENGINEER INSTRUCTIONS(E.I.)

工程指示編號:	EI- 6622 / 23	修改版本:	-
	HK- 1719 / 23		
工程編號:	J 857	工程名稱:	啟德6552
收件人:	maggie / 生統	發件人:	nero
工程項目:	幕牆單元件 - 地盤用玻璃(起底用) (SEC6)	日期:	14/08/2023

<input type="checkbox"/> 原合約工程包	<input type="checkbox"/> 原合約工程加 / 減脹 QT-	<input type="checkbox"/> 新工程報價 QT-
---------------------------------	--	------------------------------------

信件批核號碼/圖紙參考編號:	批核模具圖紙編號:
客戶指示附件:	管理內部批簽署:

<input type="checkbox"/> 初步鋁料 B.M.	<input type="checkbox"/> 加工拆圖, 然後生產	<input type="checkbox"/> 尺寸表
<input type="checkbox"/> 正式鋁料 B.M.	<input type="checkbox"/> 技術上資料/指示	<input type="checkbox"/> 報價
<input type="checkbox"/> 配件 B.M.	<input type="checkbox"/> 樣辦或貨品說明書	<input type="checkbox"/> 分判合約
<input type="checkbox"/> 其他:		

內容: 請按附件資料生產加工, 送美而特廠。  按BS EN 14179-12016做heat soak test
完成上列要求日期: 23/08/2023


國內


<input type="checkbox"/> 生產技術總監	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 技術部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 生產部	<input type="checkbox"/> 連附件
<input type="checkbox"/> 採購部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input checked="" type="checkbox"/> 生產統籌部	<input checked="" type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 報關組	<input type="checkbox"/> 連附件
<input type="checkbox"/> 質檢部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 會計部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 機械設計部	<input type="checkbox"/> 連附件
<input type="checkbox"/> 香港辦	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 其他:			



香港

<input type="checkbox"/> 行政部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 會計部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 統籌部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 工程部	<input type="checkbox"/> 連附件
<input checked="" type="checkbox"/> 採購部	<input checked="" type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> QS部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input checked="" type="checkbox"/> 地盤管理	<input checked="" type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 維修部	<input type="checkbox"/> 連附件

*發件人簽署:		*組別成員批核簽署:	
傳遞編號:	HK 1719 / 23	項目經理簽署:	

		美特鋁質有限公司		工程號: J-857		計算: 劉燦		日期: 2022.7.27		送呈: 施哥	
MIDI Aluminium Fabricator Ltd.		地盤名稱: 啟德6552		核對: 徐詳坤		核對: 徐詳坤		日期: 2022.7.27		副本: 細格	
廠用玻璃B.M.表		項目類別: 單元幕牆 (起底補料)		批准: 林仁安		批准: 林仁安		日期: 2022.7.27		此BM依據大圖計算	
BM編號:		A/C Code:		數量: 2		數量: 2		總計玻璃面積 (平方米):		1.218	
序號	修改標示	玻璃编号	顏色與名稱	厚度(mm)	玻璃尺寸		數量 (塊)	面積(平方米)		使用位置	
					寬度(mm)	高度(mm)		單件	總面積		
1		AW-101	GL4: Laminated Glass 8mm Tempered Clear + 12 PVB+ 8mm Tempered Clear with Reflective Coating (to match with low-e coating colour) on Surface #2 (Sample Code : R20210906045)	17.52	592	781	1	0.462	0.462	起底位置	
2		AW-102			967	781	1	0.755	0.755	起底位置	
3											
4											
5											
6											
								總計:	2	1.218	
<p>1).本表中所有玻璃對角線尺寸偏差要求不超過正負2mm.</p> <p>2).本表中所有玻璃要求粗磨邊處理並倒棱角.</p> <p>3).本表中玻璃要求粗磨邊處理並倒棱角,攔河玻璃頂底要精磨邊,而所有玻璃之入爐方向需保持一致。</p> <p>4).本表中不同種類玻璃參照玻璃加工圖加工。</p> <p>5).本表中所有強化玻璃均需HEAT SOAK TEST。</p> <p>6).本表中所有玻璃均需注明室內外面及其玻璃編號,以便識別。</p>											
<b>加工注意事項:</b>											

 美特鋁質有限公司 MIDI Aluminium Fabricator Ltd.				工程號 J857 地盘 啟德站	類別 制圖 劉燦	物料號 - 2022.7.27	圖號 GL4-AW-XXX 數量 -
修改 - 日期 -	採用工廠 材料颜色	地盤 <input checked="" type="checkbox"/>	图纸名称 玻璃加工图 材料 GLASS	復核 徐詳坤 批准 林仁安	2022.7.27 2022.7.27	數量 - 單件重量 - (KG)	

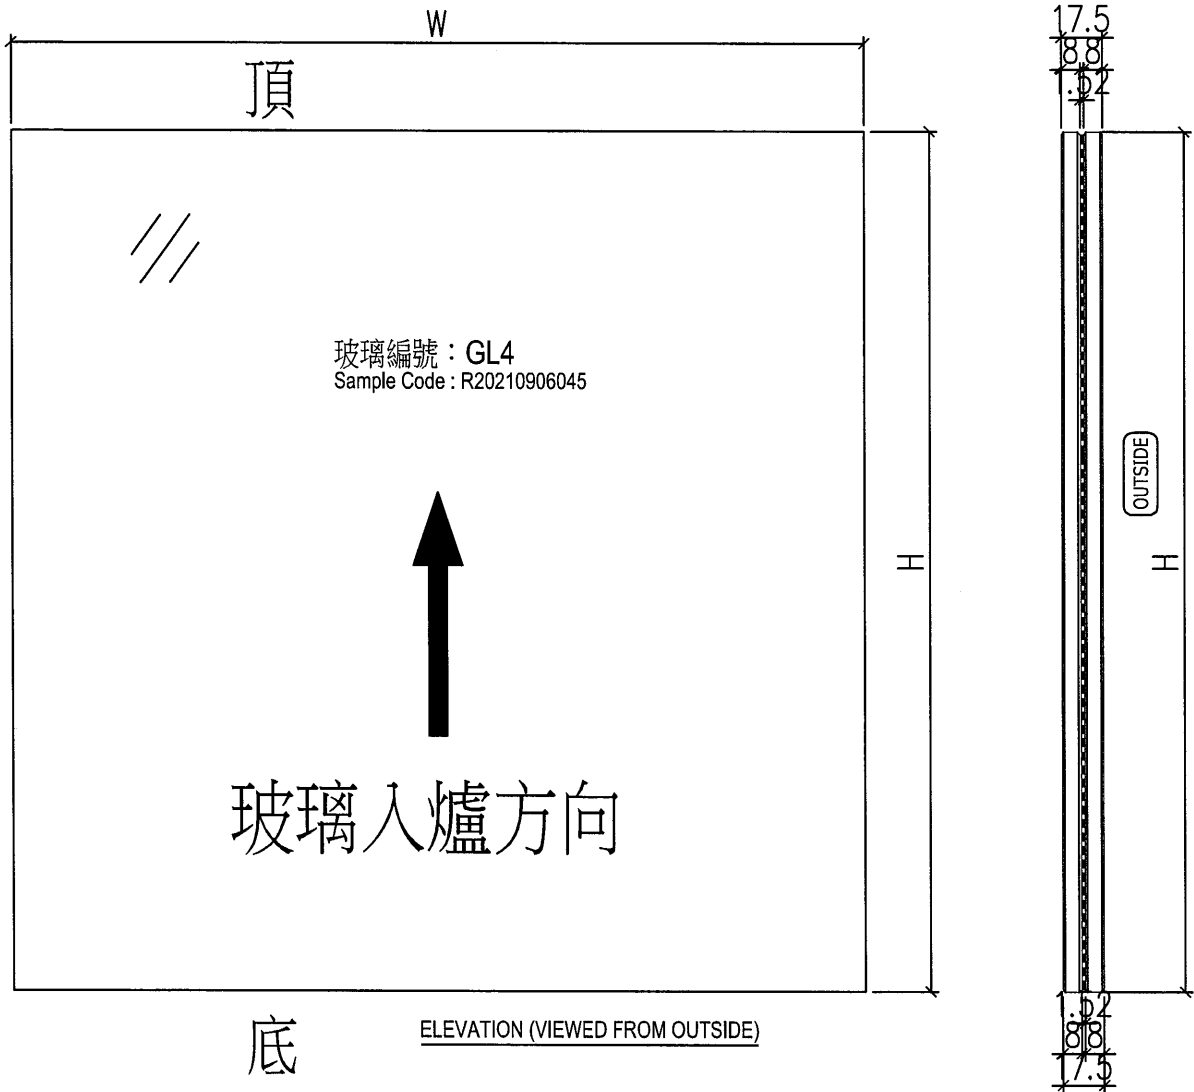

編號	W	H	數量
AW-101	592	781	1
AW-102	967	781	1

NOTES

- ALL DIMENSION IN mm
- ALL EDGE CHAMFER 1x1x45
