



工程指示 / 要求簡箋(E.I.)

工程指示編號：EI / 7929 / 24

修改版次：-

工程編號：J - 858

工程名稱：將軍澳日出康城

工程項目：後裝窗 特色層 玻璃 BM T3 B-A/U-1 地盤用 共 1 件 T3 67/F 用

收件人：Maggie

發件人：Ant Yeung

日期：13/06/2024

內容：

→ 原本大圖取消，現在業主要求補回生產。

請按玻璃 BM 生產玻璃送地盆。 需熱浸

1. 後裝窗用玻璃，共 1 件

2. 不要印上熱浸標纖。只給"可移除"的標纖

3. 單片/Lam 片：標籤在室內面 (注明尺寸)，方便移除

4. 此單包括 6mm 單片

5. 按 EI-4999 的熱浸追蹤標籤

6. 用 3M 保護膠紙

謝謝

請在 2024.06.28 前完成上列要求。

附：

原合約工程包

原合約工程加 / 減賬

新工程報價

原因：-

分發東莞各部門：

() 生產技術總監 連附件 () 技術部 連附件 () 生產部 連附件 () 機械設計部 連附件

() 採購部 連附件 () 生產統籌部 連附件 () 小羅&清 連附件

() 質檢部 連附件 () 會計部 連附件 () 報關組 連附件 () 其他 _____ 連附件

分發香港各部門：

() 行政部 連附件 () 會計部 連附件 () 統籌部 連附件 (✓) 工程部地盤科文 積哥 連附件


(✓) 採購部 連附件 () QS 部 連附件 () 維修部 連附件 () 其他 _____ 連附件


傳遞編號：



HK / 24

發件人簽署：

項目經理簽署：

 美特鋁質 有限公司 MIDI Aluminium Fabricator Ltd.		工程號: J-858 地盤名稱: 康城11期 項目類別: 新增后裝窗 修改版次:	計算: I. H. 核對: 批准: 總計玻璃面積 (平方米): 0.50	日期: 日期: 日期:	12/6/2024 副本: A/C Code: 此BM依據	送呈:Ant		
地盤用玻璃B.M.表 BM編號:								
序號	修改內容	玻璃編號	顏色與類型	玻璃尺寸		數量 (塊)	總面積 (平方米)	備注
				寬度W (mm)	高度H (mm)			
1		TG11-W01-01	TG11:6mm THK TEMPERED GLASS (R20220401057)	404	1247	1	0.50	TG11-W01
2								
3								
4								
5								
6					合計:	1	1	
加工注意事項: 1). 本表中所有玻璃對角線尺寸偏差要求不超過正負2mm。 2). 本表中所有玻璃要求粗磨邊及精磨邊處理並倒棱角。 3). 本表中不同種類玻璃參照玻璃加工圖加工。 4). 本表中所有強化玻璃均需HEAT SOAK TEST。 5). 本表中所有強化玻璃之入爐方向均以寬度方向進入。 6). 本表中所有玻璃成品均需注明室內外面及其玻璃編號，以便識別。								

 美特鋁質有限公司 MIDI Aluminium Fabricator Ltd.				工程號	J858	類別		物料號	-	
修改	-	-	-	地盤	康城11期	制圖	I. H.	2023-11-01	圖號	J858-TG11-W01
日期	-	-	-	採用工廠	✓	地盤	-	-	數量	-
				材料顏色	-	圖紙名稱	后裝窗玻璃加工圖	復核	-	-
						材料	-	批准	-	-
									單件重量	- (KG)

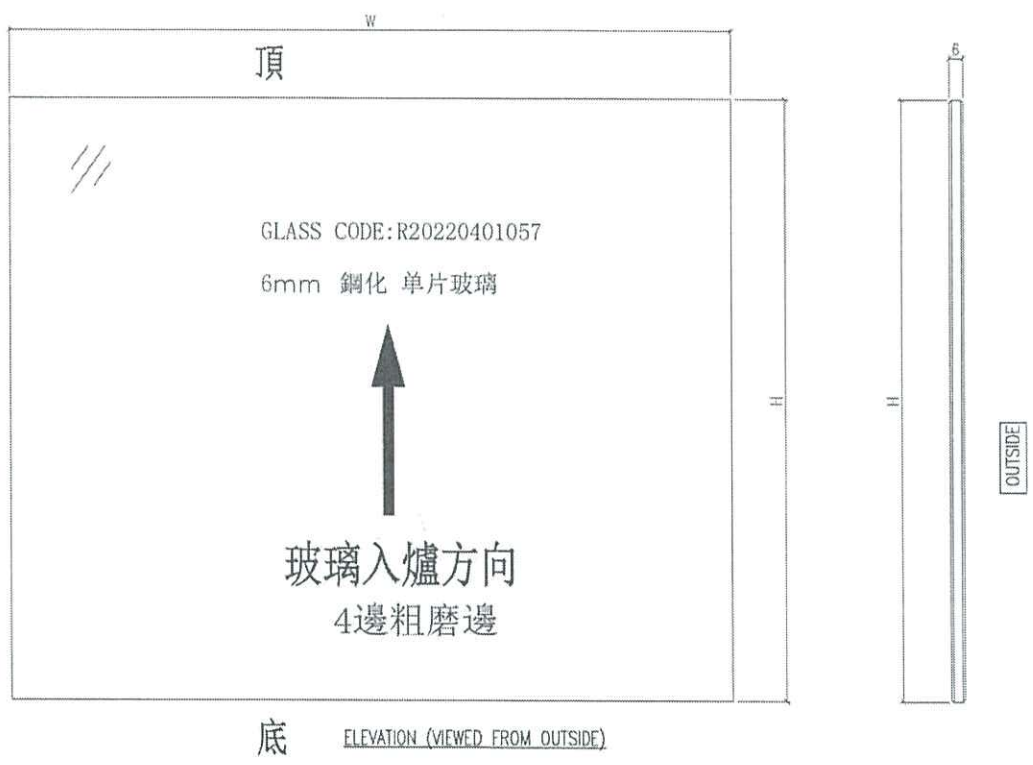

- NOTES
1. ALL DIMENSION IN mm
 2. ALL EDGE CHAMFER 1x1x45°

3	TG11-W01-03	324	1272	4
2	TG11-W01-02	367	1272	2
1	TG11-W01-01	604	1272	10
序號	玻璃編號	W	H	數量
