



工程指示 / 要求簡箋(E.I.)

工程指示編號：EI / 8859 / 25

修改版次：-

工程編號：J - 858

工程名稱：將軍澳日出康城 11

工程項目：(趟門、鋁窗配件) 加訂拉手 地盆執修用

收件人：生統 / 楊榮輝

發件人：Ant Yeung 日期：02/04/2025

要求提供 / 確認 事項

內容：

輝哥已用 RFC24229 訂購出單，未返貨。 \*不用重覆出單。此 EI 只作方便記錄。

廠倉庫的拉手已全部出貨。

因地盆遺失 / 執修 拉手，請加訂拉手。

按 RFC 24229

\* 拉手要噴色

- 170 隻絲吉利亞 趟門拉手
- 340 隻東城 鋁窗拉手

請安排送出地盆供使用。

生統：拉手先出貨各 100 隻。餘數待通知。

請在 2025.4.7 前完成上列要求。謝謝!

附：

原合約工程包  原合約工程加 / 減賬  新工程報價

分發東莞各部門：

( ) 生產技術總監  連附件 ( ) 技術部  連附件 ( ) 生產部  連附件 ( ) 機械設計部  連附件  
 ( ) 採購部  連附件 (✓) 生產統籌部  連附件 ( ) 小羅&清  連附件  
 ( ) 質檢部  連附件 ( ) 會計部  連附件 ( ) 報關組  連附(✓)其他 輝哥  連附件

分發香港各部門

( ) 行政部  連附件 ( ) 會計部  連附件 ( ) 統籌部  連附件 (✓) 工程部地盤科文 二寶  連附件  
 ( ) 採購部  連附件 ( ) QS 部  連附件 ( ) 維修部  連附件 ( ) 其他 \_\_\_\_\_  連附件

傳遞編號：

HK 277 / 25

發件人簽署：

項目經理簽署：

To: 葉哥  
RF 20229

IMPROVE QUALITY REQUEST 提高優質要求

DATE 發出日期: 7-3-2025	ICR No 編號:	PR No 編號:
JOB No. 項目編號: J-858	WORK PLACE 地點: 旺角城	ATTACHMENT 附件: Y 有 / N 無
PROBLEM RAISED BY 問題源於: <input type="checkbox"/> INTERNAL 內部 <input type="checkbox"/> OPERATION 製程 <input type="checkbox"/> VENDOR 供應商 <input type="checkbox"/> OTHER 其他		
TYPE OF REQUEST 要求之類別: <input type="checkbox"/> IMPROVE QUALITY 提高質量 <input type="checkbox"/> REFILL MATERIAL REQUEST 補料要求		
PRIORITY 急切性: <input type="checkbox"/> ACTIONS AFTER DECISION HAS MADE 決定後才行動 <input type="checkbox"/> URGENT 緊急		

DESCRIPTION OF IMPROVEMENT AREA / ITEMS OF REFILL MATERIAL 改善地方的說明 / 補料項目

申請: 趟門拉手 170只  
窗仔拉手 310只  
窗仔拉手螺絲收口蓋 30包

POSITION 發件人職位: 管工	NAME 發件人姓名: 符旺	REQUEST COMPLETE DATE 要求完成日期:
--------------------	----------------	-------------------------------

ROOT CAUSE OF PROBLEM 出現問題之原因 (WHEN MATERIAL IS NEED TO REFILL, FILLED IN BY ISSUER 如須補料, 由發件人填寫)

T1, T2, T3, 趟門拉手 窗仔拉手 大接安裝用

CLAIM FOR EXTRA COST 額外成本索償: Y 有 / N 無	RESPONSIBLE BY 責任歸屬:
--	----------------------

FOLLOW UP BY 由誰跟進: <input type="checkbox"/> PLANNING 統籌部 <input type="checkbox"/> PUR DEPT 採購部 <input type="checkbox"/> QA OFFICER 品質檢索員 <input type="checkbox"/> OTHER 其他		
PRIORITY 項目之急切性: (FILLED IN BY DEPT HEAD 由部門主管填寫)	DEPT HEAD APPROVAL 部門主管確認	DATE 日期
<input type="checkbox"/> CAN BE IMPROVE NOW 可現在進行改善方案	GM APPROVAL 總經理確認	DATE 日期
<input type="checkbox"/> ACTIONS AFTER DECISION HAS MADE BY COMPANY 由公司開會決定後才行動		

REPORT 報告 (FILLED IN BY QA OFFICER 由品質檢索員填寫)

RESULT OF INVESTIGATE 調查結果			
HK 232/25 T0 系統			
QA OFFICER 品質檢索員	DATE 日期	APPROVED BY 部門經理審核	DATE 日期
PREVENTIVE ACTION TAKEN 預防方案			

COMMAND 意見	MANAGING DIRECTOR 行政總裁	DATE 日期
COMMAND 意見	GENERAL MANAGER 總經理	DATE 日期



工程指示 / 要求簡箋 (E.I.)

工程指示編號：EI/5177/22 修改版次：-  
 工程編號：J-858 工程名稱：將軍澳日出康城 11  
 工程項目：佛沙窗 後裝窗 配件拉手 改良版  
 收件人：生統 / 楊榮輝 發件人：Ant Yeung 日期：05/10/2022

要求提供 /  確認 事項：

- |                                    |                                     |                               |
|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 初步鋁料 B.M. | <input type="checkbox"/> 加工拆圖，然後生產  | <input type="checkbox"/> 尺寸表  |
| <input type="checkbox"/> 正式鋁料 B.M. | <input type="checkbox"/> 技術上資料 / 指示 | <input type="checkbox"/> 報價   |
| <input type="checkbox"/> 配件 B.M.   | <input type="checkbox"/> 樣辦或貨品說明書   | <input type="checkbox"/> 分判合約 |

內容：

此款拉手為 2017-D2 A 為鋁窗使用 (佛沙+後裝)

因為地盆試裝發現，安裝拉手離隙 3mm。

經調查後，需要 1. 底坐需要磨去 1.5mm 2. 方型軸心需要磨去 3mm，(見附件)

EI 4675 + EI4289：270 隻 + 640 隻 = 910 隻

水洪/輝哥，請提供已改好的樣板供東成廠。請先生產 10 隻，才做大貨。

請在 2022.11.01 前完成上列要求。

附： 頁

以上項目為：

- 原合約工程包       原合約工程加 / 減賬       新工程報價

原因：-

分發東莞各部門：

- |  |   |  |  |
|--|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> 生產技術總監 <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 技術部 <input type="checkbox"/> 連附件   | <input type="checkbox"/> 生產部 <input type="checkbox"/> 連附件    | <input type="checkbox"/> 機械設計部 <input type="checkbox"/> 連附件      |
| <input type="checkbox"/> 採購部 <input type="checkbox"/> 連附件    | <input type="checkbox"/> 生產統籌部 <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 小羅 & 清 <input type="checkbox"/> 連附件 |  |
| <input type="checkbox"/> 質檢部 <input type="checkbox"/> 連附件    | <input type="checkbox"/> 會計部 <input type="checkbox"/> 連附件   | <input type="checkbox"/> 報關組 <input type="checkbox"/> 連附件    | <input type="checkbox"/> 其他 水洪, 楊榮輝 <input type="checkbox"/> 連附件 |

分發其他分判：

- 檳  連附件

分發香港各部門：


- |   |  |   |  |
|---|--|---|--|
| <input type="checkbox"/> 行政部 <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 會計部 <input type="checkbox"/> 連附件  | <input type="checkbox"/> 統籌部 <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 工程部地盤科文 <input type="checkbox"/> 連附件  |
| <input type="checkbox"/> 採購部 <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> QS 部 <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 維修部 <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 其他 _____ <input type="checkbox"/> 連附件 |

傳遞編號：

發件人簽署：

HK 1715 / 22

項目經理簽署：



美特鋁質有限公司  
MIDI Aluminium Fabricator Ltd.

工程號:	J-858	計算:	Shaw	日期:	2022/10/05	送呈:	Jason 哥
地盤名稱:	康城1期	核對:	蕭衍樑	日期:	2022/10/05	副本:	
項目類別:	佛沙窗	批准:		日期:			
A/C Code: 原E14289E/ 原ci 4675		此BM依據20211209施工圖計算					

序號	修改標示	配件圖號	物料編號	配件名稱	顏色	實用	後備	總數	單位	備注
1	請提供樣板供東成參考	先訂10隻	佛沙窗	東城手櫥 2017-D2A (改良版)	H433072	626	14	640	只	配安裝螺絲(SLHX340, SRHX150, THX150)
2	請提供樣板供東成參考		後裝窗	東城手櫥 2017-D2A (改良版)	H433072	264	6	270	只	配安裝螺絲(SRHK261, THX3)
total								910		

Handwritten notes and arrows:  
 - A blue scribble with the number "20" and an arrow pointing to the "配件名稱" column.  
 - A circled area around the "顏色" column.  
 - The Chinese characters "藍色" (Blue) written below the circled area.  
 - An arrow pointing from the circled area to the "備注" column.

① 3mm


削去 1.5mm 1.5mm

② 削去

削去 3mm

3mm


~~削去 3mm~~  
~~削去 3mm~~  
~~削去 3mm~~

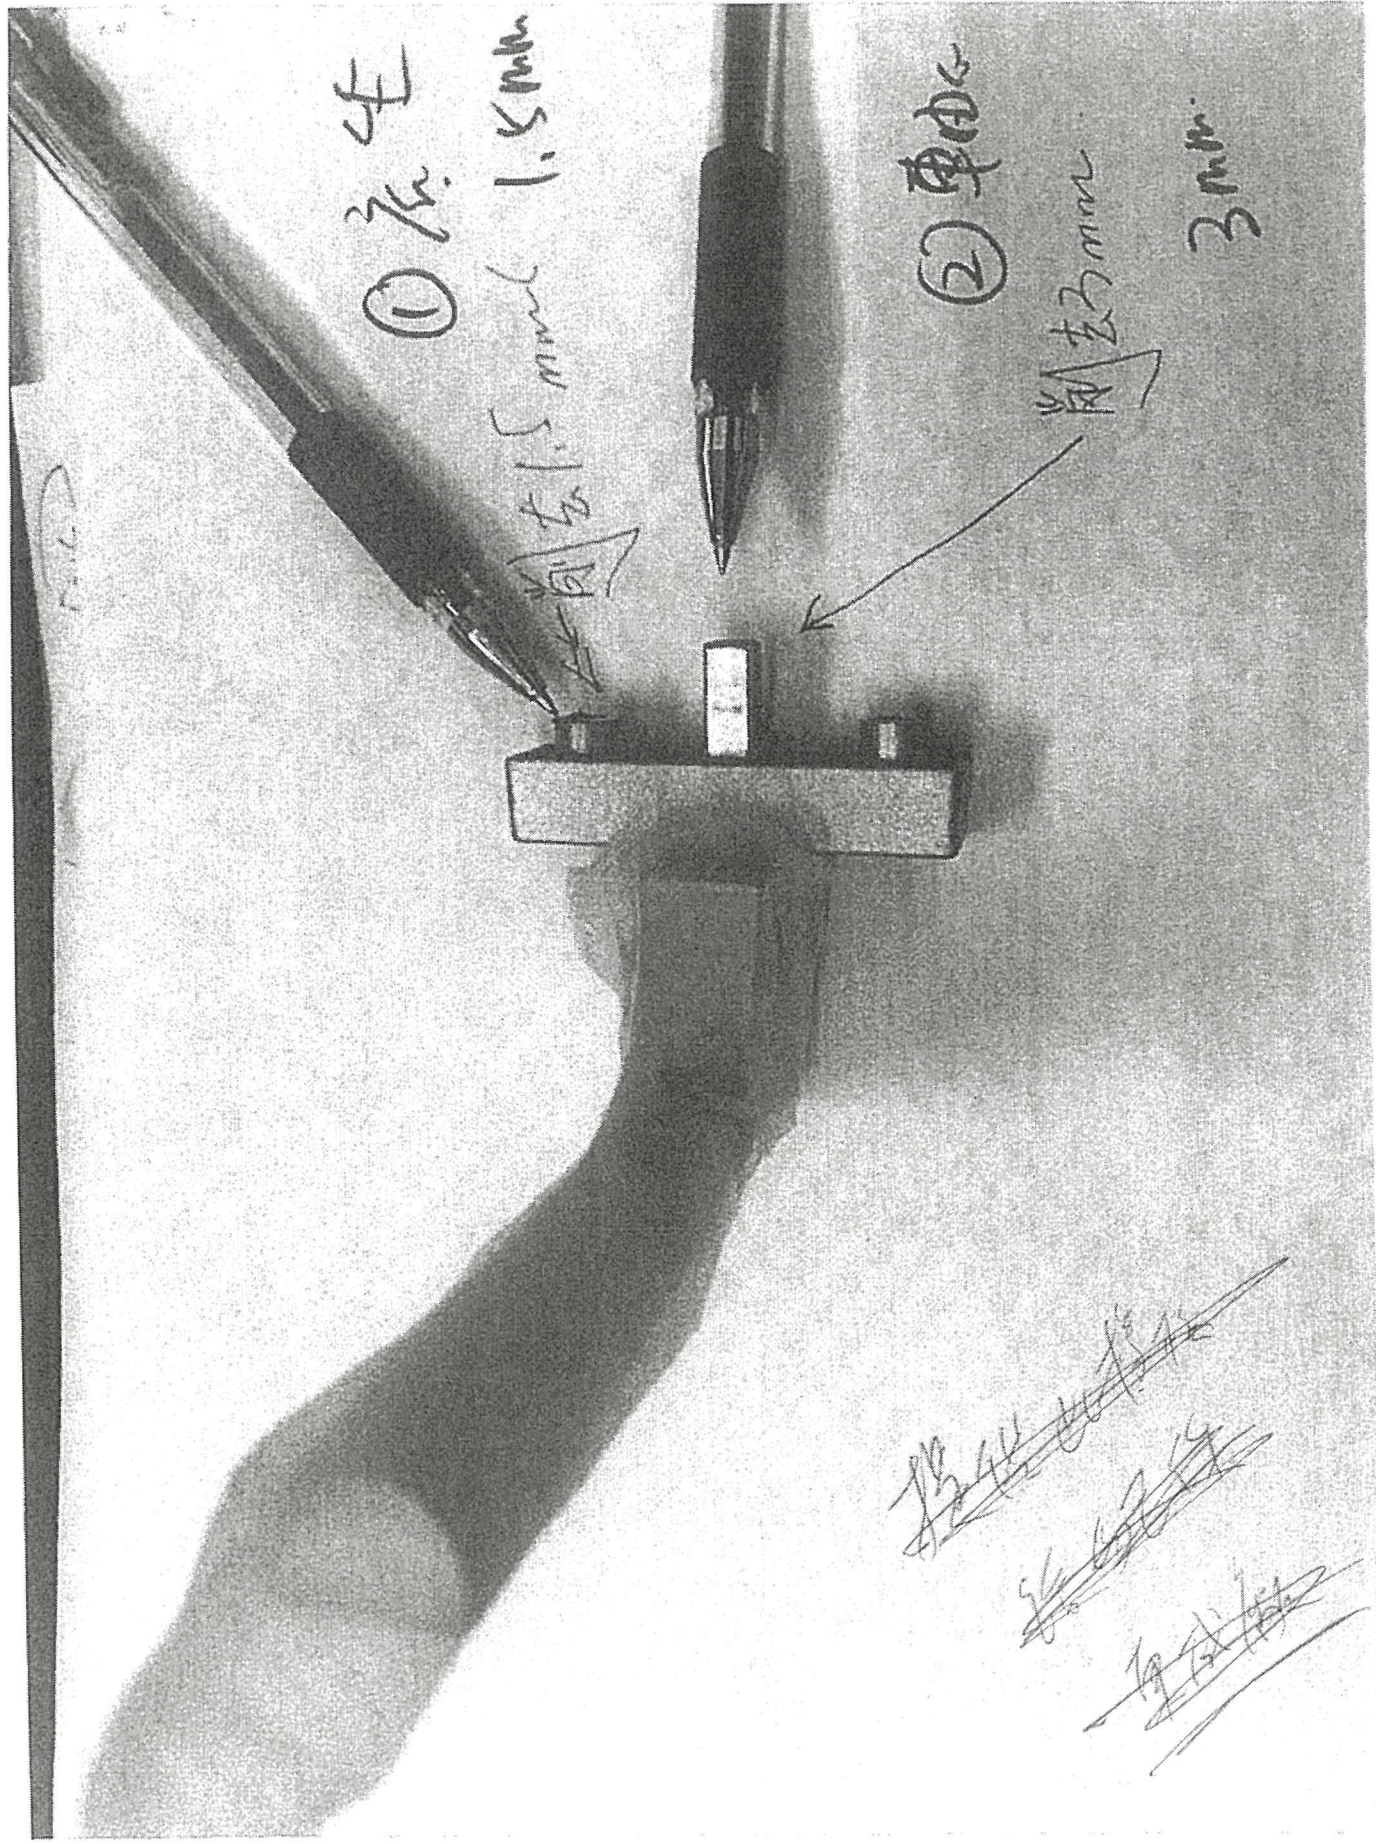



① 孔径 1.5 mm

② 孔径 3 mm



三和天位

打倒

興隆





工程指示 / 要求簡箋 (E.I.)

工程指示編號: EI / 4831 / 24

修改版次: L

工程編號: J-858

工程名稱: 將軍澳日出康城 11

工程項目: 趟門 大貨廠用配件 標準層 加訂 平機 4000 粒及 平鋼 4000 粒

收件人: 生統 / 楊榮輝

發件人: Paul Wong

日期: 16/03/2024

COPY

2/1/25

要求提供 /  確認 事項

- |                                    |                                     |                               |
|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 初步鋁料 B.M. | <input type="checkbox"/> 加工折圖, 然後生產 | <input type="checkbox"/> 尺寸表  |
| <input type="checkbox"/> 正式鋁料 B.M. | <input type="checkbox"/> 技術上資料 / 指示 | <input type="checkbox"/> 報價   |
| <input type="checkbox"/> 配件 B.M.   | <input type="checkbox"/> 樣辦或貨品說明書   | <input type="checkbox"/> 分判合約 |

內容:

L 版: 按覆核增加膠條 J852-SD-G02 10000 米, 至 20000 米

K 版: 新增 #52, #53 3/16" X 1-1/2" 平機 4000 粒及 #8 X 3/4" 平鋼 4000 粒, 門玉門鎖用

J 版: 做樣板後, 門玉組裝加訂 M6\*60 平頭機絲 16000 粒。

I 版: 新增 #49 M5\*15 圓頭機絲 原因: 在廠安裝橫料角碼, 需用螺絲固定。

I 版: 新增 #50 15\*1mm 無面貼 原因: 需要用單面貼貼在 X86320 鋁料內, 檔膠用。

H 版: 做樣板層後發現, 優化設計。配合現場石矢出入, 需要改用 25mm 棉。  
(預最早 6 月來貨也可)

G 版: 做樣板後發現, 需補回訂購螺絲款式。

G 版: 共 3 項 (#46: 3/16" X 1-1/2" 平機, 修防撞膠塊用,  
#47: 3/16" X 5/8" 平機, 修鎖扣用  
#48: 3/16" X 2-1/2" 平機, 修傳動杆用)

F 版: 新增 #11 堅朗 FK-D 提升門防撞膠塊

F 版: 新增 #37 新增尼龍限位塊

F 版: 新增 #38-45 新增封簾 EVA 膠

謝謝

請在 2024.03.23 前完成上列要求。

分發東莞各部門:

- |  |   |  |  |
|--|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> 生產技術總監 <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 技術部 <input type="checkbox"/> 連附件                         | <input type="checkbox"/> 生產部 <input type="checkbox"/> 連附件                          | <input type="checkbox"/> 機械設計部 <input type="checkbox"/> 連附件                        |
| <input type="checkbox"/> 採購部 <input type="checkbox"/> 連附件    | <input checked="" type="checkbox"/> 生產統籌部 <input checked="" type="checkbox"/> 連附件 | <input checked="" type="checkbox"/> 小羅 & 清 <input checked="" type="checkbox"/> 連附件 |  |
| <input type="checkbox"/> 質檢部 <input type="checkbox"/> 連附件    | <input type="checkbox"/> 會計部 <input type="checkbox"/> 連附件                         | <input type="checkbox"/> 報關組 <input type="checkbox"/> 連附件                          | <input checked="" type="checkbox"/> 其他 楊榮輝 <input checked="" type="checkbox"/> 連附件 |

分發香港各部門


- |   |  |   |  |
|---|--|---|--|
| <input type="checkbox"/> 行政部 <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 會計部 <input type="checkbox"/> 連附件  | <input type="checkbox"/> 統籌部 <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 工程部地盤科文 <input type="checkbox"/> 連附件  |
| <input type="checkbox"/> 採購部 <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> QS 部 <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 維修部 <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 其他 _____ <input type="checkbox"/> 連附件 |

傳遞編號:

0471  
HK 16/03/24

發件人簽署: [Signature]

項目經理簽署: [Signature]

 美特鋁質有限公司 NCDI Aluminium Fabricator Ltd.	工程號:	J-858	計算:	Shaw	日期:	23/2/2023	送呈:
	地盤名稱:	原城日期	核對:	蕭衍候	日期:	23/2/2023	副本:
	項目類別:	趟門	批准:		日期:		
	A/C Code: E14831 L_20240316						

手號	修改標示	配件圖號	物料編號	配件名稱	顏色	實用	後備	總數	單位	備註
1	D更改, 送地盤使用			M5x10平頭機絲	A4-70	16731	269	17000	只	修提升推拉門企鑲扣料
2	E更改, 送地盤使用			#9x1-1/4"圓頭鋼牙	黑色	29744	456	30200	個	推拉門組框
3				M5x10平頭機絲	A4-70	59408	592	60000	個	趟門玉組框
4		5x5 mm 標準款		毛條J852-SD-G07		24000		24000	米	
5		舊模		膠條J852-SD-G01		10000		10000	米	
6	L更改, 增加數量			膠條J852-SD-G02		20000		20000	米	
7				膠條J858-SD-G01		32000		32000	米	
8				膠條J858-SD-G02		5200		5200	米	
9				膠條718-SD-GU-01		15000		15000	粒	
10				igecnia Modici: Hebel HS Portal 300 Scheme A) 益吉利亞鎖, 單开门	黑色	1880	15	1895	套	2號/1生門 用於門玉員防撞
11	F新增			堅朗EX-D-提升門防撞塊		3760	40	3800	粒	
12				M5x12圓頭機絲	A4-70	22308	192	22500	粒	紅外框
13	D更改, 送地盤使用			M5x12平頭機絲	A4-70	22308	192	22500	粒	紅外框
14	D更改, 送地盤使用			M5x25圓頭機絲	A4-70	63206	794	64000	粒	修趟門框
15				#8x1/2"圓頭鋼牙	A4-70	33462	538	34000	粒	修擋泥鋁角
16				#8x1/2"圓頭鋼牙	A4-70	22308	392	22700	粒	修鋁板扣件 (之字料)
17	D更改, 送地盤使用			#8x1/2"圓頭鋼牙	A4-70	29744	456	30200	粒	修頂橫修口鋁板和滴水線
18				跟J852 ci2430C	A4-70	5800		5800	粒	趟門框導軌調節安裝
19				M5x20圓頭機絲	A4-70	29744	456	30200	粒	修趟門底副框
20	D更改, 送地盤使用			M5x15圓頭機絲	A4-70	66924	576	67500	粒	修壓板
