

工程指示 / 要求簡箋 ENGINEER INSTRUCTIONS(E.I.)

| | | | |
|---------|--------------------|-------|------------|
| 工程指示編號: | EI- 6141 | 修改版本: | B |
| | HK- | | |
| 工程編號: | J 860 | 工程名稱: | 馬灣 |
| 收件人: | 林哥 /maggie | 發件人: | nero |
| 工程項目: | 後裝窗、FD門、趟門 - 地盤用配件 | 日期: | 02/02/2024 |

| | | |
|---------------------------------|--|------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 原合約工程包 | <input type="checkbox"/> 原合約工程加 / 減賬 QT- | <input type="checkbox"/> 新工程報價 QT- |
|---------------------------------|--|------------------------------------|

| | |
|----------------|-----------|
| 信件批核號碼/圖紙參考編號: | 批核模具圖紙編號: |
| 客戶指示附件: | 管理內部批簽署: |

| | | |
|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 初步鋁料 B.M. | <input type="checkbox"/> 加工拆圖, 然後生產 | <input type="checkbox"/> 尺寸表 |
| <input type="checkbox"/> 正式鋁料 B.M. | <input type="checkbox"/> 技術上資料/指示 | <input type="checkbox"/> 報價 |
| <input type="checkbox"/> 配件 B.M. | <input type="checkbox"/> 樣辦或貨品說明書 | <input type="checkbox"/> 分判合約 |
| <input type="checkbox"/> 其他: | | |

| |
|---|
| 內容: 增加序號35和36 之前摩耳厚度是2mm厚,現在1.5mm厚 如果修改厚度是要重新開模,就改回2mm厚 |
| 完成上列要求日期: ASAP |


國內

| | | | | | |
|---------------------------------|------------------------------|--------------------------------|------------------------------|--------------------------------|------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 生產技術總監 | <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 技術部 | <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 生產部 | <input type="checkbox"/> 連附件 |
| <input type="checkbox"/> 採購部 | <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 生產統籌部 | <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 報關組 | <input type="checkbox"/> 連附件 |
| <input type="checkbox"/> 質檢部 | <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 會計部 | <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 機械設計部 | <input type="checkbox"/> 連附件 |
| <input type="checkbox"/> 香港辦 | <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 其他: | | | |


香港

| | | | | | | | |
|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 行政部 | <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 會計部 | <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 統籌部 | <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 工程部 | <input type="checkbox"/> 連附件 |
| <input type="checkbox"/> 採購部 | <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> QS部 | <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 地盤管理 | <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 維修部 | <input type="checkbox"/> 連附件 |

| | | | |
|---------|--------------------|------------|--------------------|
| *發件人簽署: | <i>[Signature]</i> | *組別成員批核簽署: | |
| 傳遞編號: | | 項目經理簽署: | <i>[Signature]</i> |

| | | | | | | | |
|---|-------|-----------|-------------|-----|----------|-----------------------|--|
|  美特鋁質有限公司 MIDI Aluminium Fabricator Ltd. | 工程號: | J860 | 計算: 吳祚瑜 | 日期: | 2023/5/4 | 送呈: 細佬 | |
| | 地盤名稱: | 馬灣 | 核對: 王禮秋 | 日期: | 2023/5/4 | 副本: | |
| 地盤用配件B.M.表 | | 項目類別: | 後裝窗, FD門及趟門 | 批准: | 日期: | | |
| BM編號: | | A/C Code: | | | | 此BM依據20221206收施工圖大樣計算 | |



| 序號 | 修改標示 | 配件圖號 | 物料編號 | 配件名稱 | 顏色 | 實用 | 後備 | 總數 | 單位 | 備注 |
|----|------|-------------|------------|-------------------------|------|-----|----|-----|----|-----------------------------|
| 1 | | | J857-MR1 | 摩爾 | S.S. | 640 | 65 | 705 | 隻 | 用於鋁窗企向、用於百葉框企向，百葉框頂/底橫 |
| 2 | | | J857-MR1-1 | 摩爾 | S.S. | 35 | 15 | 50 | 隻 | 用於鋁窗頂/底橫 |
| 3 | | 是旭格款的，由工厂提供 | | 摩爾 | S.S. | 20 | 5 | 25 | 隻 | 用於FD門底部 |
| 4 | | 是旭格款的，由工厂提供 | | 摩爾 | S.S. | 100 | 20 | 120 | 隻 | 用於FD門企向 |
| 5 | | | | D.C.791防水膠 | 黑色 | 2 | 0 | 2 | 支 | 300ml/支(牆邊防水膠, 2.8m/支)後裝窗使用 |
| 6 | | | | D.C.791防水膠 | 黑色 | 2 | 0 | 2 | 支 | 300ml/支，用於玻璃密封打膠(後裝窗使用) |
| 7 | | | | D.C.791防水膠 | 黑色 | 22 | 2 | 24 | 支 | 300ml/支(用於FD門牆邊防水膠，2.8m/支) |
| 8 | | | | D.C.791防水膠 | 黑色 | 45 | 5 | 50 | 支 | 300ml/支，用於FD門玻璃密封打膠 |
| 9 | | | | D.C.791防水膠 | 黑色 | 13 | 2 | 15 | 支 | 300ml/支(用於大趟門牆邊防水膠，2.8m/支) |
| 10 | | | | D.C.791防水膠 | 黑色 | 22 | 2 | 24 | 支 | 300ml/支，用於大趟門玻璃密封打膠 |
| 11 | | | | 皺紋膠紙 | | 5 | 1 | 6 | 卷 | 20m/卷 |
| 12 | | 材質：EPDM | | 50(L)x4.5(寬)x9.5(高)側面墊膠 | 黑色 | 128 | 12 | 140 | 粒 | 玻璃四周側1/4處 硬度65±5°(每片玻璃16粒) |
| 13 | | 材質：EPDM | | 50(L)4.5(寬)x8(高)側面墊膠 | 黑色 | 128 | 12 | 140 | 粒 | 玻璃四周側1/4處 硬度65±5°(每片玻璃16粒) |
| 14 | | 材質：EPDM | | 50(L)4(寬)x6(高)側面墊膠 | 黑色 | 64 | 6 | 70 | 粒 | 玻璃四周側1/4處 硬度65±5°(每片玻璃8粒) |
| 15 | | 材質：EPDM | | 50(L)3(寬)x10(高)側面墊膠 | 黑色 | 64 | 6 | 70 | 塊 | 玻璃室內外側1/4處 硬度65±5° |
| 16 | | 材質：EPDM | | 20x9mm厚墊塊(L=150mm) | 黑色 | 8 | 2 | 10 | 塊 | 玻璃底1/4處 硬度80°~90° |
| 17 | | 材質：EPDM | | 20x5厚墊塊(L=150mm) | 黑色 | 8 | 2 | 10 | 塊 | 用於開啟扇趟門玻璃底 |
| 18 | | 材質：EPDM | | 30x5厚墊塊(L=150mm) | 黑色 | 8 | 2 | 10 | 塊 | 用於固定扇趟門玻璃底 |
| 19 | | 材質：EPDM | | 30x8厚墊塊(L=150mm) | 黑色 | 20 | 2 | 22 | 塊 | 用於FD門玻璃底 |
| 20 | | | | 8x4.5mm方海绵棒 | 白色 | 150 | 10 | 160 | 米 | 玻璃打膠用 |

| | | | | | | | | | |
|---|-------|-----------|-------------|-----|-----|----------|-----------------------|----|--|
|  美特鋁質有限公司 MIDI Aluminium Fabricator Ltd. | 工程號: | J860 | 計算: | 吳祚瑜 | 日期: | 2023/5/4 | 送呈: | 细佬 | |
| | 地盤名稱: | 馬灣 | 核對: | 王禮秋 | 日期: | 2023/5/4 | 副本: | | |
| 地盤用配件B.M.表 | | 項目類別: | 後裝窗, FD門及趟門 | | 批准: | 日期: | | | |
| BM編號: | | A/C Code: | | | | | 此BM依據20221206收施工圖大樣計算 | | |

| 序號 | 修改標示 | 配件圖號 | 物料編號 | 配件名稱 | 顏色 | 實用 | 後備 | 總數 | 單位 | 備注 |
|----|----------|-------|---------------------------|---------------------|-------|-----|-----|-----|----|-----------------------------|
| 21 | | | | # 9x16圓頭鋼牙 | A4-70 | 50 | 10 | 60 | 粒 | 用於地盤修趟門底框 |
| 22 | | | M10 x 90 | HILTI HST3-R M10 拉爆 | A4-70 | 50 | 10 | 60 | 粒 | 用於地盤修百叶主企通固定 |
| 23 | | | | M5x20mm長螺絲 | A4-70 | 40 | 10 | 50 | 粒 | 用於地盤修趟門頂收口鋁板 |
| 24 | | | | # 8x3/8圓頭鋼牙 | A4-70 | 120 | 10 | 130 | 粒 | 用於地盤修趟門頂防水鋁板 |
| 25 | | | | M5x15mm平頭機絲 | A4-70 | 80 | 10 | 90 | 粒 | 修型材與趟門頂鐵件上 |
| 26 | | | | M5x20mm平頭機絲 | A4-70 | 50 | 10 | 60 | 粒 | 用於地盤修趟門頂框 |
| 27 | | | | M5x15mm圓頭機絲 | A4-70 | 20 | 2 | 22 | 粒 | 修鐵角與企向鐵通上 |
| 28 | | | | M5x15mm平頭機絲 | A4-70 | 20 | 2 | 22 | 粒 | 修橫向鐵件與鐵角上 |
| 29 | | | | 木尖 | | 600 | | 600 | 個 | |
| 30 | | | 05-900001-0000-YL | HILTI X-U 27 P8 子彈釘 | 不銹鋼 | 795 | 105 | 900 | 粒 | 固定摩爾 |
| 31 | | | 05-900000-CD27-00 | HILTI 子彈 | 紅藥 | 795 | 105 | 900 | 支 | 固定摩爾 |
| 32 | | | Boncrete | 防水劑(接觸劑) | | 2 | 0 | 2 | 公升 | 0.0125公升/米 框邊四周需填塞砂漿之位置 |
| 33 | | | Triple Strength medusa | 防水粉 | | 5 | 1 | 6 | 公斤 | 0.0315公斤/米 混合水泥沙使用 |
| 34 | | | Baralastic(Mastrseal 540) | 防水油 | | 41 | 4 | 45 | 公斤 | 0.135公斤/米 室內外 室外框邊四周150mm距離 |
| 35 | B重訂和增加數量 | 款式见附图 | J857-MR1a | 摩爾 | S.S. | 765 | 65 | 830 | 隻 | 用於鋁窗企向、用於百葉框企向、百葉框頂/底橫 |
| 36 | B重訂和增加數量 | 款式见附图 | J857-MR1-1a | 摩爾 | S.S. | 155 | 15 | 170 | 隻 | 用於鋁窗頂/底橫 |

| | | | | | | | | |
|---|--|--|--|----|-----|----------|----|-----------|
|  美特鋁製有限公司 MIDI Aluminium Fabricator Ltd. | | | | 類別 | | 物料號 | | |
| | | | | 製圖 | 吳祎瑜 | 2023.5.3 | 圖號 | J857-MR1a |
| 修改 | | | | 複核 | | | 數量 | 830 |
| 日期 | | | | 批准 | | | 位置 | |

用於鋁窗企向、百葉框企向,百葉框頂/底橫,

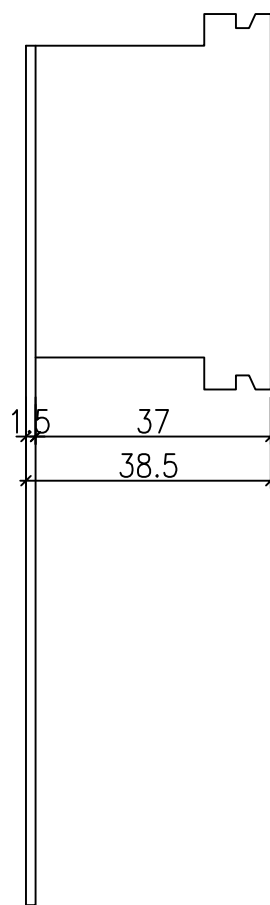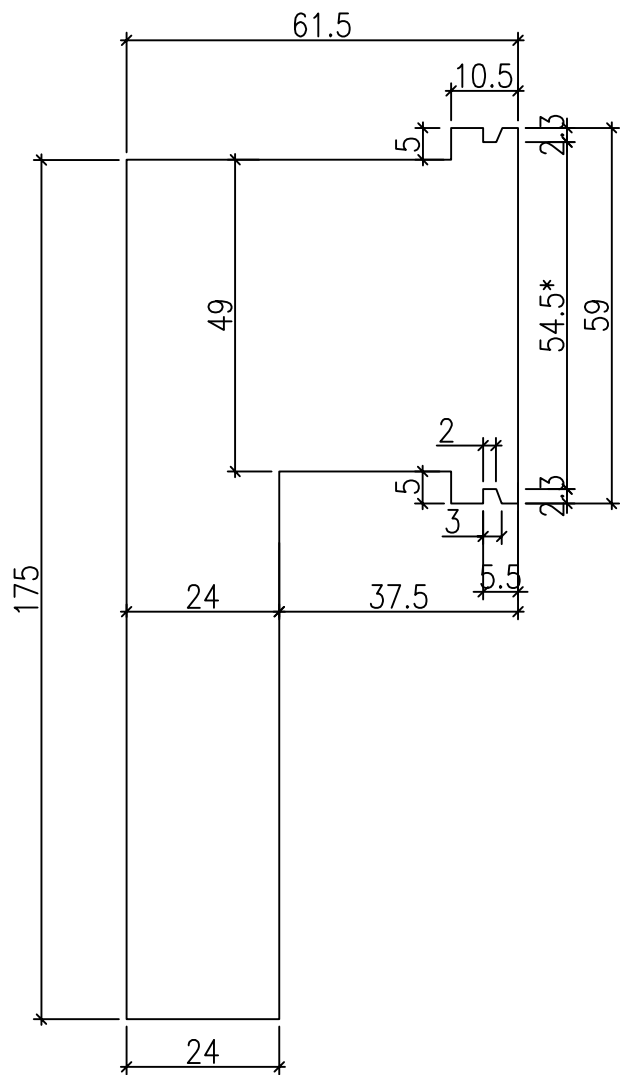



注：带*号为重要尺寸

扭曲後圖樣

| | | | | |
|-----|------------------|----|----|----|
| 工程號 | J-860 | 地盤 | 馬灣 | 附件 |
| 名稱 | 摩爾加工圖 | | 採用 | |
| 材料 | 1.5mm厚板 | | 地盤 | |
| 顏色 | S.S. (grade 304) | | 工廠 | |

| | | | | | | | | |
|---|--|--|--|----|-----|----------|----|-------------|
|  美特鋁製有限公司 MIDI Aluminium Fabricator Ltd. | | | | 類別 | | 物料號 | | |
| 修改 | | | | 製圖 | 吳祿瑜 | 2023.5.3 | 圖號 | J857-MR1-1a |
| 日期 | | | | 複核 | | | 數量 | 170 |
| | | | | 批准 | | | 位置 | |

用於鋁窗頂/底橫

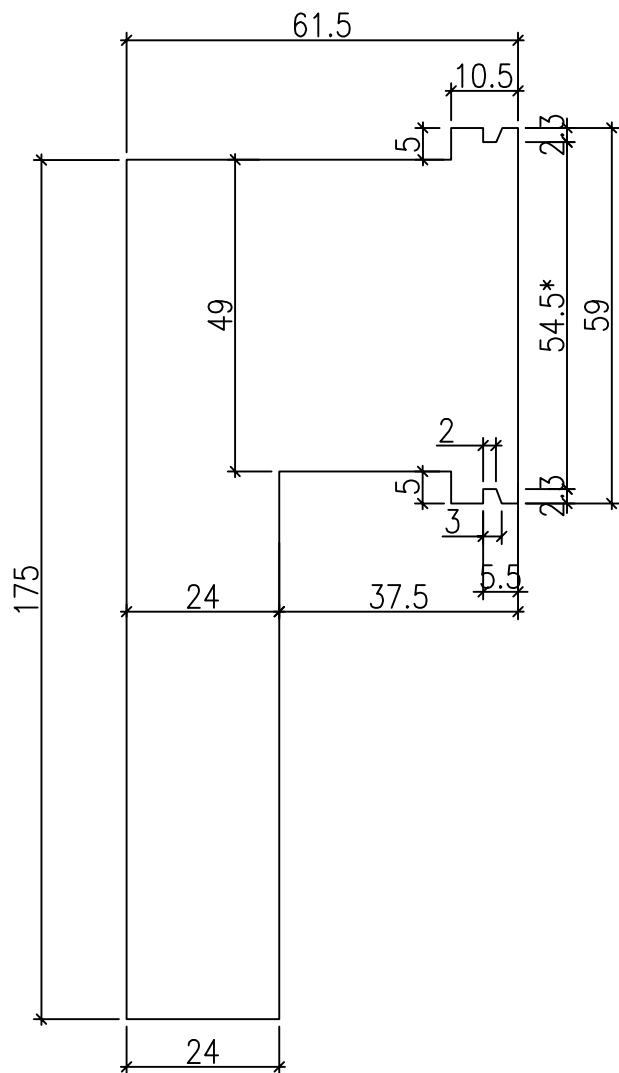

注：带*号为重要尺寸

扭曲後圖樣

| | | | | |
|-----|------------------|----|----|----|
| 工程號 | J-860 | 地盤 | 馬灣 | 附件 |
| 名稱 | 摩爾加工圖 | | 採用 | |
| 材料 | 1.5mm厚板 | | 地盤 | |
| 顏色 | S.S. (grade 304) | | 工廠 | |
