



工程指示 / 要求簡箋(E.I.)

工程指示編號：EI / 1250 / 19

修改版次：-

工程編號：J - 837

工程名稱：觀塘裕民坊

工程項目：幕牆 6 樓及特式層絲吉利亞趟門 地盤用配件

收件人：林哥

發件人：Eric Liu

日期：20/11/2019

要求提供 / 確認 事項：

- | | | |
|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 初步鋁料 B.M. | <input type="checkbox"/> 加工拆圖，然後生產 | <input type="checkbox"/> 尺寸表 |
| <input type="checkbox"/> 正式鋁料 B.M. | <input type="checkbox"/> 技術上資料 / 指示 | <input type="checkbox"/> 報價 |
| <input type="checkbox"/> 配件 B.M. | <input type="checkbox"/> 樣辦或貨品說明書 | <input type="checkbox"/> 分判合約 |
| <input type="checkbox"/> 其他：_____ | | |

內容：

請按 BM 訂購配件送地盤

6 樓及特式層絲吉利亞趟門配件用

謝謝。

請在 2019/ 12 / 06 前完成上列要求。

附：1 頁 BM 7 1 互長加工圖

以上項目為：

- 原合約工程包 原合約工程加 / 減賬 新工程報價

原因：-

分發東莞各部門：

- () 生產技術總監 連附件 (/) 技術部 連附件 永林 () 生產部 連附件 () 機械設計部 連附件
 () 採購部 連附件 (/) 生產統籌部 連附件 梅
 () 質檢部 連附件 () 會計部 連附件 () 報關組 連附件 () 其他 小羅 連附件

分發香港各部門：

- () 行政部 連附件 () 會計部 連附件 (/) 統籌部 連附件 梅 (/) 工程部地盤科文 連附件 炳哥 / 民 / 豪
 () 採購部 連附件 () QS 部 連附件 () 維修部 連附件 () 其他 _____ 連附件

傳遞編號：

HK 2374 / 19


發件人簽署：

項目經理簽署：


Eric Liu
PP

	美特鋁質有限公司	工程號:	J-837	計算:	謝永林	日期:	2019.09.08	送呈:	胡哥		
	MIDI Aluminium Fabricator Ltd.	地盤名稱:	觀塘裕民坊	核對:	謝永林	日期:	2019.09.10	副本:			
地盤用配件B.M.表		項目類別:	特式層/6F提升趟門	批准:	Daniel Woo	日期:					
BM編號:J837-SL-MO1-S-HP03		A/C Code:					此BM依據EI/0282G版大圖資料計算BM				
序號	修改標示	配件圖號	物料編號	配件名稱	顏色	實用	後備	總數	單位	備注	
1		由廠加工(822款)		H333A摩耳(長150mm)	熱浸鋅	318	12	330	支	間距300mm	
2				3/16x2"圓頭機絲	不鏽鋼316	40	10	50	粒	用於趟門修鋁通152.4*50.8*4.78	
3				3/16x1-5/32"平頭機絲	不鏽鋼316	100	10	110	粒	用於2扇趟雙開門	
4				3/16x1-5/32"圓頭機絲	不鏽鋼316	100	10	110	粒	用於趟門梗門收在頂橫上	
5				3/16x1-3/4"圓頭機絲	不鏽鋼316	120	10	130	粒	用於梗門玉企向修在框上用	
6				3/16x1-3/4"圓頭機絲	不鏽鋼316	100	10	110	粒	用於趟門6/F企/橫于主企收邊鋁折件	
7				3/16"x1"圓頭機絲	不鏽鋼316	120	10	130	粒	用於趟門夾邊收於趟門框生邊企上	
8				3/16"x1"平頭機絲	不鏽鋼316	80	20	100	粒	收50窗框于鋁通152.4*50.8*4.78	
9				5/32"X3/8"平頭機絲	不鏽鋼316	80	10	90	粒	用於門玉安裝封口片	
10				D.C791防水膠	Bronze	80	5	85	支	用於玻璃四周密封用(300ml/支)	
11				120(L)x18(H)x30(W)墊塊	黑色	60	6	66	粒	玻璃底1/4處 硬度±80°	
12				30(L)x6.5(H)x4(W)膠塞	黑色	360	18	378	粒	玻璃四周側1/4處 硬度±55°	
13				木尖		84	6	90	個	每門約12個(趟門)	
50窗用配件BM											
14			05-900001-0000-YL	子彈釘 X-U 27 P8	不銹鋼	40	5	45	個	用於固定磨耳(@300c/c)後裝窗	
15		由廠加工		摩耳(MT-GMB-01)	熱浸鋅	40	5	45	支	後裝窗摩耳(@300c/c)	
16				木尖		16	2	18	個	每窗四個(50窗)	
17				6X10mm厚玻璃膠塞(L=30)	黑色	64	0	64	隻	用於玻璃兩側	
18				30X7mm墊塊(L=120)	黑色	10	2	12	隻	用於玻璃底部	
19				Dowsil791	Bronze	10	2	12	支	用於玻璃四周密封用(300ml/支)	
20				M5x25mm平頭機絲	不鏽鋼316	40	5	45	粒	收生/梗夾企用	

 美特鋁質有限公司 MIDI Aluminium Fabricator Ltd.	類別	物料號		
	制圖 邱紅	2019.07.03	圖號	MT-GMB-01
修改		復核 謝永林	數量	28+2=30
日期		批准 Daniel	位置	用於50後裝窗框四周

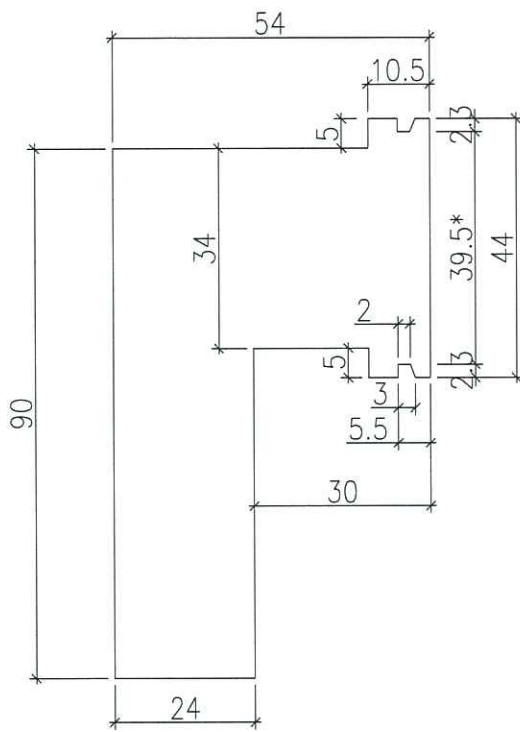

注：帶"*"號為重要尺寸



扭曲後圖樣

工程號	J-837	地盤	觀塘裕民坊	附 件	
名稱	50後裝窗摩耳加工圖	採用			
材料	2mm厚鐵板	地盤	✓		
顏色	熱浸鋅	工廠			
