

工程指示 / 要求簡箋(E.I.)

工程指示編號：EI 1164 / 19

修改版次：

工程編號：J - 837

工程名稱：觀塘裕民坊

工程項目：新增百葉地盤用配件 BM (6/F、27/F、天面)

收件人：林哥

發件人：Bessie Lau

日期：25/10/2019

要求提供 / 確認 事項：

- 初步鋁料 B.M. 加工拆圖，然後生產 尺寸表
- 正式鋁料 B.M. 技術上資料 / 指示 報價
- 配件 B.M. 樣辦或貨品說明書 分判合約
- 其他：_____

內容：

煩請按此增訂地盤用配件

按 EI1118/19 計算，已提醒永林哥之前已算 BM 的 EI9604B、EI9604C 及 EI9604D 不用重複計算

請在 _____ 前完成上列要求。

附有關圖紙 / 文件：

以上項目為：

- 原合約工程包 原合約工程加 / 減賬 新工程報價

原因：-

分發東莞各部門：

- 生產技術總監 連附件 技術部 連附件 生產部 連附件 機械設計部 連附件
- 採購部 連附件 生產統籌部 連附件
- 質檢部 連附件 會計部 連附件 報關組 連附件 其他 _____ 連附件

分發香港各部門：

- 行政部 連附件 會計部 連附件 統籌部 連附件 工程部地盤科文 連附件
- 採購部 連附件 QS 部 連附件 維修部 連附件 其他 _____ 連附件

傳遞編號：

HK 2208 / 19

發件人簽署：

項目經理簽署：



美特鋁質有限公司
MID Aluminum Fabricator Ltd.

工程號: J-837

計算: 觀塘裕民坊

核對: 後裝特別位百葉

日期: 2019.10.16

陳俊賢

日期: 2019.10.17

副本: Jason

送呈: 胡哥



地盤用配件B.M.表

BM編號: J 837-LO-M01-S-HP04

A/C Code: 此BM依據EI/1118/19版施工圖紙計算

序號	修改標示	配件圖號	物料編號	配件名稱	顏色	實用	後備	總數	單位	備注
1			05-900000-X-C P8 27-00	子彈	紅藥黃藥	1240	60	1300	個	配子彈釘用(後裝百葉)
2			05-900001-0000-YL	子彈釘 X-U 27 P8	不銹鋼	1240	60	1300	個	用於固定磨耳 (@300c/c) 後裝百葉
3			MT-GMB-01	磨耳 (120mm)	熱浸鋅	310	15	325	支	百葉300mm用1支, 小於300用2支
4			MT-GMB-02	磨耳 (120mm)	熱浸鋅	310	15	325	支	百葉300mm用1支, 小於300用2支
5			MT-GMB-03	磨耳 (150mm) ✓ 九	熱浸鋅	620	30	650	支	百葉300mm用1支, 小於300用2支
6			MT-GMB-04	磨耳 (150mm) ✓ 十	熱浸鋅	620	30	650	支	百葉300mm用1支, 小於300用2支
7	特定			木尖 (木尖)		460	40	500	支	每窗4個 (後裝百葉)

 美特鋁質有限公司 MIDI Aluminium Fabricator Ltd.	類別	物料號				
	制圖	陳俊賢	2019.10.16	圖號	MT-GMB-03	
修改		復核	謝永林	2019.10.17	數量	650
日期		批准	Jason		位置	於後裝特別位百葉框四周

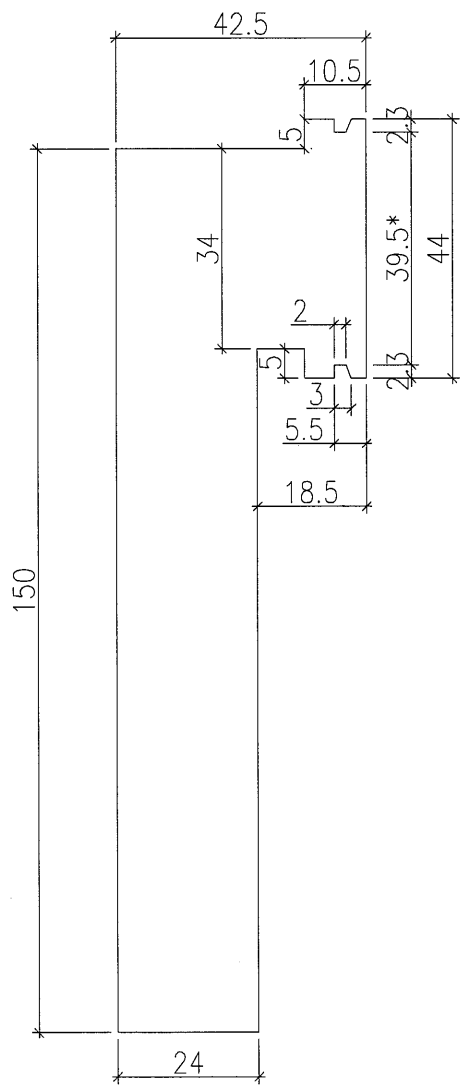


注：帶"*"號為重要尺寸


扭曲後圖樣

工程號	J-837	地盤	觀塘裕民坊	附 件	
名稱	後裝特別位百葉摩耳加工圖	採用			
材料	1.5mm厚鐵板	地盤	✓		
顏色	熱浸鋅	工廠			

 美特鋁質有限公司 MIDI Aluminium Fabricator Ltd.				類別	物料號			
修改				制圖	陳俊賢	2019.10.16	圖號	MT-GMB-04
日期				復核	謝永林	2019.10.17	數量	620
				批准	Jason		位置	於後裝特別位百葉框四周



扭曲後圖樣

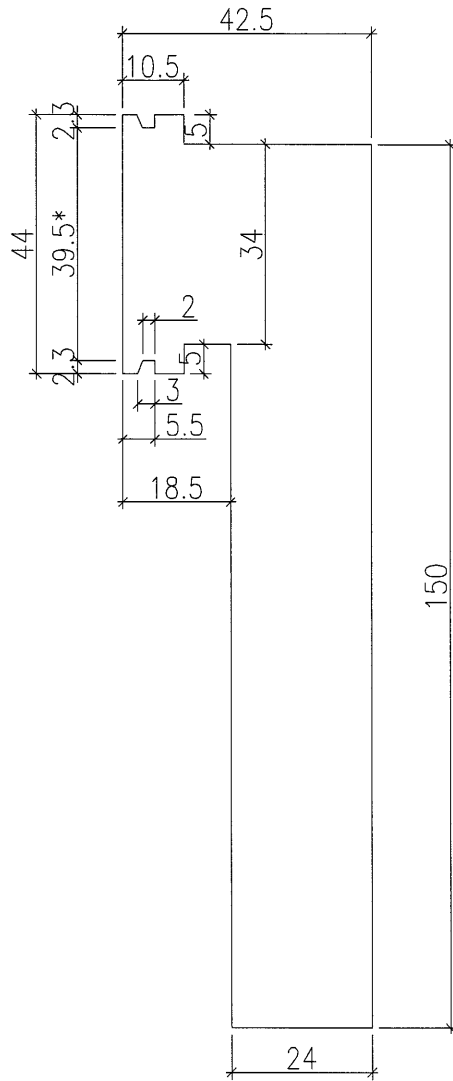

注：帶"*"號為重要尺寸

工程號	J-837	地盤	觀塘裕民坊	附 件
名稱	後裝特別位百葉摩耳加工圖	採用		
材料	1.5mm厚鐵板	地盤	✓	
顏色	熱浸鋅	工廠		
