

工程指示 / 要求簡箋(E.I.)

工程指示編號：EI/1669 / 20 修改版次：-  
 工程編號：J851 工程名稱：青衣 明翹匯  
 工程項目：配件 BM (後裝平台百葉)  
 收件人：廠生統 發件人：Leung Hin Wai 日期：7/4-2020

要求提供 /  確認 事項：

- |                                    |                                     |                               |
|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 初步鋁料 B.M. | <input type="checkbox"/> 加工拆圖，然後生產  | <input type="checkbox"/> 尺寸表  |
| <input type="checkbox"/> 正式鋁料 B.M. | <input type="checkbox"/> 技術上資料 / 指示 | <input type="checkbox"/> 報價   |
| <input type="checkbox"/> 配件 B.M.   | <input type="checkbox"/> 樣辦或貨品說明書   | <input type="checkbox"/> 分判合約 |
| <input type="checkbox"/> 其他：_____  |                                     |                               |

內容：

請按附頁 BM 訂配件。

請在 \_\_\_\_\_ 前完成上列要求。

附：- 1 + 3 頁

以上項目為：

- 原合約工程包                       原合約工程加 / 減賬                       新工程報價

原因：- \_\_\_\_\_

分發東莞各部門：

- ( ) 生產技術總監  連附件    ( ) 技術部     連附件    ( ) 生產部     連附件    ( ) 機械設計部  連附件  
 ( ) 採購部     連附件    ( ) 生產統籌部  連附件  
 ( ) 質檢部     連附件    ( ) 會計部     連附件    ( ) 報關組     連附件    ( ) 其他 \_\_\_\_\_  連附件

分發香港各部門：

- ( ) 行政部  連附件    ( ) 會計部  連附件    (✓) 統籌部  連附件    ( ) 工程部地盤科文(柄)  連附件  
 (✓) 採購部  連附件    ( ) QS 部  連附件    ( ) 維修部  連附件    ( ) 其他 \_\_\_\_\_  連附件

傳遞編號：


HK 0529

發件人簽署：

*Handwritten signature*

項目經理簽署：

*Handwritten signature*



美特鋁質有限公司  
MIDI Aluminium Fabricator Ltd.

工程號: J-851

計算: 吳祐瑜

日期: 31/3/2020

送呈: 施哥

地盤名稱: 青衣名薈匯

核對: 王禮秋

日期: 31/3/2020

副本:

廠用配件B.M.表

項目類別: 鋁百葉

批准:


日期: 1/4-2020

BM編號:

A/C Code:

此BM依據3.5收施工圖大樣計算

序號	修改標示	配件圖號	物料編號	配件名稱	顏色	實用	後備	總數	單位	備注
1				#8x1/2"圓頭鋼牙	S.S-316	4468	452	4920	粒	修雀仔網在百叶框上
2				#10x4/5"平頭鋼牙	S.S-316	561	59	620	粒	修百叶在雀仔網上
3				M5x15平頭機絲	S.S-316	1946	200	2146	粒	固定百葉玉企巴於窗框
4				M5x8平頭機絲	S.S-316	561	59	620	粒	固定百葉玉企巴於鋁角上
5				#10x1"平頭鋼牙	S.S-316	19236	1904	21140	粒	修百叶片(因是新機, 請厂里先适配)
6				M4x10圓頭自攻自鋁螺絲	S.S-316	20	5	25	粒	固定反拍線擋膠鋁角在邊企上
7				M5x35圓頭機絲	S.S-316	20	5	25	粒	固定反拍線在邊企上
8				M5x20平頭自攻自鋁螺絲	S.S-316	796	84	880	粒	固定盒子在百葉窗上
9				四寸保護膠紙	白色	307	33	340	卷	23m/卷
10				三寸保護膠紙	白色	307	33	340	卷	23m/卷
11				二寸保護膠紙	白色	307	33	340	卷	23m/卷
12				一寸保護膠紙	白色	307	33	340	卷	23m/卷
13				雀仔網 316	不銹鋼	1525	155	1680	米	規格: 12.5X12.5Xφ1.2, 寬1300MM
14				DC791 防水膠	深灰 Dark Grey	13	2	15	支	用于百叶窗反拍線防水用




美特鋁質有限公司  
MIDI Aluminium Fabricator Ltd.

地盤用配件B.M.表



BM編號:

工程號:	J-851	計算:	吳祚瑜	日期:	31/3/2020	送呈:	施哥
地盤名稱:	青衣名翹匯	核對:	王禮秋	日期:	31/3/2020	副本:	
項目類別:	鋁百葉	批准:		日期:	7/4-2020		
A/C Code:	此BM依據3.5收施工圖大樣計算						

序號	修改標示	配件圖號	物料編號	配件名稱	顏色	實用	後備	總數	單位	備注
1		款式見附圖	1851-MR2	摩爾	熱浸鋅	2965	300	3265	粒	用於鋁百葉梗窗邊企及頂橫
2			05-900001-0000-YL	HILTI X-U 27 P8 子彈釘	不銹鋼	2965	300	3265	個	窗及F, D門, 趟門四周固定
3			05-900000-CD27-00	HILTI 子彈	紅藥	2965	300	3265	個	配合子彈釘使用
4				D.C.791防水膠	<del>紅藥</del> 黑色	303	37	340	支	300ml / 支(牆邊防水膠, 2.8m/支)
5		材質: EPDM		50(L)12(寬)x4(高)側面墊膠	黑色	40	4	44	粒	鋁板四周側1/4處 硬度65±5(每片鋁板8粒)
6		材質: EPDM		20x9mm厚墊片 (L=150mm)	黑色	10	2	12	塊	用於梗窗鋁板底
7			Boncrete	防水劑(接觸劑)		10.6	1	11.6	公升	0.0125公升/米 框邊四周需填塞砂漿之位置
8			Snowcem	防水粉		27	3	30	公斤	0.0315公斤/米 混合水泥沙使用
9			Baralastic(Mastrseal 540)	防水油		229	21	250	公斤	0.135公斤/米 室內外 室外框邊四周150mm距離
10			HILTI HST 3-R	M10x90mm膨脹螺栓	S.S-316	80	10	90	粒	固定頂底鐵件在結構上
11				M5x25平頭自攻自鉗螺絲	S.S-316	160	20	180	粒	固定鋁通在鐵件上
12				M5x15圓頭自攻自鉗螺絲	S.S-316	104	16	120	粒	固定鋁槽在百葉頂底橫
13				#8x1/2"圓頭鋼牙	S.S-316	1100	100	1200	粒	修雀仔網在百葉框上
14				M5x15平頭機絲	S.S-316	579	61	640	粒	固定百葉玉在鋁通, 鋁槽上
15				木尖		3232		3232	個	

 美特鋁質有限公司 MIDI Aluminium Fabricator Ltd.				類別		物料號	
				制圖	黃漢卿	2020.3.18	圖號 J851-MR2
修改				復核		7/4-2020	數量 見BOM表
日期				批准			位置

## 用於50窗框底橫及FD門框底橫

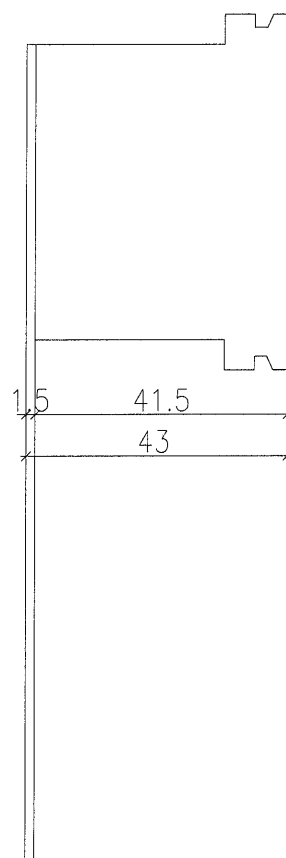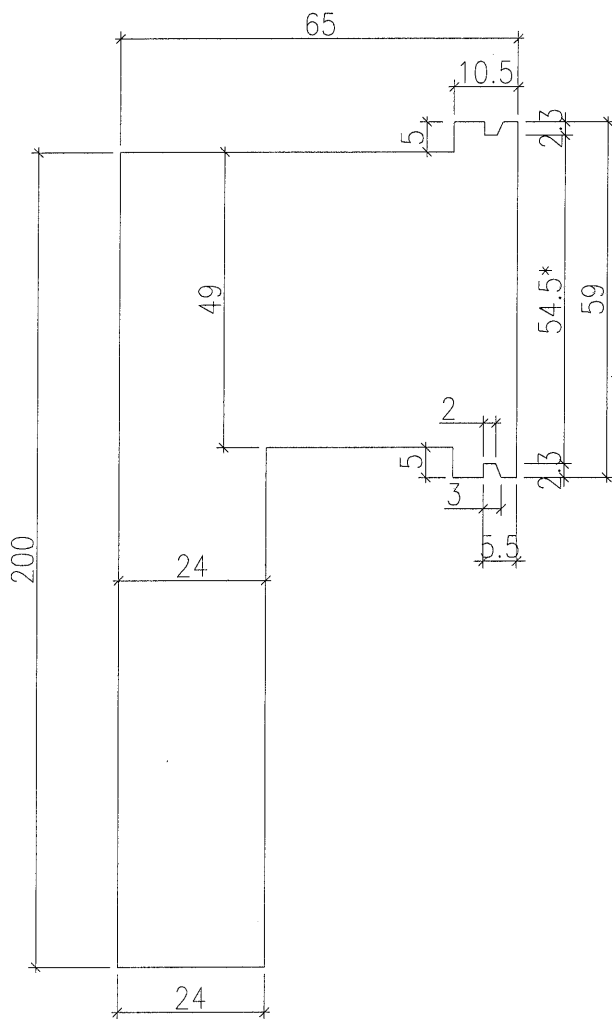

注：帶“\*”號為重要尺寸

扭曲後圖樣

1.5

工程號	J851	地盤	青衣名翹匯	附件
名稱	磨爾加工圖		採用	
材料	1.0mm厚鐵板		地盤	
顏色	熱浸鋅		工廠	
