



工程指示 / 要求簡箋 ENGINEER INSTRUCTIONS(E.I.)

工程指示編號:	EI- 4976	修改版本:	-
	HK- 1312		
工程編號:	J 853	工程名稱:	大窩坪 (延坪道)
收件人:	生統 / 謝永林	發件人:	Lai Sik Hung
工程項目:	補訂鎖點 (WT-08 鎖點問題)	日期:	10/08/2022

<input type="checkbox"/> 原合約工程包	<input type="checkbox"/> 原合約工程加 / 減賬 QT-	<input type="checkbox"/> 新工程報價 QT-
---------------------------------	--	------------------------------------

信件批核號碼/圖紙參考編號:	批核模具圖紙編號:
客戶指示附件:	管理內部批簽署:

<input type="checkbox"/> 初步鋁料 B.M.	<input type="checkbox"/> 加工拆圖, 然後生產	<input type="checkbox"/> 尺寸表
<input type="checkbox"/> 正式鋁料 B.M.	<input type="checkbox"/> 技術上資料 / 指示	<input type="checkbox"/> 報價
<input type="checkbox"/> 配件 B.M.	<input type="checkbox"/> 樣辦或貨品說明書	<input type="checkbox"/> 分判合約
<input type="checkbox"/> 其他:		

內容: 請安排補訂鎖點 (WT-08鎖點問題)

因窗玉開關時, 鎖點會與框料有碰撞,
所以需要補訂較短的鎖點配合生產.

完成上列要求日期: 15/08/2022


國內

<input type="checkbox"/> 生產技術總監	<input type="checkbox"/> 連附件	<input checked="" type="checkbox"/> 技術部	<input checked="" type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 生產部	<input type="checkbox"/> 連附件
<input type="checkbox"/> 採購部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input checked="" type="checkbox"/> 生產統籌部	<input checked="" type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 報關組	<input type="checkbox"/> 連附件
<input type="checkbox"/> 質檢部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 會計部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 機械設計部	<input type="checkbox"/> 連附件
<input checked="" type="checkbox"/> 香港辦	<input checked="" type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 其他:			




<input type="checkbox"/> 行政部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 會計部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 統籌部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 工程部	<input type="checkbox"/> 連附件
<input type="checkbox"/> 採購部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> QS部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 地盤管理	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 維修部	<input type="checkbox"/> 連附件

*發件人簽署:		*組別成員批核簽署:	
傳遞編號:		項目經理簽署:	

 美特鋁質 有限公司 MIDI Aluminium Fabricator Ltd.		工程號:	J-853	計算:	LAI SIK HUNG	日期:	10/8/2022	送呈:	胡哥
		地盤名稱:	香港延坪道	核對:		日期:		副本:	
廠用配件BM表		項目類別:	CURTAIN WALL	批准:		日期:			
BM編號:		修改版次:		A/C Code:		總重量KG:			
序號	修改內容	圖號	配件名稱	顏色	實用	後備	總數	單位	備注
1			駿華 J047鎖點 (11mm高)	#304不銹鋼	8000	100	8100	件	
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
				合計			8100		

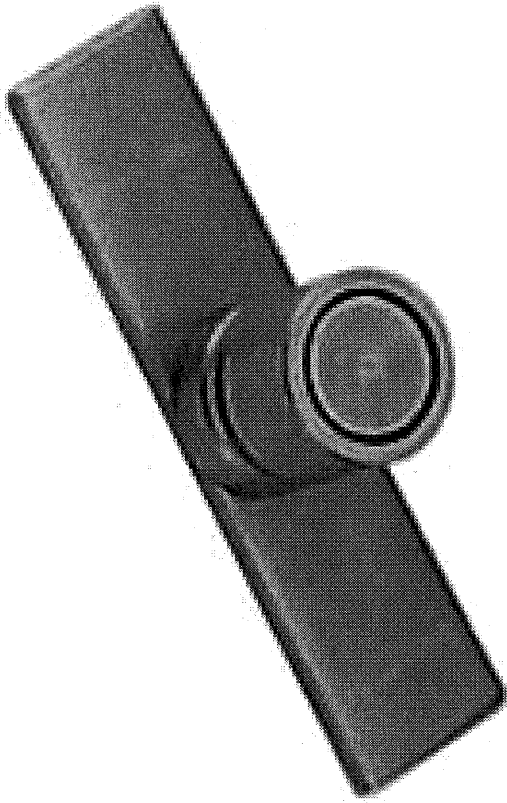

J047

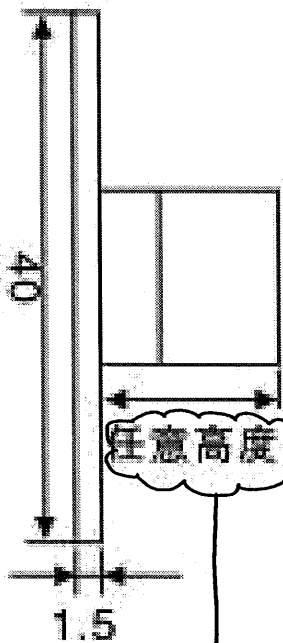

Φ11mm
1/20

9:09

VoLTE 4G LTE1 88%



天然林



煩請看下 J853-SD-CW-4608 ,
25F,26F 浴缸位,欄河高度是不是
297.5 , 還是另外要加高 ?

週一 下午12:29

大明哥回覆是 297.5 不用加高



週一 下午1:55



OK,

昨天 上午10:01



☎ 通話時長 04:15

昨天 上午10:09



TO 方強 - (答覆) WT08-J853 單元件
SH 窗鎖點鎖扣選用問題-R1,如用俊
華鎖點 12.5 高的, sh 窗
530X4=2120 企用, T 窗約 930 只,
用了底部中橫 14.5, 企用
930X6=5880, 合計 7700+100 后
備=7800

2120+5880+100 = 8100

