

工程指示 / 要求簡箋 ENGINEER INSTRUCTIONS(E.I.)

| | | | |
|---------|--|-------|--------------|
| 工程指示編號: | EI- 5344A | 修改版本: | A |
| | HK- 2347 | | |
| 工程編號: | J 856 | 工程名稱: | 天榮站 |
| 收件人: | Maggie Lor | 發件人: | Lai Sik Hung |
| 工程項目: | VMU 幕牆單元件生產 - 玻璃BM(修訂A:因修改死牆位設計,所以需新增死牆玻璃) | 日期: | 21/12/2022 |

| | | |
|---------------------------------|--|------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 原合約工程包 | <input type="checkbox"/> 原合約工程加 / 減賬 QT- | <input type="checkbox"/> 新工程報價 QT- |
|---------------------------------|--|------------------------------------|

| | |
|----------------|-----------|
| 信件批核號碼/圖紙參考編號: | 批核模具圖紙編號: |
| 客戶指示附件: | 管理內部批簽署: |

| | | |
|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 初步鋁料 B.M. | <input type="checkbox"/> 加工拆圖, 然後生產 | <input type="checkbox"/> 尺寸表 |
| <input type="checkbox"/> 正式鋁料 B.M. | <input type="checkbox"/> 技術上資料 / 指示 | <input type="checkbox"/> 報價 |
| <input type="checkbox"/> 配件 B.M. | <input type="checkbox"/> 樣辦或貨品說明書 | <input type="checkbox"/> 分判合約 |
| <input type="checkbox"/> 其他: | | |


| |
|------------------------------------|
| 內容: 修訂A: 因修改死牆位設計,所以需新增死牆玻璃 |
| VMU 幕牆單元件生產 - 玻璃BM 此玻璃訂單均需要熱浸處理 |
| 完成上列要求日期: 02/01/2023 |

國內

| | | | | | |
|---|---|---|---|--------------------------------|------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 生產技術總監 | <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 技術部 | <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 生產部 | <input type="checkbox"/> 連附件 |
| <input type="checkbox"/> 採購部 | <input type="checkbox"/> 連附件 | <input checked="" type="checkbox"/> 生產統籌部 | <input checked="" type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 報關組 | <input type="checkbox"/> 連附件 |
| <input type="checkbox"/> 質檢部 | <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 會計部 | <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 機械設計部 | <input type="checkbox"/> 連附件 |
| <input checked="" type="checkbox"/> 香港辦 | <input checked="" type="checkbox"/> 連附件 | <input checked="" type="checkbox"/> 其他: 林仁安 | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|------------------------------|------------------------------|-------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 行政部 | <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 會計部 | <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 統籌部 | <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 工程部 | <input type="checkbox"/> 連附件 |
| <input checked="" type="checkbox"/> 採購部 | <input checked="" type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> QS部 | <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 地盤管理 | <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 維修部 | <input type="checkbox"/> 連附件 |

| | | | |
|---------|--|------------|--|
| *發件人簽署: | | *組別成員批核簽署: | |
| 傳遞編號: | | 項目經理簽署: | |

| | | | | |
|--|-------------|---------|----------------|--------|
|  | 工程號: J-856 | 計算: 劉傑 | 日期: 2022.11.08 | 送呈: 威哥 |
| | 地盤名稱: 天榮站 | 核對: 徐詳坤 | 日期: 2022.11.09 | 副本: 鴻仔 |
| | 項目類別: VMU | 批准: 林仁安 | 日期: 2022.11.09 | |
| | A/C Code: A | 數量: 48 | 計玻璃面積 (平方米) | 40.477 |

| 序號 | 修改標示 | 顏色與名稱 | 厚度(mm) | 玻璃尺寸 | | 面積(平方米) | | 備註 |
|----|------|------------|--------|--------|--------|---------|--------|----------|
| | | | | 寬度(mm) | 高度(mm) | 單件 | 總面積 | |
| 1 | | PT-GL1-A01 | | 614 | 840 | 0.516 | 3.095 | 見GL1-F01 |
| 2 | 修訂A: | PT-GL1-A05 | | 921.5 | 2005 | 1.848 | 5.543 | 見GL1-F01 |
| 3 | 增加數量 | PT-GL1-B01 | 30.00 | 614 | 1105 | 0.678 | 4.071 | 見GL1-F01 |
| 4 | | PT-GL1-C07 | | 1678.5 | 2005 | 3.365 | 10.096 | 見GL1-F02 |
| 5 | | PT-GL1-C08 | | 761 | 840 | 0.639 | 1.918 | 見GL1-F03 |
| 6 | | PT-GL1-B04 | | 761 | 1105 | 0.841 | 2.523 | 見GL1-F03 |
| 7 | | PT-GL5-C02 | 12.00 | 597 | 122 | 0.073 | 0.219 | 見GL5-F01 |
| 8 | | PT-GL5-A01 | | 570 | 122 | 0.070 | 0.417 | 見GL5-F01 |
| 9 | 修訂A: | PT-GL4-A01 | | 614 | 915 | 0.562 | 3.371 | 見GL4-F01 |
| 10 | 新增款式 | PT-GL4-A05 | | 921.5 | 915 | 0.843 | 2.530 | 見GL4-F01 |
| 11 | | PT-GL4-C07 | 12.00 | 1678.5 | 915 | 1.536 | 4.607 | 見GL4-F01 |
| 12 | | PT-GL4-C08 | | 761 | 915 | 0.696 | 2.089 | 見GL4-F01 |
| | | | | 總合計: | | 48 | 40.477 | |

1). 本表中所有玻璃對角線尺寸偏差要求不超過正負2mm.

2). 本表中所有玻璃要求粗磨邊處理並倒棱角.


3). 本表中玻璃要求粗磨邊處理並倒棱角, 欄河玻璃頂底要精磨邊, 而所有玻璃之入爐方向需保持一致。



4). 本表中不同種類玻璃參照玻璃加工圖加工。

5). 本表中所有強化玻璃均需HEAT SOAK TEST。

6). 本表中所有玻璃均需注明室內外面及其玻璃編號, 以便識別。


加工注意事項:



| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|------|------|----|------|------------|----|---------|------------|------|--------|
|  美特鋁質有限公司 MIDI Aluminium Fabricator Ltd. | | | | 工程號 | J856 | 類別 | | 物料號 | - | | | | |
| | | | | 地盘 | 天榮站 | 制圖 | 劉燦 | 2022-10-18 | 圖號 | GL1-F01 | | | |
| 修改 | - | - | - | 採用工廠 | ✓ | 地盘 | 图纸名称 | 玻璃加工图 | 復核 | 徐詳坤 | 2022-19-19 | 數量 | - |
| 日期 | - | - | - | 材料颜色 | | | 材料 | GLASS | 批准 | 林仁安 | 2022-10-19 | 單件重量 | - (KG) |

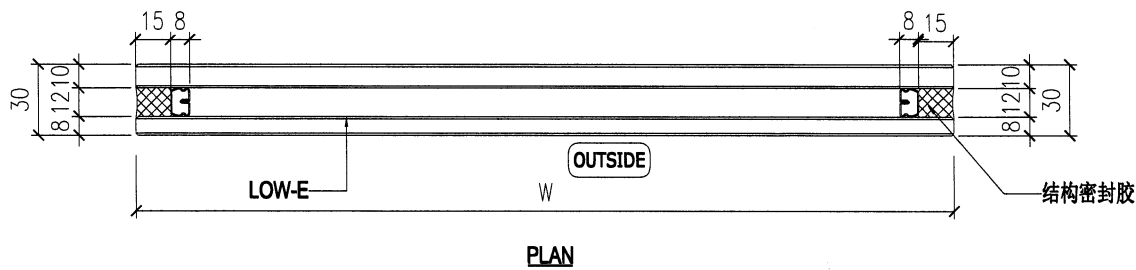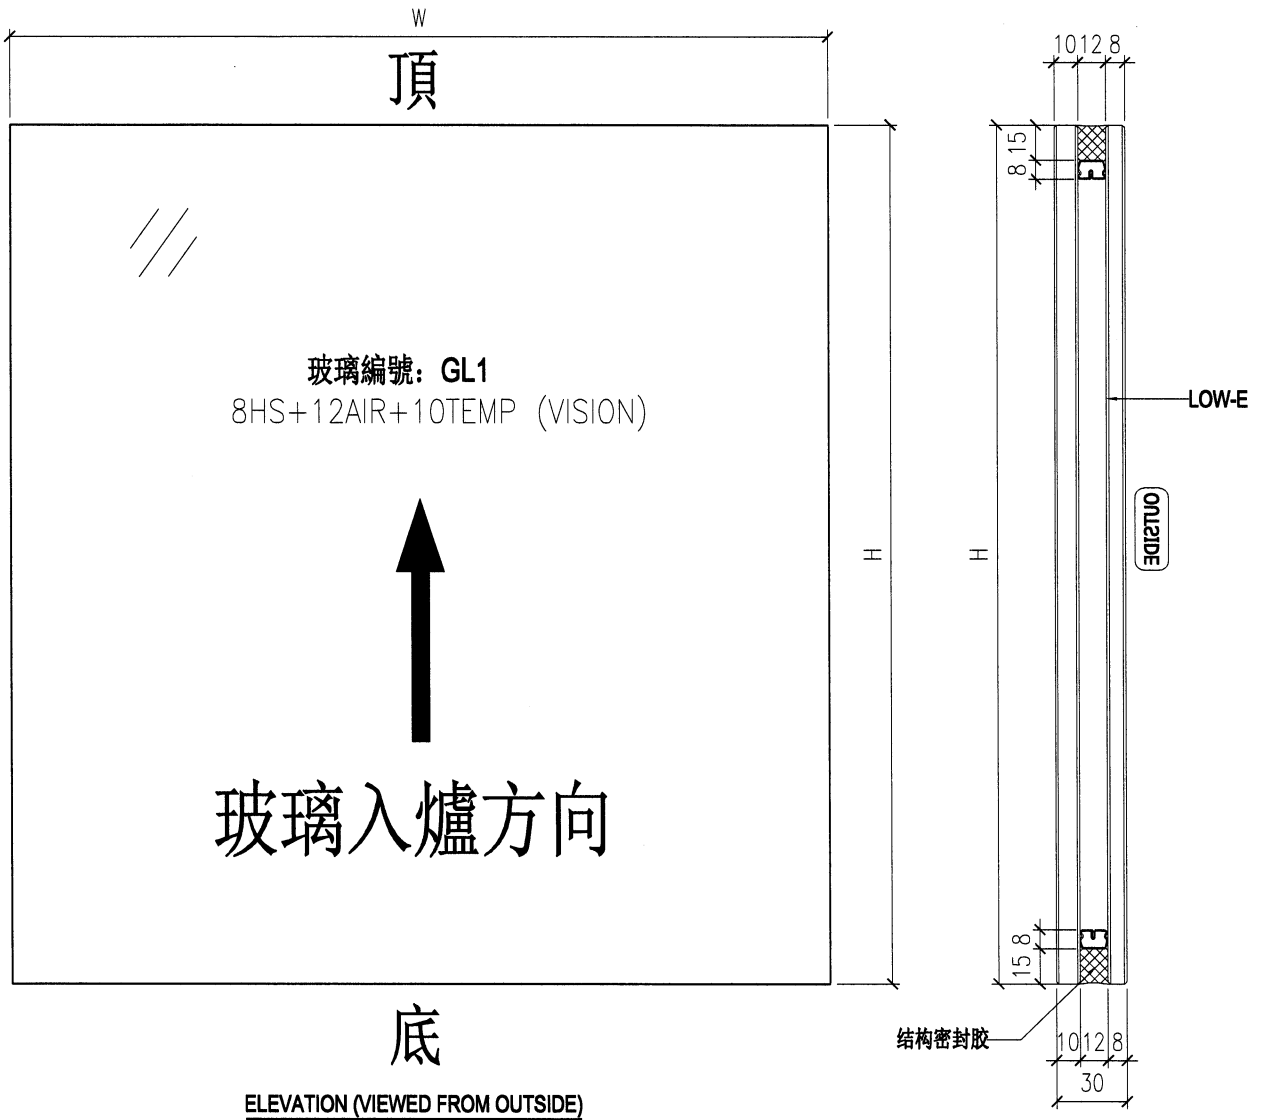

NOTES


1. ALL DIMENSION IN mm
2. ALL EDGE CHAMFER 1x1x45



| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|------|------|----|------|-------|----|-----|------------|------|---------|
|  美特鋁質有限公司 MIDI Aluminium Fabricator Ltd. | | | 工程號 | J856 | 類別 | | 物料號 | - | | | | |
| 修改 | - | - | 採用工廠 | ✓ | 地盤 | 圖紙名稱 | 玻璃加工圖 | 制圖 | 劉燦 | 2022-10-18 | 圖號 | GL1-F02 |
| 日期 | - | - | 材料顏色 | | | 材料 | GLASS | 復核 | 徐詳坤 | 2022-19-19 | 數量 | - |
| | | | | | | | | 批准 | 林仁安 | 2022-10-19 | 單件重量 | - (KG) |

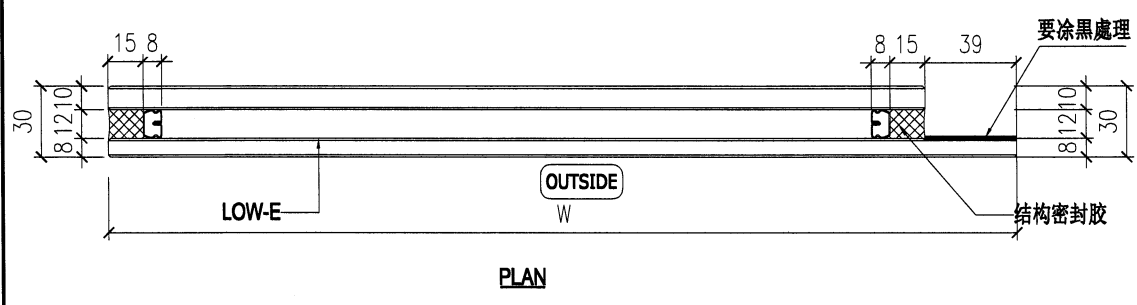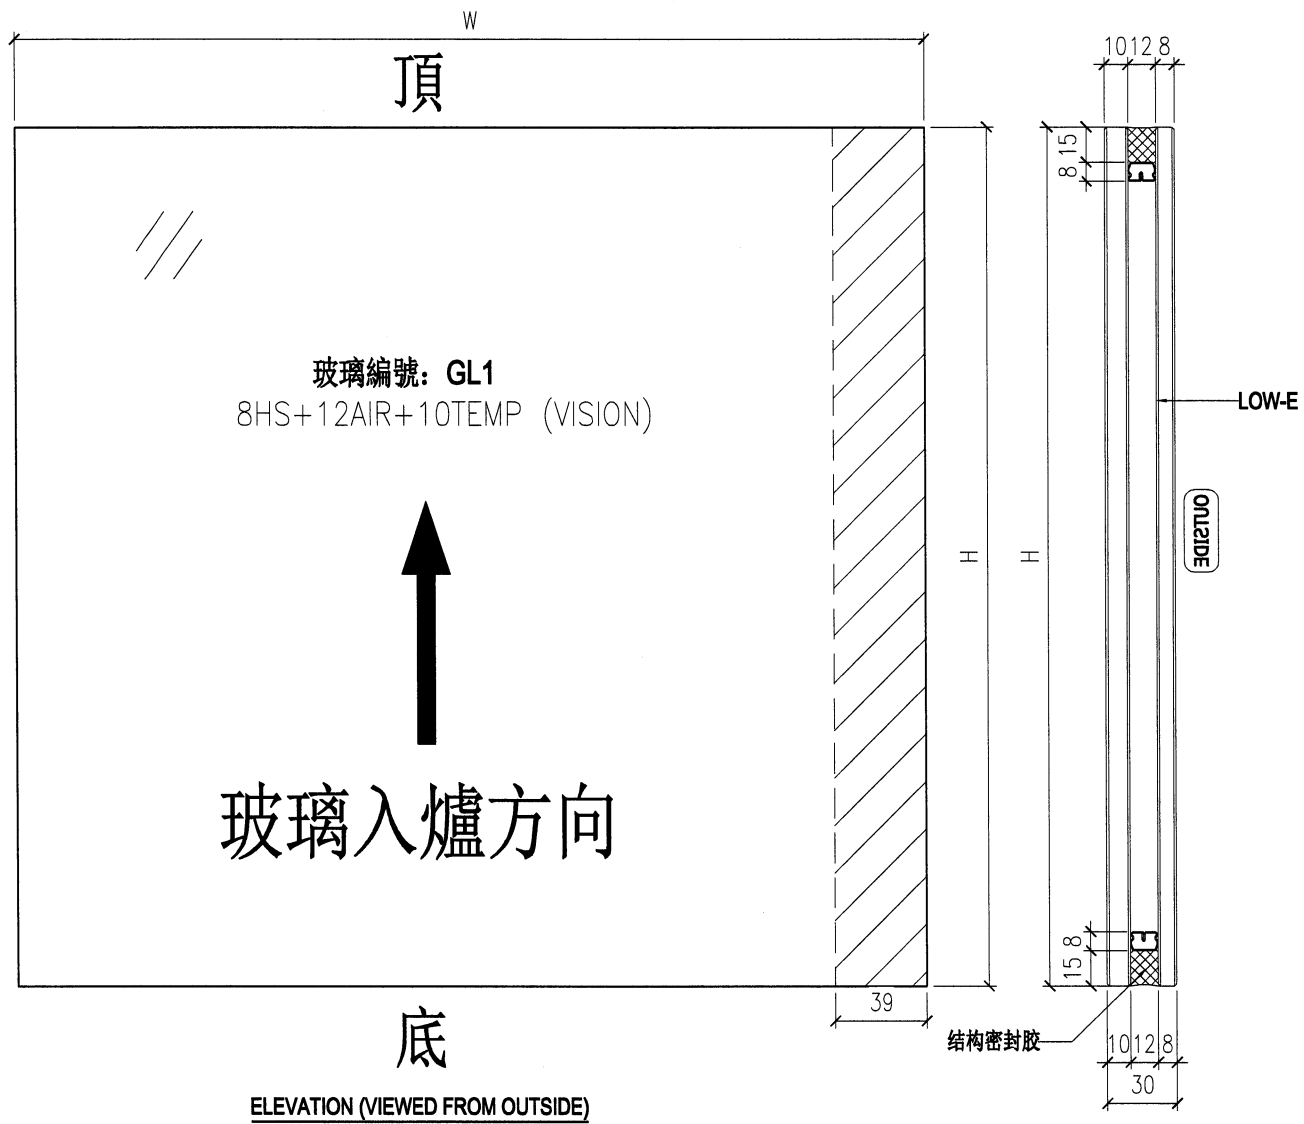

NOTES


1. ALL DIMENSION IN mm
2. ALL EDGE CHAMFER 1x1x45



| | | | | | |
|--|-------------|---------------|-------------------|---------------|--------------------|
|  美特鋁質有限公司 MIDI Aluminium Fabricator Ltd. | | | 工程號 J856 | 類別 | 物料號 - |
| 地盤 天榮站 | | | 制圖 劉燦 | 2022-10-18 | 圖號 GL1-F03 |
| 修改 - | 日期 - | 採用工廠 ✓ | 圖紙名稱 玻璃加工圖 | 復核 徐詳坤 | 2022-19-19 |
| 材料顏色 | | | 材料 GLASS | 批准 林仁安 | 數量 - |
| | | | | | 單件重量 - (KG) |

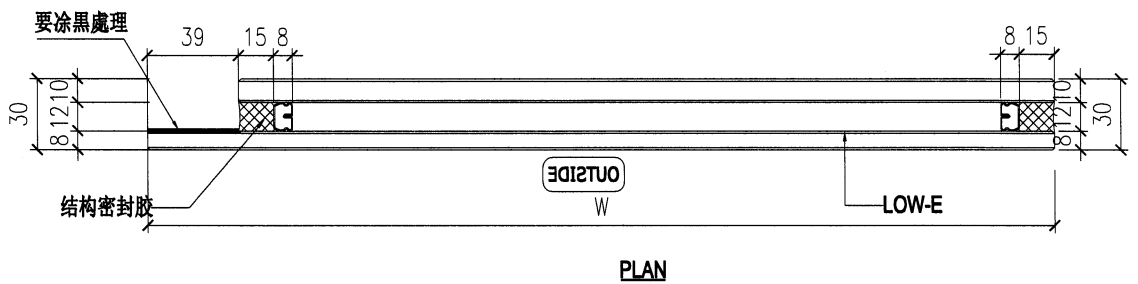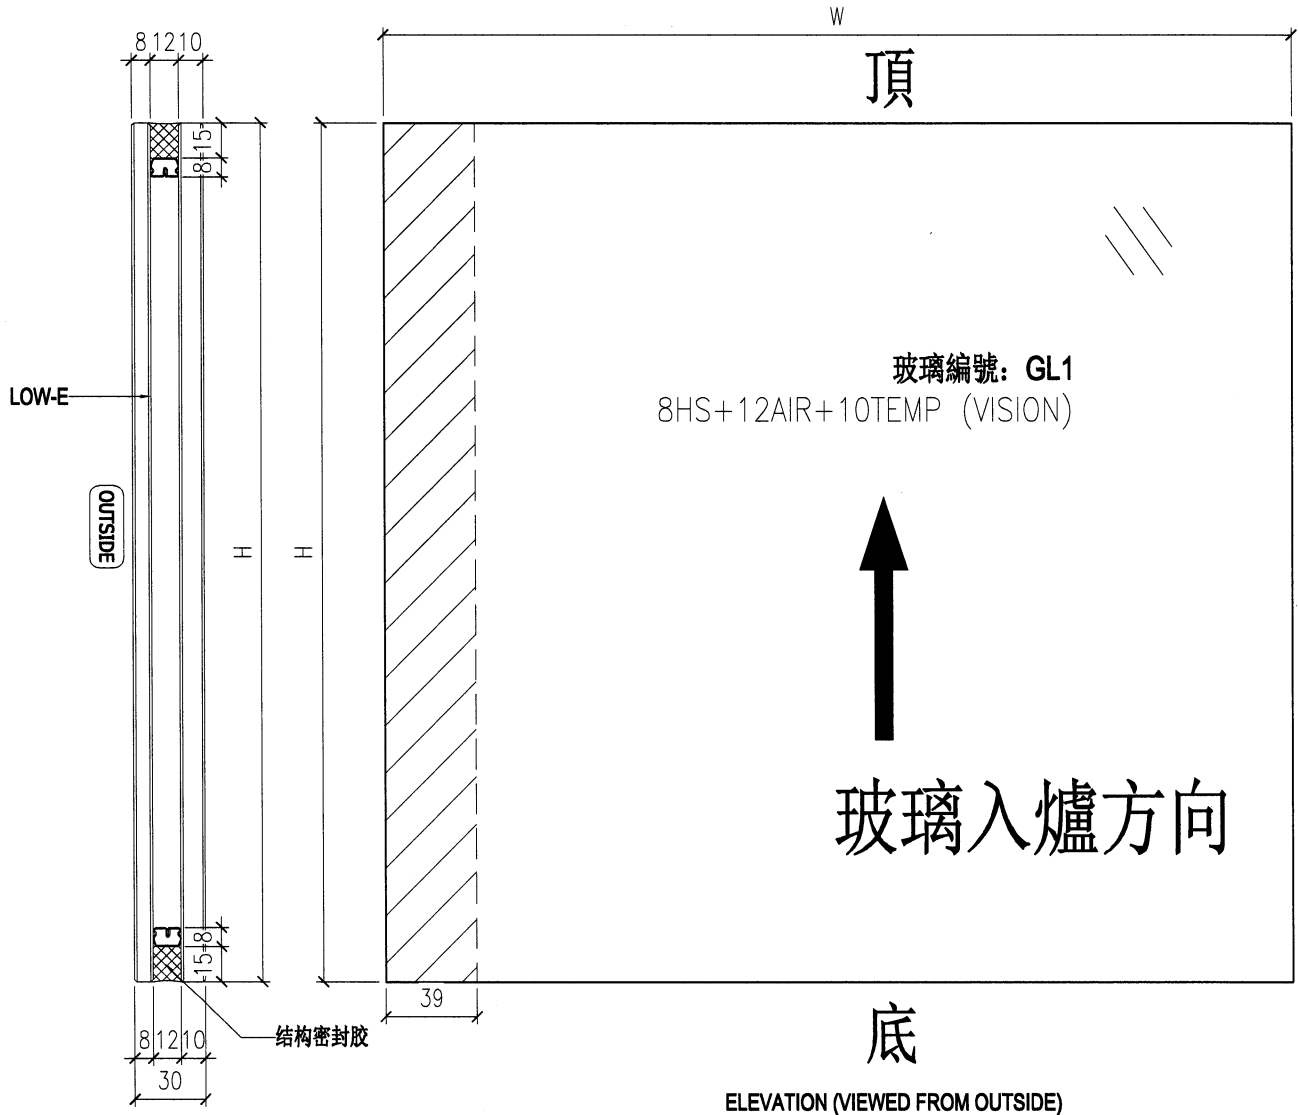

NOTES


1. ALL DIMENSION IN mm
2. ALL EDGE CHAMFER 1x1x45



| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|------|------|----|----|------------|-------|----------|-----|------------|------|--------|
|  美特鋁質有限公司 MIDI Aluminium Fabricator Ltd. | | | | 工程號 | J856 | 類別 | | 物料號 | - | | | | | |
| | | | | 地盘 | 天榮站 | 制圖 | 劉燦 | 2022-10-18 | 圖號 | GL1A-F02 | | | | |
| 修改 | - | - | - | 採用工廠 | ✓ | 地盤 | | 图纸名称 | 玻璃加工图 | 復核 | 徐詳坤 | 2022-19-19 | 數量 | - |
| 日期 | - | - | - | 材料颜色 | | | | 材料 | GLASS | 批准 | 林仁安 | 2022-10-19 | 單件重量 | - (KG) |

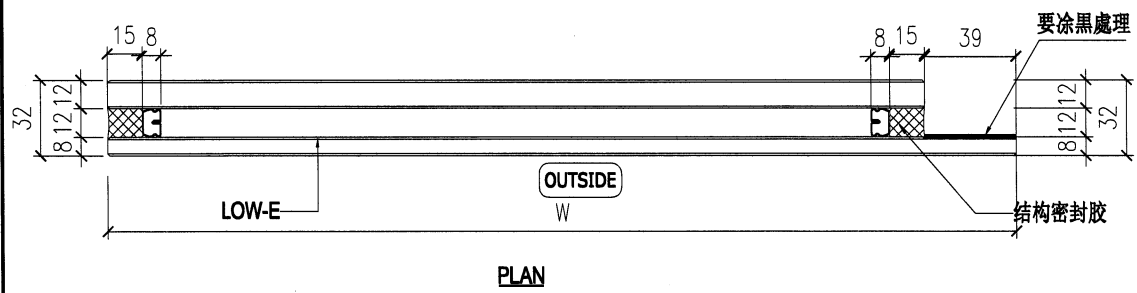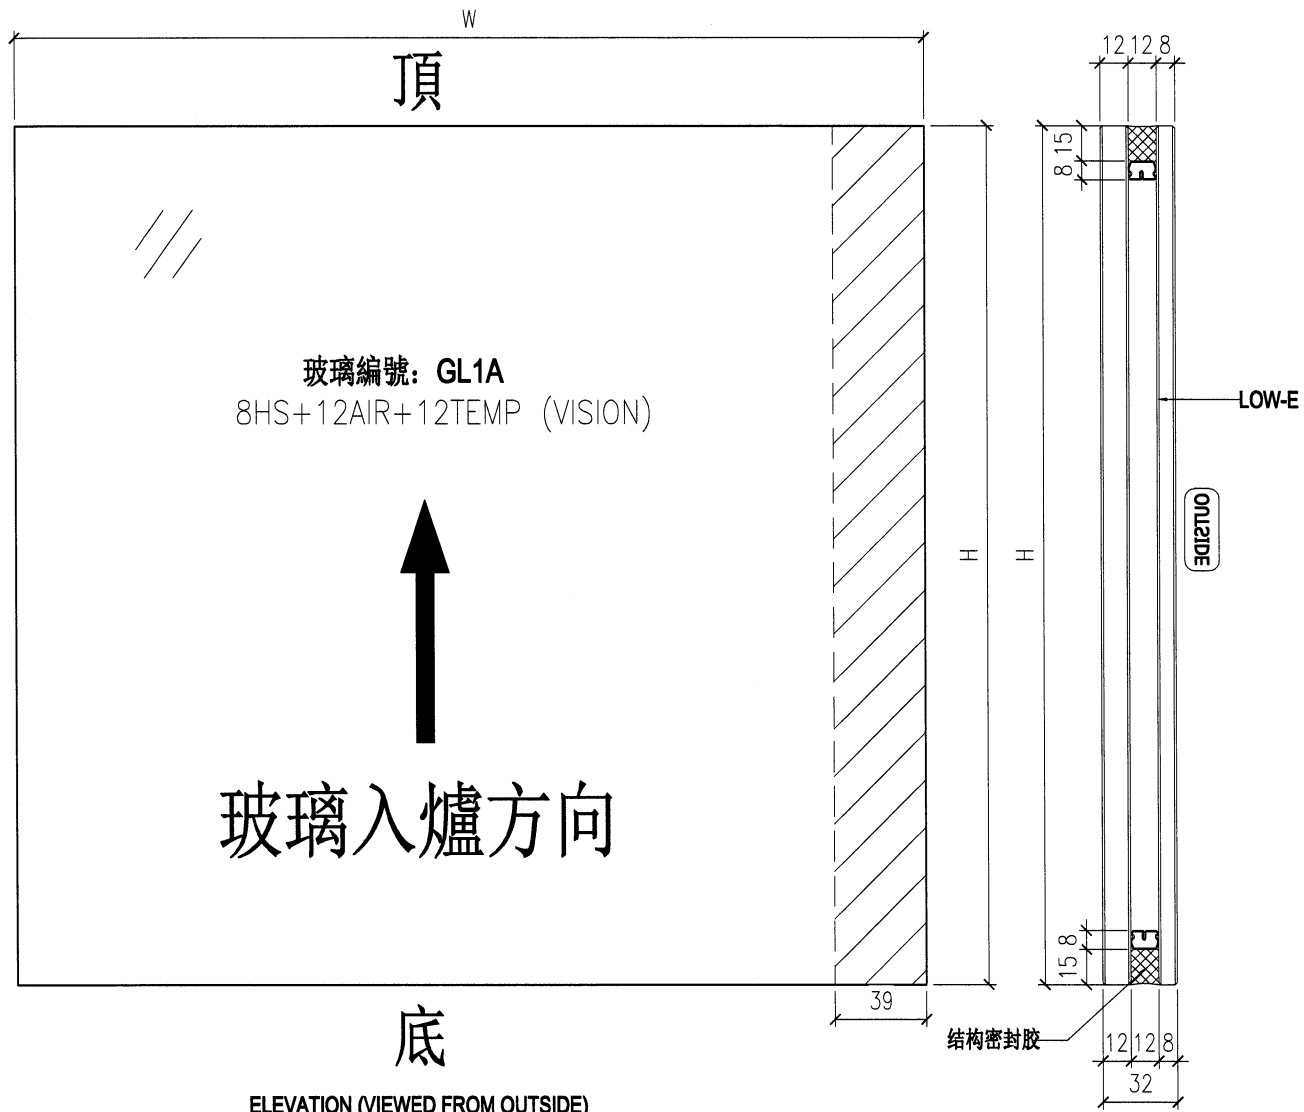

NOTES



1. ALL DIMENSION IN mm
2. ALL EDGE CHAMFER 1x1x45

| | | | | | | | | |
|--|--------|--------|---|------------------------|------------------|--------------------------|----------------|------|
|  美特鋁質有限公司 MIDI Aluminium Fabricator Ltd. | | | | 工程號 J856 地盘 天榮站 | 類別 制圖 劉燦 | 物料號 - 2022-10-18 | 圖號 GL4-F01 | |
| 修改 - 日期 - | - - | - - | 採用工廠 <input checked="" type="checkbox"/> 地盘 材料颜色 | 图纸名称 玻璃加工图 材料 GLASS | 復核 徐詳坤 批准 林仁安 | 2022-10-19 2022-10-19 | 數量 - 單件重量 - | (KG) |

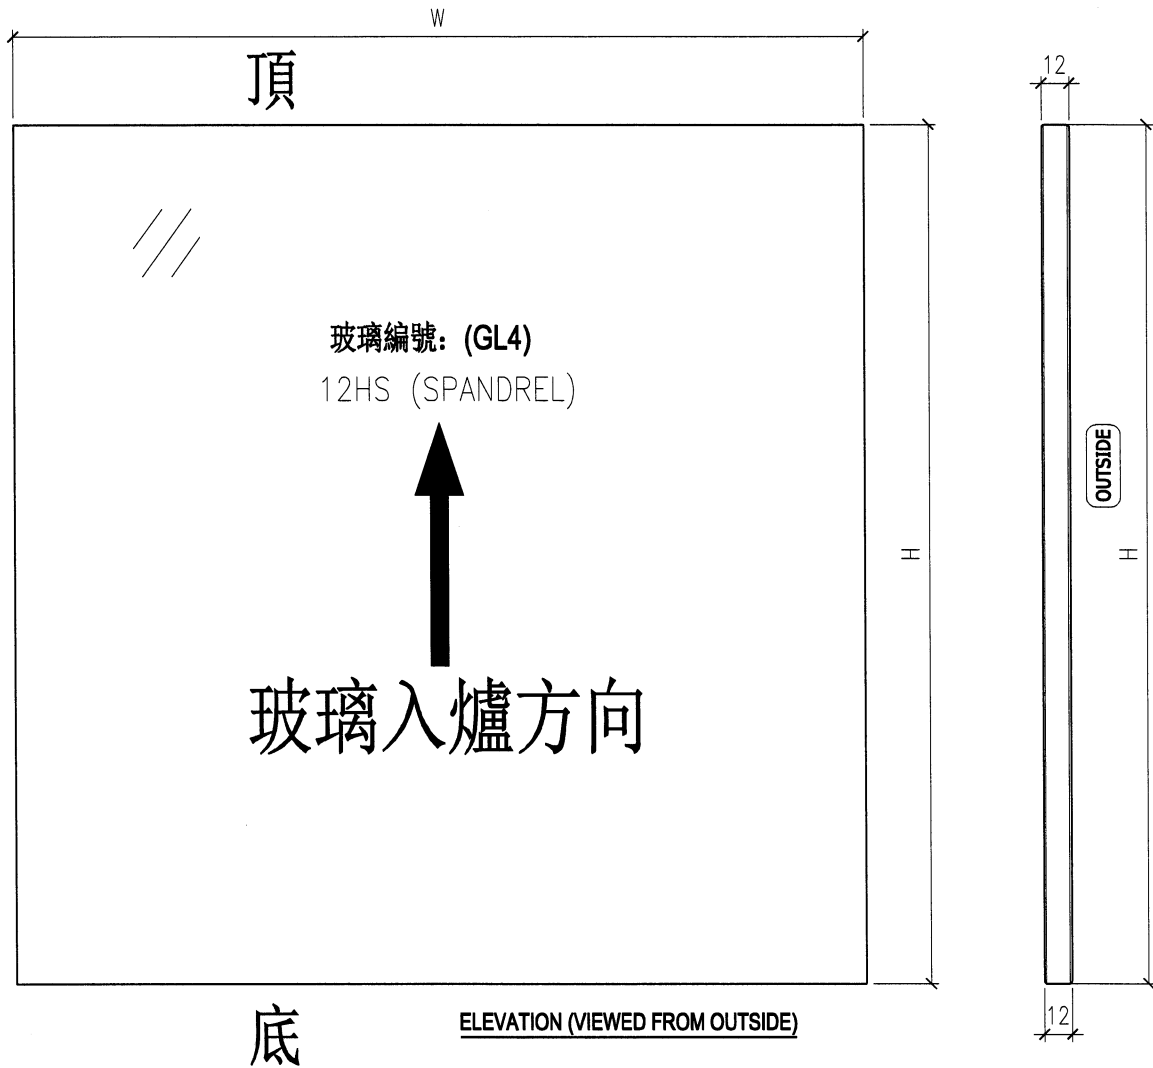


NOTES
 1. ALL DIMENSION IN mm
 2. ALL EDGE CHAMFER 1x1x45

| | | | | | | |
|--|---|------------------------|--------------------|--------------------------|---------------------|------------|
|  美特鋁質有限公司 MIDI Aluminium Fabricator Ltd. | | | 工程號 J856 地盘 天榮站 | 類別 制圖 劉燦 | 物料號 - 2022-10-18 | 圖號 GL5-F01 |
| 修改 - 日期 - | 採用工廠 <input checked="" type="checkbox"/> 地盘 材料颜色 | 图纸名称 玻璃加工图 材料 GLASS | 復核 徐詳坤 批准 林仁安 | 2022-10-19 2022-10-19 | 數量 - 單件重量 - | - (KG) |

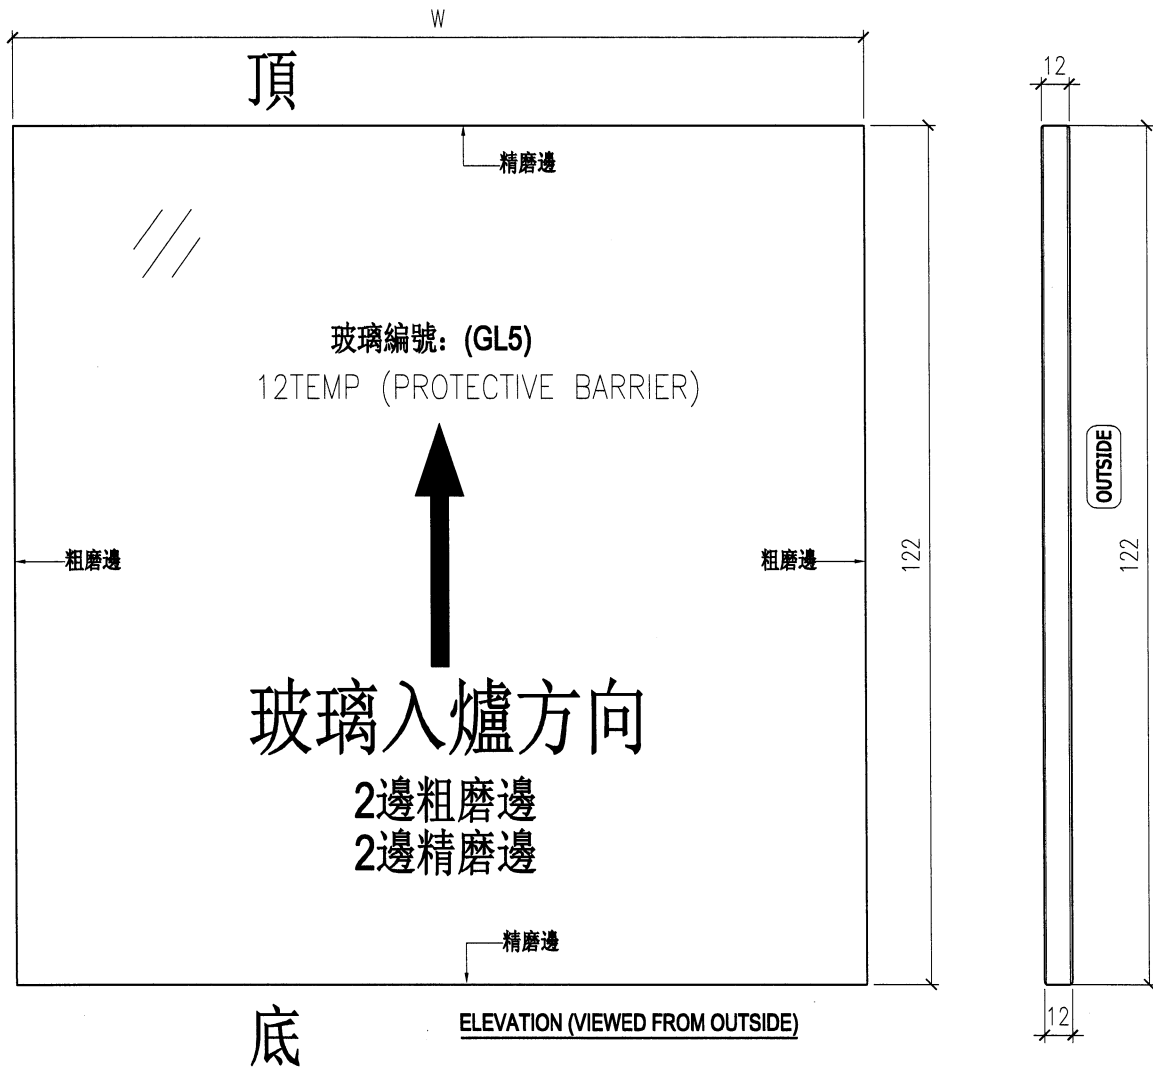

NOTES
 1. ALL DIMENSION IN mm
 2. ALL EDGE CHAMFER 1x1x45



美特鋁質有限公司
MIDI Aluminium Fabricator Ltd.

工程號 J856
地盘 天榮站

類別
制圖 陈梓豪

物料號 -
2022-10-19

圖號 PT-VMU-C000

修改
日期

採用工廠
材料顏色


图纸名 玻璃编号图
材料 玻璃位置圖

復核 练松文
批准 林仁安

2022-10-19
2022-10-19


數量 -
單件重量

(KG)

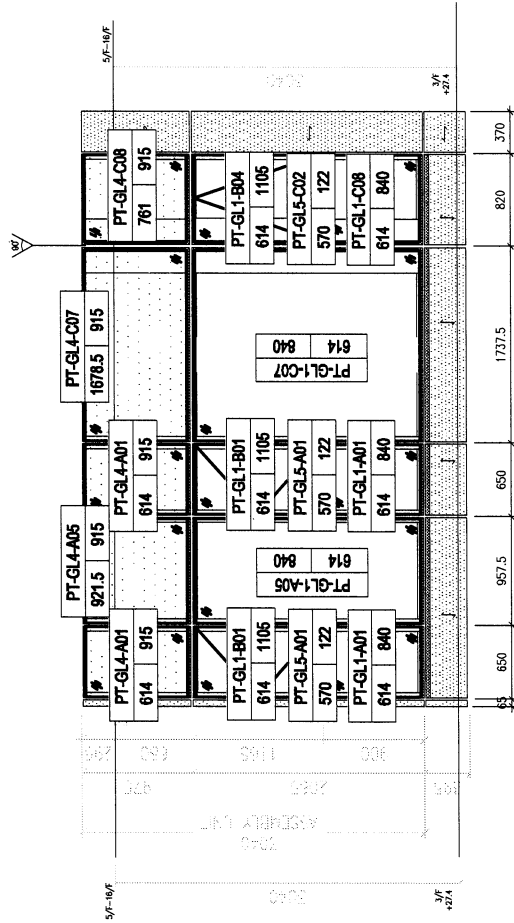

- 8HS+12AIR+10TEMP (VISION)
 - 12HS (SPANDREL)
 - 12TEMP (PROTECTIVE BARRIER)
 - 8HS+12AIR+12TEMP (VISION)
- G1
G4
G5
G1A

核對用

|  | | 工程號: J-856 | 計算: 劉潔 | 日期: 2022.11.08 | 送呈: 威哥 | | | | |
|--|------|-------------|---------|--------------------|--------|--------|---------|--------|----------|
| | | 地盤名稱: 天榮站 | 核對: 徐詳坤 | 日期: 2022.11.09 | 副本: 鴻仔 | | | | |
| 廠用玻璃B.M.表 | | 項目類別: VMU | 批准: 林仁安 | 日期: 2022.11.09 | | | | | |
| BM編號: | | A/C Code: A | 數量: 48 | 計玻璃面積 (平方米) 40.477 | | | | | |
| 序號 | 修改標示 | 顏色與名稱 | 厚度(mm) | 玻璃尺寸 | | 數量 (塊) | 面積(平方米) | | 備註 |
| | | | | 寬度(mm) | 高度(mm) | | 單件 | 總面積 | |
| 1 | | PT-GL1-A01 | | 614 | 840 | 6 | 0.516 | 3.095 | 見GL1-F01 |
| 2 | 修訂A: | PT-GL1-A05 | | 921.5 | 2005 | 3 | 1.848 | 5.543 | 見GL1-F01 |
| 3 | 增加數量 | PT-GL1-B01 | | 614 | 1105 | 6 | 0.678 | 4.071 | 見GL1-F01 |
| 4 | | PT-GL1-C07 | 30.00 | 1678.5 | 2005 | 3 | 3.365 | 10.096 | 見GL1-F02 |
| 5 | | PT-GL1-C08 | | 761 | 840 | 3 | 0.639 | 1.918 | 見GL1-F03 |
| 6 | | PT-GL1-B04 | | 761 | 1105 | 3 | 0.841 | 2.523 | 見GL1-F03 |
| 7 | | PT-GL5-C02 | | 597 | 122 | 3 | 0.073 | 0.219 | 見GL5-F01 |
| 8 | | PT-GL5-A01 | 12.00 | 570 | 122 | 6 | 0.070 | 0.417 | 見GL5-F01 |
| 9 | 修訂A: | PT-GL4-A01 | | 614 | 915 | 6 | 0.562 | 3.371 | 見GL4-F01 |
| 10 | 增加數量 | PT-GL4-A05 | | 921.5 | 915 | 3 | 0.843 | 2.530 | 見GL4-F01 |
| 11 | 新增款式 | PT-GL4-C07 | 12.00 | 1678.5 | 915 | 3 | 1.536 | 4.607 | 見GL4-F01 |
| 12 | | PT-GL4-C08 | | 761 | 915 | 3 | 0.696 | 2.089 | 見GL4-F01 |
| | | | | 總合計: | | 48 | | | 40.477 |
| <p>1). 本表中所有玻璃對角線尺寸偏差要求不超過正負2mm.</p> <p>2). 本表中所有玻璃要求粗磨邊處理並倒棱角.</p> <p>3). 本表中玻璃要求粗磨邊處理並倒棱角, 攔河玻璃頂底要精磨邊, 而所有玻璃之入爐方向需保持一致.</p> <p>4). 本表中不同種類玻璃參照玻璃加工圖加工.</p> <p>5). 本表中所有強化玻璃均需HEAT SOAK TEST.</p> <p>6). 本表中所有玻璃均需注明室內外面及其玻璃編號, 以便識別.</p> | | | | | | | | | |
| 加工注意事項: | | | | | | | | | |
