



工程指示 / 要求簡箋 ENGINEER INSTRUCTIONS(E.I.)

工程指示編號:	EI- 7374	修改版本:	-
	HK- 0348		
工程編號:	J 856	工程名稱:	天榮站
收件人:	生統/ Manjia	發件人:	Iris
工程項目:	幕牆補訂玻璃2件(地盤用)	日期:	01/03/2024

<input checked="" type="checkbox"/> 原合約工程包	<input type="checkbox"/> 原合約工程加 / 減脹 QT-	<input type="checkbox"/> 新工程報價 QT-
--	--	------------------------------------

信件批核號碼/圖紙參考編號:	批核模具圖紙編號:
客戶指示附件:	管理內部批簽署:

<input type="checkbox"/> 初步鋁料 B.M.	<input type="checkbox"/> 加工拆圖, 然後生產	<input type="checkbox"/> 尺寸表
<input type="checkbox"/> 正式鋁料 B.M.	<input type="checkbox"/> 技術上資料/指示	<input type="checkbox"/> 報價
<input type="checkbox"/> 配件 B.M.	<input type="checkbox"/> 樣辦或貨品說明書	<input type="checkbox"/> 分判合約
<input type="checkbox"/> 其他:		

內容: 幕牆補訂玻璃2件 (GL4-CB03, GL4-CC09(各一件), 可參考EI5364E), 涉及單元為CW-T034, CW-T201A  要做鋼化, 分層包裝, 不需做熱浸
完成上列要求日期: 15/03/2024

國內


<input type="checkbox"/> 生產技術總監	<input type="checkbox"/> 連附件	<input checked="" type="checkbox"/> 技術部	<input checked="" type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 生產部	<input type="checkbox"/> 連附件
<input type="checkbox"/> 採購部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input checked="" type="checkbox"/> 生產統籌部	<input checked="" type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 報關組	<input type="checkbox"/> 連附件
<input type="checkbox"/> 質檢部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 會計部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 機械設計部	<input type="checkbox"/> 連附件
<input type="checkbox"/> 香港辦	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 其他:			

香港


<input type="checkbox"/> 行政部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 會計部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 統籌部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 工程部	<input type="checkbox"/> 連附件
<input checked="" type="checkbox"/> 採購部	<input checked="" type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> QS部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input checked="" type="checkbox"/> 地盤管理	<input checked="" type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 維修部	<input type="checkbox"/> 連附件

*發件人簽署: Iris	*組別成員批核簽署:
傳遞編號:	項目經理簽署:

 美特鋁質有限公司 MIDI Aluminium Fabricator Ltd.				工程號	J856	類別		物料號	-					
				地盘	天榮站	制圖	劉煥	2022-10-18	圖號	GL4-F01F				
修改	-	-	-	採用工廠	✓	地盤		圖紙名稱	玻璃加工圖	復核	徐詳坤	2022-10-19	數量	-
日期	-	-	-	材料顏色		材料	GLASS	批准	林仁安	2022-10-19	單件重量	-	(KG)	

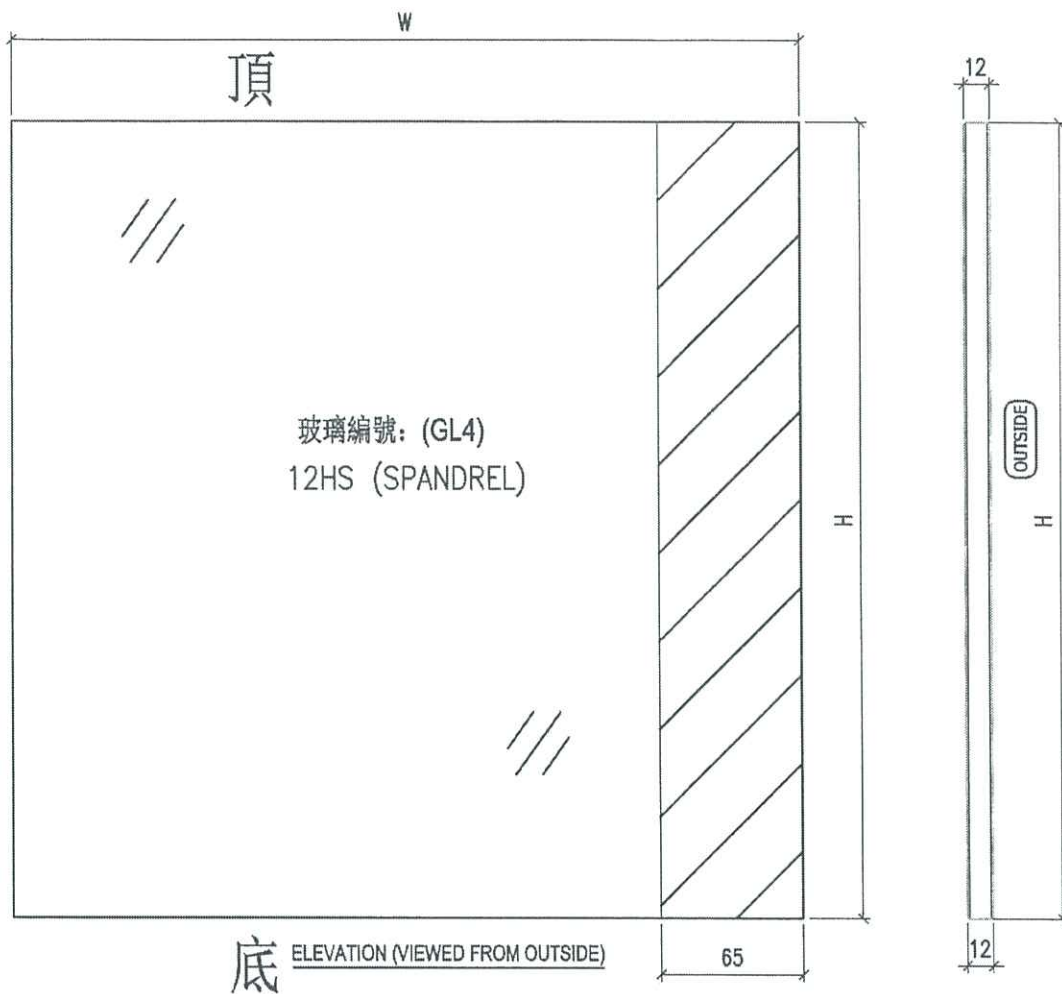

底 ELEVATION (VIEWED FROM OUTSIDE)

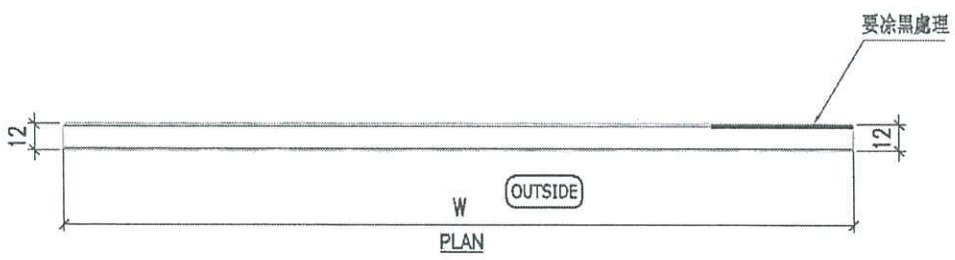

PLAN

- NOTES
1. ALL DIMENSION IN mm
  2. ALL EDGE CHAMFER 1x1x45

參考用

工程號: J-856		日期: 2022.11.15		送呈: 威哥				
地盤名稱: 天榮站		日期: 2022.11.15		副本: 鴻仔				
項目類別: T3座(塔樓/屋頂)		日期: 2022.11.15						
A/C Code: -		數量: 1817		計玻璃面積 (平方米) 1571.447				
BM編號:		計算: 劉燦		核註				
		核對: 徐詳坤						
		批准: 林仁安						
		數量: 1817						
序號	修改標示	顏色與名稱	厚度(mm)	玻璃尺寸 高度(mm)	數量 (塊)	面積(平方米) 單件	總面積	備註 MO1 MO2 MO3
33		GL4-A15	12.00	1284 565	1	0.725	0.725	見GL4-F01
34	C修改	GL4-A16		864 565	2	0.488	0.976	見GL4-F01
35	B修改	GL4-A17		1171.5 565	1	0.662	0.662	見GL4-F01
36		GL4-AA01		614 570	5	0.350	1.750	見GL4-F01
37		GL4-AC01		615 945	1	0.581	0.581	見GL4-F01
38		GL4-AA05		921.5 570	1	0.525	0.525	見GL4-F01
39		GL4-AA06		1569 570	1	0.894	0.894	見GL4-F01
40		GL4-AA07		729 570	1	0.416	0.416	見GL4-F01
41		GL4-AB01		614 565	1	0.347	0.347	見GL4-F01
42	B修改备注	GL4-C03		661 915	36	0.605	21.773	見GL4-F01F 10 13 13
43	B修改备注	GL4-C07		1678.5 915	36	1.536	55.290	見GL4-F01F 10 13 13
44	B修改备注	GL4-C08		761 915	36	0.696	25.067	見GL4-F01F 10 13 13
45	B修改备注	GL4-C09		561 915	36	0.513	18.479	見GL4-F01F 10 13 13
46	B修改备注	GL4-C10		1811 915	72	1.657	119.309	見GL4-F01F 20 26 26
47	B修改备注	GL4-CB03		661 565	1	0.373	0.373	見GL4-F01F
48	B修改备注	GL4-CB10		1811 565	1	1.023	1.023	見GL4-F01F
49	B修改备注	GL4-CF03		661 945	1	0.625	0.625	見GL4-F01F
50	B修改备注	GL4-CC07		1678.5 570	1	0.957	0.957	見GL4-F01F
51	B修改备注	GL4-CC08		761 570	1	0.434	0.434	見GL4-F01F
52	B修改备注	GL4-CC09		561 570	1	0.320	0.320	見GL4-F01F
53	B修改备注	GL4-CC10		1811 570	1	1.032	1.032	見GL4-F01F
54	B修改备注	GL4-CG10A		1811 945	1	1.711	1.711	見GL4-F01F
55	B修改	GL5-A03		840 122	2	0.102	0.205	見GL5-F01
56		GL5-A01		570 122	225	0.070	15.647	見GL5-F01 60 78 87
57		GL5-C01		497 122	38	0.061	2.304	見GL5-F01 10 13 15
58		GL5-C02		597 122	37	0.073	2.695	見GL5-F01 10 13 14
59		GL5-C03		397 122	37	0.048	1.792	見GL5-F01 10 13 14
60	E修改	GL5-A04		820 122	2	0.100	0.200	見GL5-F01
61	B新增	GL1A-A14	32.00	2164 2005	1	4.339	4.339	見GL1A-F02
				總合計:	1817		####	
